

한국가스공사 상임감사위원

감봉·견책·경고 요구 및 통보 사항

일련번호 제21-실증연구-1호

제 목 복합에너지허브 시설 설치 부적정 등

소관부서 ○○○○원 ◆◆◆◆연구소

조치부서 ㉹㉹㉹㉹처, ○○○○원

내 용

1. 사건 개요

○○○○원은 2019. 5. 1.부터 “자체과제”로 수행중인 「감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구1)」와 연계하여 “정부·공기업 협력과제”로서 천연가스 공급관리소를 기반으로 감압발전기, 연료전지, 태양광, 수소·전기충전소 및 관제센터 등을 구축, 통합에너지(가스, 전기, 수소 등)을 생산하여 인근수용가에 공급하는 「복합에너지허브 시범구축 및 기술실증 연구2)」를 수행하고 있다.

그런데 2020. 12. 28. ○○지역본부 ♠♠관리소에 복합에너지허브 관련 시설을 설치하면서 관계법령³⁾을 준수하지 않은 행위에 대한 ○○○○○○부(이하 ‘○○부’)의 감사 요청이 있었고,

1) (자체과제) 1.5MW급 2단 감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구

- 연구기간 : 2017. 5. 1. ~ 2021. 6. 30.
- 연구내용 : 감압발전기 국산개발 및 공급관리소 정압기를 대체해 정압과 동시에 전력을 생산하는 감압발전공정 실증 연구

2) (정부·공기업 협력과제) 지능형 통합에너지 플랫폼 기반 복합에너지 허브 시범구축 및 기술실증

- 연구기간 : 2019. 5. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 수행기관 : 한국○○공사(주관기관) 포함 10개 기관 수행
- 연구내용 : 공급관리소를 기반으로 감압발전기, 연료전지, 수소·전기차충전소, 태양광발전 등을 구축하여 인근수용가에 복합에너지를 공급하는 실증 연구

3) 「도시가스사업법 시행규칙」 별표5 정압기지에는 가스공급시설 외의 시설물을 설치하지 아니할 것

이에 따라 시행한 본 감사에서 ○○○○원은 가스공급시설 설치를 위해 승인받은 가스공급부지를 복합에너지허브 실증부지로 부적정하게 활용하였고, 감압발전기 및 그 부대설비 설치공사 관리업무를 수행하면서 인허가 전에 공사를 착공하여 진행하는 등 관계법령⁴⁾에서 정한 사항을 위반 한 사실이 확인되었는데, 구체적인 내용은 다음과 같다.

2. 가스공급부지 활용 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「가스공사법」 제16조의 2(사업실시계획의 승인 등)에 따라 공사는 천연가스의 생산·공급설비 및 그 부대설비를 설치하는 공사를 하는 경우 사업구역의 위치 및 면적, 사업시행기간 등이 포함된 “사업 실시계획”을 수립하여 ○○부장관의 승인을 받아야 하고, ○○부장관은 그 “사업 실시계획”을 승인하는 경우 이를 고시하여야 하며.

같은 법 시행령 제14조의 3(사업실시계획 승인 및 변경승인 제외대상)에 따라 기존 사업구역 안에서 시행하는 변경공사의 경우에는 별도의 “사업 실시계획” 승인 없이 「도시가스사업법」 제11조(시설공사 계획의 승인 등)에 따른 “공사계획”을 수립하여 ○○부장관의 승인을 받아 변경공사를 시행하여야 한다.

이에 따라 공사는 1984년 1월, ♠♠관리소(부지면적 : 9,577㎡)를 포함한 벨브기지 7개소와 주배관 98.3km 설치에 대한 ‘사업 실시계획’을 수립하여 승인 요청, 동력자원부(현 ○○부)로부터 “고시 제83-32호”로 승인 받아 “○○도 ○○시 ○○면 ○○리 3-3번지 일원” 9,577㎡의 토지를 수용하여 1986년 12월 ♠♠


4) 「도시가스사업법」 제11조(시설공사계획의 승인)에 따라 기존 가스공급시설을 변경할 때에는 ○○○○○○부로부터 “공사계획승인”을 받아야하며, 「건축법」 제11조(건축허가)에 따라 건축물을 건축하려는 자는 지자체장의 허가를 받아 함.

밸브기지⁵⁾ 설치공사를 완료하였고,

이후 2002년 2월에는 ♠♠관리소 확장공사(밸브기지에서 정압기지로)를 위해 ♠♠관리소 내 9,347m²의⁶⁾ 부지에 가스필터, 가스히터, 정압설비, 계량설비 및 정압동을 설치하는 내용으로 “공사계획”을 수립하여 ○○부로부터 승인 받아 2002년 12월 ♠♠ 정압기지로의 변경공사를 완료하였다.

이와 같이 1984년 최초 “사업 실시계획”과 이후 2002년 확장공사를 위한 “공사계획” 수립 문서로 【그림 1】에 ②로 표시된 ♠♠관리소 부지(9,347m²) 전체는 가스공급시설 설치를 위해 ○○부로부터 승인받은 가스공급부지임을 알 수 있다.

【그림 1】 ♠♠관리소 가스공급부지 현황

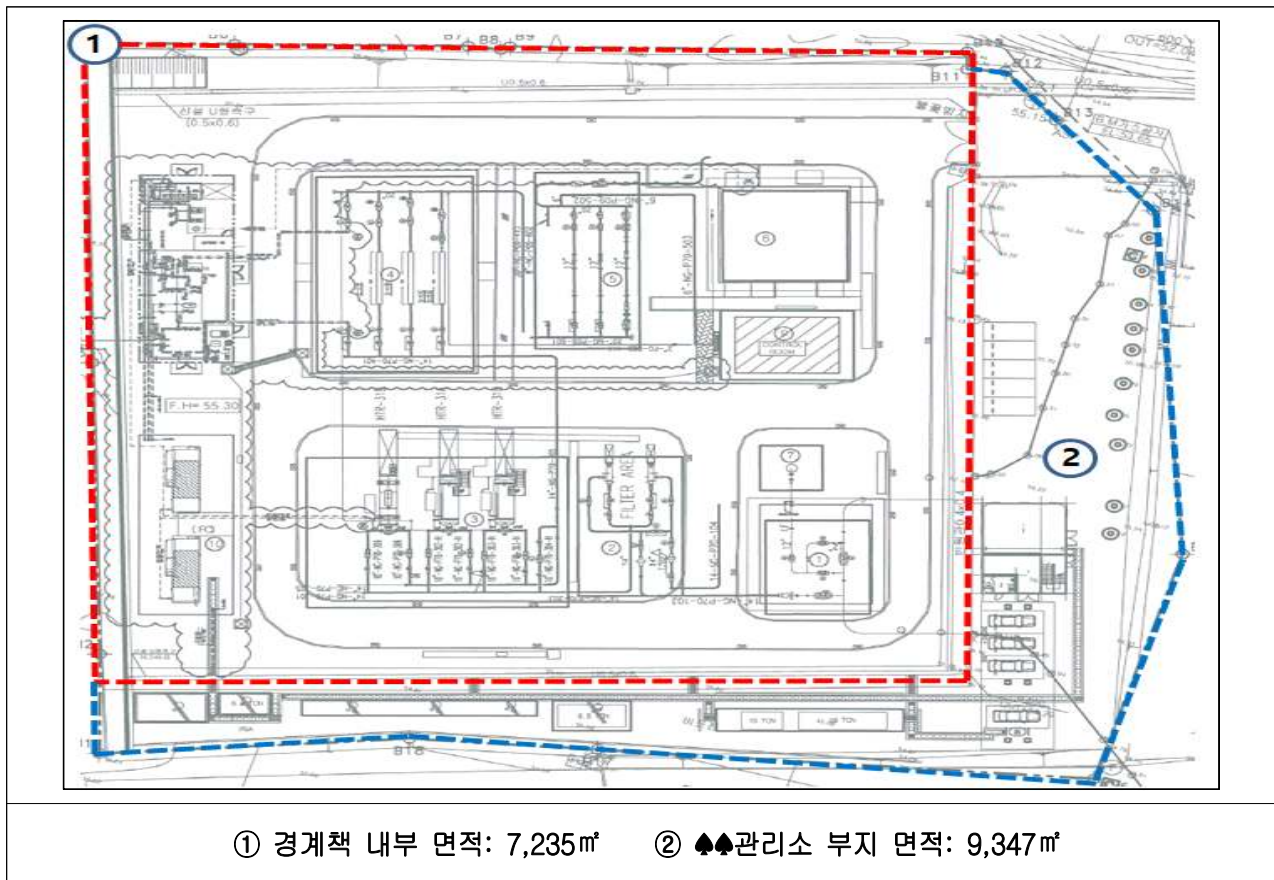

5) "밸브기지"란 도시가스의 흐름을 차단하거나 배관안의 가스를 안전한 곳으로 방출하기 위한 방산탑, 배관, 차단 장치 또는 그 부대설비가 설치되어 있는 근거지를 말한다.

6) 2012년 토지분할로 부지면적 감소(9,577㎡에서 9,347㎡으로)

한편 「도시가스사업법」 제12조(가스시설의 시공·관리) ②항에 따라 시공자는 가스공급시설의 설치공사나 변경공사를 하는 경우 같은 법 시행규칙 [별표 5](가스공급시설의 시설·기술 등의 기준)에 적합하도록 시공·관리하여야 하며, 같은 규칙 [별표5] 제2호 가목 3) 나에는 정압기지(관리소)에는 가스공급시설 외의 타 시설물을 설치할 수 없도록 되어 있다.(다만, 태양광설비 및 감압이용 발전설비는 안전의 위해가 없는 경우 설치할 수 있다.)

따라서 가스공급시설 설치를 위해 산업통상자원부로부터 승인받은 【그림 1】에 ②로 표시된 ♠♠관리소 전체 부지(9,347㎡)에는 가스공급시설 외의 시설물인 수소압축설비(수소배관 포함), 수소·전기차충전소 및 관제센터 등의 복합에너지 허브 시설물을 설치하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○원은 2019년 6월 ♠♠관리소 부지정보(가스공급부지)에 대한 사전 조사, 검토 없이 경계책 밖 유희부지에 가스공급시설 외의 타 시설물 설치가 가능하다고 판단, ♠♠관리소를 “복합에너지 허브 시범구축 및 기술실증 연구” 대상관리소로 선정하여,

【그림 2】와 같이 관리소 경계책 내부에는 감압발전기, 연료전지 및 기타 부대설비(전기동 등)를, 경계책 밖 유희부지에는 수소압축설비(수소배관 포함), 수소·전기차 충전소, 태양광 및 관제센터 등의 시설물을 설치하기로 결정하였다.

또한 2019. 10. 31. ♠♠관리소 내부 경계책을 “사업소(가스공급부지) 경계”로 표시하여 도면을 작성, 한국***공사에 “수소자동차 충전시설 설치계획”에 대한 기술검토를 요청함으로써 가스공급부지에 수소 충전시설 설치에 대해 전문기

관이 검토 할 수 있는 기회를 차단하였다.(2019. 12. 16. 한국***공사는 제출된 도면을 기준으로 「고압가스 안전관리법 시행규칙」에 규정된 시설 및 기술기준에 따라 그 적합여부를 판단하였다.)

그 결과로 ○○○○원은 가스공급시설 외의 타 시설물을 설치하여서는 아니 되는 가스공급부지에(♠♠관리소 경계책 내·외부에) 연료전지, 수소압축설비(수소배관 포함), 수소·전기차 충전소, 태양광 및 관제센터 등의 복합에너지허브 시설물을 불법으로 설치 추진하였으며, 면적 300m², 지상 3층 규모의 관제센터 구축공사를 2020년 12월에 이미 완료하는 등 「가스공급시설의 시설·기술 등의 기준」을 위반하면서 “복합에너지 허브 시범구축 및 기술실증 연구”를 수행하고 있다.

【그림 2】 ♠♠관리소 내 복합에너지허브 시설 조감도



3. 감압발전설비 설치공사 관리 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

●●●●원은 “감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구”를 하면서 1단계로 “감압발전기 국산화 개발”을 완료하고, 2단계로 운영 중인 공급관리소에 개발된 감압발전기를 설치하여 “현장적용 연구”를 수행하기로 하였다.

이에 따라 ●●●●원은 2020년 9월 감압발전기 국산화 개발을 완료하고 2020. 9. 1. 국산화 개발된 감압발전기 현장적용 연구를 위해 【표 1】과 같이 2건의 공사계약을 체결, ♠♠관리소에 감압발전설비 설치공사를 추진하였으며, 설치공사 주요 공종에는 정압기 교체와(기존 정압기 1열을 감압발전기로) 가스배관(고압, 약 667m) 및 그 부대설비(정압동, 전기동) 설치공사가 포함되어 있다.

【표 1】 감압발전기 설치공사 현황

분야	시공사	공사기간	계약금액(VAT제외)
기계/토목/건축	●●●●●●	2020. 9. 1.~ 2021. 6. 30.	1,176백만 원
전기/계장	(주)ㄷㄷㄷㄷ		942백만 원

한편, 「도시가스사업법」 제11조(시설공사계획의 승인)에 따라 도시가스사업자가 가스공급시설 설치공사나 변경공사(정압기 교체 또는 20m 이상의 가스배관 설치)를 하려면 그 공사계획에 대하여 ○○부장관의 승인을 받아야 하며,

「건축법」 제11조(건축허가)에 따라 건축물을 건축하는 자는 지자체장의 허가를 받아야 하고, 제21조(착공신고 등)에 따라 건축물의 공사를 착수하려는 자는 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다.

따라서 ●●●●원은 ♠♠관리소에 감압발전설비 설치공사를 시행 할 때

【표 2】와 같은 절차에 따라 정부부처 및 지방자치단체의 인허가를 득한 후 해당 공사를 시행하여야 한다.

【표 2】 공사관리(인허가) 절차

공사내용	인허가 사항
공급설비 변경공사	①기술검토승인(한국****공사) → ②공사계약체결 → ③공사계획승인(○○부) → ④공사착공
건축물 신축공사	① 공사계약체결 → ②건축허가(지자체) → ③착공신고(지자체) → ④공사착공

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 도시가스사업법 미 준수

●●●●원은 2020. 9. 2. 감압발전설비 설치공사를 위한 “공사계획”을 수립하여 ○○○○부에 ○○부로의 “승인신청”을 요청하였고, ○○○○부는 2020. 10. 19. “♠♠관리소 공사계획승인”을 ○○부에 신청하였으나, 2021. 1. 15. (감사일)까지 공사계획 승인은 완료되지 않았다.

그런데 ●●●●원은 ○○부로의 “공사계획승인” 요청(2020. 10. 19.)전인 2020. 10. 6. ♠♠관리소 감압발전설비 설치공사를 착수하였고, 공사계획이 승인되지 않은 상태에서 2020. 11. 30. 기준 약 28.5%의 공정율로 공사를 진행시켜 감압발전기 기초공사(철근배근 까지)와 전기동 축조를 완료 하는 등 「도시가스사업법」을 준수하지 아니 하였고,

더욱이 2020. 12. 1. 감압발전기 기초공사(철근배근)까지 완료된 상태임에도 “부지정리 작업 중이며 공사계획 승인 완료 시 후속 공사를 진행 하겠다”라고 실제 공사 진행 현황과 다르게 ○○부에 보고 하였다.

2) 건축법 미 준수

●●●●원은 2020. 11. 2. ○○시로부터 정압동과 전기동 건축을 위한 “허가증”을 발급 받아 2020. 11. 3. ○○시에 공사착공을 신고하였다.

그런데 ●●●●원은 “건축허가증” 발급(2020. 11. 2.) 전인 2020. 10. 6.부터 전기동 건축공사를 착공(부지정지 작업)하여 2020. 10. 11.부터는 터파기 작업을, 2020. 10. 26.부터는 거푸집 설치작업을 시행하는 등 「건축법」을 준수하지 아니하였다.

그 결과 관계법령 위반사항(허가 전 착공)에 대한 조치 및 이에 따른 관할 기관의 행정처분(벌금 부과 또는 철거/재시공 등)에 대한 이행이 필요한 실정이며 이 과정에서 예산낭비(손실)를 초래할 가능성이 상당하다.⁷⁾

4. 개인별 비위 및 과실 내용

가. KKK의 경우

책임연구원 KKK은 2010. 12. 28.부터 ◆◆◆◆연구소(구 □□□□□□□□연구소 센터)에서 근무하였고, 연구과제 책임자로서 2019. 5. 1.부터 “복합에너지 허브 시범구축 및 기술실증 연구⁸⁾”를, 2018. 8. 1.부터는 “감압발전기 국산화 및 감압 발전공정 현장적용 연구⁹⁾”를 총괄하여 수행하고 있다.

1) 가스공급부지 활용 부적정

위 직원은 2019년 6월 ♠♠관리소를 복합에너지허브 실증연구 대상관리소

7) ●●●●원은 2021년 2월 조치방안을 마련하여 시행예정이며, 이에 따른 조치결과에 따라 예산낭비(손실) 금액이 확정 됨

8) 2019. 5. 1.부터 2019. 7. 31.까지 연구과제 책임자는 PPP 책임연구원이었으나 실제로는 KKK 책임연구원이 연구과제를 총괄하여 수행함

9) 2019. 4. 1.부터 7. 31.까지 참여연구원으로 감압발전기 국산화 개발 연구를 수행함(이때 연구과제 책임자는 PPP 책임연구원임)

로 선정하였고, ♠♠관리소 부지정보(가스공급부지 범위)에 대한 조사 없이 ♠♠관리소 내부 경계책이 정압기지 사업소 경계라고 임의 판단하여 가스공급부지(경계책 밖 유희부지)에 수소·전기충전설비, 관제센터 등 가스공급시설 외의 시설물을 설치하기로 결정, 추진하였고, ♠♠관리소 내부 경계책을 “사업소(가스공급부지) 경계”로 표시하여 도면을 작성, 한국***공사에 기술검토를 요청 하는 등 「도시가스사업법」에서 정한 “가스공급시설의 시설·기술 등의 기준”을 준수하지 아니 하였다.

2) 감압발전설비 설치공사 관리 부적정

위 직원은 2020. 9. 2. “공사계획승인” 신청서를 작성하여 ○○○○부에 승인 신청을 요청한 담당자로 「도시가스사업법」 제11조 등에 따라 승인권자(○○부)로부터 가스공급시설의 변경공사에 대한 “승인”후에 해당 공사를 착공하여야 하는 사실을 알고 있었음에도,

○○부로부터 ♠♠관리소 감압발전설비 설치공사를 위한 “공사계획”을 승인 받지 못한 상태에서 법적사항 검토 없이 임의로 잘못 판단하여¹⁰⁾ 공사착공을 결정, 공사감독원에게 시행하게 함으로써 「도시가스사업법」을 위반하는 결과를 초래하였고,

2020. 12. 1. 감압발전기 기초공사(철근배근)까지 완료된 상태임에도 “부지정리작업 중이며 가스공급시설 공사계획 승인 시 후속 공사를 진행 하겠다”라고 실제 공사 진행 현황과 다르게 허위로 보고서를 작성하여 ○○○부에 보고 하였다.

또한 위 직원은 공사감독원이 전기동 건축공사 허가(2020. 11. 2.) 전인

10) 감압설비설치공사를 위한 부지정리작업까지는 공사계획승인 없이 가능하며, 전기동은 가스공급설비와 직접적인 연관이 없는 시설로서 건축허가만으로 공사가 가능하다고 판단함

2020. 10. 11.부터 전기동 건축공사를 착공하여 시행하는 것을 인지하고 있었음에도 이를 묵인하였다.

나. CCC의 경우

책임연구원 CCC는 2013. 7. 1.부터 ◆◆◆◆연구소(구 □□□□□□□연구소센터)에서 근무하였고, 참여연구원으로 2017. 5. 1.부터 “감압발전공정 최적화 실험 및 현장성능 평가”를 담당하면서 2020. 9. 24. “감압발전설비 설치공사” 감독원으로 임명되어 2020. 10. 6.부터 공사감독 업무를 수행하였다.

위 직원은 「공사관리규정」에 따라 “♠♠관리소 감압발전설비 설치공사” 전반에 관한 공사 감독과 관리업무를 총괄하여 수행하여야 하는 공사감독원으로서 「도시가스사업법」 제11조 등에 따라 승인권자(○○부)로부터 가스공급시설의 변경공사에 대한 “승인”후에 해당 공사를 착공하여야 하는 사실과 ○○○○○부가 신청(2020. 10. 19.) 한 감압발전설비 설치관련 “공사계획승인” 요청 건이 ○○부로부터 승인되지 않은 사실을 인지하고 있었음에도,

2020. 10. 6. “♠♠관리소 감압발전설비 설치공사”를 착공하여 감압발전기 기초공사(철근배근 까지)와 전기동 축조를 완료하는 등 도시가스사업법을 위반하면서 공사 관리 업무를 수행하였고,

더욱이 전기동 건축공사의 경우, 시공사에게 건축허가(2020. 11. 2.)전인 2020. 10. 11.부터 공사를 착공(터파기 작업)시켜 2020. 10. 26.에는 거푸집 설치 작업까지 시행하게 하는 등 건축법을 위반하면서 공사 관리 업무를 수행하였다.

다. FFF의 경우

수석연구원 FFF은 ◆◆◆◆연구소장으로서 2019. 2. 27.부터 복합에너지허

브·수소충전소·분산발전 등 수소이용분야 연구과제 수행 및 기술개발을 총괄¹¹⁾하여 관리하였다.

위 직원은 ◆◆◆◆연구소 내 연구과제 수행 전반에 관하여 관리감독 할 책임이 있음에도 과제책임자인 KKK이 임의로 잘못 판단하여 가스공급부지에 수소충전설비, 관제센터 등 가스공급시설 외의 타 시설물을 설치하기로 결정하여 보고한 사항에 대한 검토(♠♠관리소 부지정보에 대한 조사 및 그에 따른 법적타당성)를 소홀히 하여 결과적으로 “정압기지 시설기준”을 위반하는 행위를 사전에 예방하지 못하였고,

공사감독원인 CCC가 감압설비 설치공사를 위한 “공사계획” 승인(2021. 1. 15. 감사일 현재까지 미 승인) 전에 해당 공사를 착공하여 진행하고, 건축허가(2020. 11. 2.) 전인 2020. 10. 11.부터 전기동 건축공사를 착공하여 2020. 10. 26.에는 거푸집 설치 작업까지 진행하는 등 도시가스사업법 및 건축법 등 관계법령을 위반하여 공사를 관리하는 과정에서 아무런 조치를 취하지 않는 등 관리감독을 소홀히 하였다.

또한 2020. 12. 1. 실제 현장 작업은 감압발전기 기초공사(철근배근)까지 완료된 상태임에도 이에 대한 확인 없이 “부지정리작업 중”이라고 과제책임자가 사실과 다르게 작성한 보고서 내용으로 ○○부에 보고하였다.

라. DDD의 경우

처장 DDD은 2020. 7. 1.부터 ●●●●원장으로서 연구개발 및 연구과제 수

11) 2017년 5월부터 2017년 7월까지 참여연구원으로서 “감압발전공정 기본설계 및 EPC연구”를 수행하였고, 2017년 8월부터 2019년 2월까지 과제책임자로서 “감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구”를 총괄하여 수행함

행업무를 총괄 관리하였다.

위 직원은 연구과제 수행업무에 대한 관리를 철저히 하여 연구과제 수행에 있어서 관계법령을 위반하는 일이 없도록 관리하여야 함에도 이를 소홀히 하여 소속 연구원들이 2020. 10. 6.부터 ♠♠관리소 감압발전설비 설치공사 관리업무를 수행하면서 인허가 전에 공사를 착공하여 진행하는 등 「도시가스사업법」 및 「건축법」을 준수하지 아니한 행위를 예방하지 못한 관리책임이 있다.

5. 관련자 의견 및 검토결과

① KKK은 연구과제를 총괄하여 수행하는 책임자로서 가스공급부지를 복합 에너지허브 실증부지로 부적정하게 활용하고, 감압발전기 및 그 부대설비 설치공사 관리업무를 수행하면서 인허가 전 공사를 착공하여 시행하게 하는 등 관계법령을 준수하지 못한 사실을 모두 인정하고 있다.

② CCC는 공사감독원으로서 감압발전기 및 그 부대설비 설치공사 감독업무를 수행하면서 인허가 전 공사를 착공하여 시행하는 등 관계법령을 준수하지 못한 사실을 모두 인정하고 있다.

③ FFF은 ◆◆◆◆연구소장으로서 소속 연구원들이 수행하는 업무에 대한 검토 및 관리감독을 소홀히 하여 관계법령을 준수하지 아니한 행위를 예방하지 못한 사실을 모두 인정하고 있다.

④ ○●○●원은 ♠♠관리소 부지 필지 분할 등을 통해 “가스공급시설의 시설·기술 등의 기준”과의 부적합 사항을 해소하고, 관계법령 위반(허가 전 공사 착공)에 대한 ‘자진신고’ 및 이에 따른 관할기관의 행정처분(벌금 등) 사항을 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정 KKK 등 관련자 3명이 가스공급부지를 복합에너지허브 실증부지로 부적정하게 활용하고, 감압발전설비 설치공사 관리업무를 수행하면서 인허가 전 공사를 착공하여 시행하는 등 관계법령에서 정한 사항을 준수하지 아니하면서 실제 공사 진행 사항과 다르게 ○○부(□□□□과)에 보고한 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반하였고 같은 규정 제48조(징계) 사유에 해당된다.

이를 관련자별로 검토해 보면, **KKK**의 경우 연구과제 책임자로서 가스공급부지에 복합에너지허브 시설을 설치하기로 결정하여 추진하였고, ‘공사계획승인’ 및 ‘건축허가’전에 감압발전기 기초공사 및 전기동 건축공사를 착공, 진행하게 하여 관계법령(도시가스사업법, 건축법)을 위반하였으며, 실제 공사 진행 사항과 다르게 ○○부(□□□□과)에 허위 보고한 행위는 징계(감봉) 처분이 타당하다고 판단된다.

CCC의 경우 공사감독원으로서 ‘공사계획승인’ 및 ‘건축허가’전에 감압발전기 기초공사 및 전기동 건축공사를 착수, 진행하는 등 관계법령(도시가스사업법, 건축법)을 위반하였으나, 건축허가 전 전기동 공사 진행의 경우 과제책임자의 지시(터파기 작업까지)가 있었던 점을 반영하여 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

FFF의 경우 ◆◆◆◆연구소장으로서 과제책임자와 공사감독원이 잘못 판단하여 결정, 추진한 내용에 대한 검토를 소홀히 한 책임과 「상벌규정」 [별표 5] “비위행위자와 감독자에 대한 문책” 기준(감봉 처분한 KKK의 직상위 감독자임)에 따라 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

■■■■■처장은

① 가스공급부지를 부적정하게 활용하고, 관계법령을 위반하여 공사 관리업무를 수행하면서 감독기관에 사실과 다르게 보고한 **KKK**을 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계(**감봉**) 처분하고,

② 관계법령을 위반하면서 공사 관리업무를 수행한 **CCC**, 연구과제 추진 및 공사 관리에 대한 관리감독을 소홀히 한 **FFF**을 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계(**견책**) 처분하며,

③ 소속 직원들의 비위행위에 대한 관리책임이 있는 **DDD**에게 **경고** 처분하시기 바랍니다.

●●●●원장은

④ 필지 분할 등을 통해 정압기지 시설기준과의 부적합 사항을 해소하고 이에 따른 기술 및 안전성 재검토 후 실증연구를 시행하시고, (**통보**)

⑤ 건축법 위반(허가 전 공사 착공)에 대한 ‘자진신고’ 및 이에 따른 행정처분(벌금 등) 이행으로 법령 위반 사항에 대해 조치하시기 바랍니다. (**통보**)
