

[12] [통보] 사항

1. 제 목 : 아파트 공용부위 벽돌쌓기 설계기준 수립 미흡
2. 조치부서 : ◇◇◇◇◇◇◇처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

경남지역본부에서는 감사대상기간인 '16.1.1 부터 '18.3.31 현재까지 [표 1]과 같이 🏠🏠🏠🏠3 아파트 건설공사 1공구를 비롯 총 23개 사업지구에서 건설공사가 착수되었으며, 그 중 11개 사업 지구는 준공되었고 현재 12개 사업 지구에서 건설공사가 진행 중에 있다.

[표 1] 경남지역본부 공동주택 건설현황 ('18. 05월 현재)

지구명	공구	유형	세대수	착공일	준공일	공정률	비고
🏠🏠🏠🏠 3	3	국민	190	'14.06.30	'16.06.03	준공	
◇◇◇◇ × A1	2	국민/영구	840	'15.12.31	'18.01.04	준공	
🏠🏠🏠🏠 A9	5	공분	630	'14.12.24	'17.04.05	준공	
🏠🏠🏠🏠 A10	6	공임	404	'15.11.30	'17.12.30	준공	공임리츠
🏠🏠🏠🏠 A3	7	행복/국민/영구	1,256	'15.12.31	'18.04.30	준공	
🏠 🏠 🏠 🏠 2 41	2	공임/국민	1,047	'13.12.31	'16.04.05	준공	
🏠 🏠 🏠 🏠 2 H1	3	행복	900	'15.12.31	'18.04.17	준공	
🏠 🏠 🏠 🏠 2 40	4	공분	644	'15.12.21	'18.01.11	준공	민간참여
🏠🏠🏠🏠2 B6	1	국민	1,696	'14.12.31	'17.04.06	준공	
🏠🏠🏠🏠2 B5	2	공임	595	'15.07.31	'17.10.27	준공	공임리츠
🏠🏠🏠🏠2 H1	3	행복	480	'15.08.31	'17.10.30	준공	

지구명	공구	유형	세대수	착공일	준공일	공정률	비고
8 8 8 8 2 S1	3	공임	867	'16.07.29	'18.10.16	59%	기술공모리츠
☺☺☺☺2	1	행복	460	'16.09.30	'18.11.28	52%	
☺☺☺☺	1	행복	401	'17.12.29	'20.08.28	2%	
◆◆◆◆Z	1	공임	528	'16.07.29	'18.06.30	91%	기술공모리츠
★★☆☆	1	행복	20	'17.12.29	'19.05.16	0%	
☺☺☺☺	1	행복	196	'17.09.30	'19.09.03	4%	
▶▶▶▶	1	국민/영구	610	'17.12.29	'19.11.16	2%	
♂♂♂♂♂♂	1	행복	210	'16.07.12	'18.08.25	78%	
*****	1	국민	306	'14.11.28	'17.04.28	3 %	
●●●●● B1	1	공분	1,245	'16.12.19	'19.05.31	43%	민간참여
●●●●● A3	1	행복	1,200	'16.12.30	'19.03.29	41%	
●●●●● A1	2	국민	1,442	'17.09.29	'19.11.01	7%	
합계	23개		7,485				

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

감사실에서는 2016년 경남지역본부 종합감사 시 아파트 주출입구 피로티 및 PIT층 통로 등 공용부위에 층고 약 5~6M 높이로 설계되고 있는 시멘트 벽돌쌓기 (이하 "조적벽체")의 설계기준을 개선¹⁾토록 요구한 바 있다.

개선요구 당시 경남지역본부 내에서는 안전성 확보 등을 위해 선제적으로 해당부위에 대한 설계변경을 추진한 사례(벽돌쌓기→블록쌓기)가 확인되었고, 그 결과 소정의 원가절감의 효과도 있는 것으로 확인되었으므로 ◇◇◇◇◇◇처에서는 통일된 설계기준을 조속히 마련하여 각 지역본부 현장에서 해당부위가 적정하게 시공되도록 조치했어야 함이 타당하다.

1) 감사지적번호 2016-000111 「아파트 공용부위 시멘트벽돌 쌓기 설계기준 미흡」 [감사실-2213('16.05.25)]

하지만 ‘17. 6월 감사지적사항 조치결과 중간보고²⁾ 등을 통해 실외 조적벽체 부위에 대한 풍하중 적용 등 추가적인 구조기준 검토 필요와 이를 ΩΩΩΩΩ센터 (現, ○○○○○○처)에 이관하여 진행 중에 있음을 통보한 이후 현재까지 관련 설계기준을 정립하지 못하고 있는 상황이다.

그 결과 금번 2018년도 경남지역본부 종합감사 기간 중 본부 내 아파트 건설공사 현장에 대한 설계 및 시공현황 조사에서는 [붙임 1]과 같이 여전히 해당부위에 대한 마감기준이 개선되지 않아 불합리한 설계 및 시공이 반복되고 있으므로 해당사항에 대한 재촉구를 통해 해당부위가 적정하게 시공될 수 있도록 함이 타당하다.

[내부번호인 의견 및 판단]

이에 대해 ◇◇◇◇◇◇처에서는 감사결과 심의위원회 진행 시 내부번호인³⁾ 의견진술을 통해 ‘16년 감사처분 이후 현재까지 2년간 최종 조치결과를 제출하지 못하고 있음을 인정하면서도,

비구조적 요소(비내력벽)에 대한 구조 및 화재안전기준이 추가되어 전문적인 검토에 시간이 필요했던 점과 내부조직 개편에 따른 조적시방 담당부서의 변동 (○○○○○○○처 이관)이 발생한 점, 2017년부터 내/외부 전문가 검토 및 지속적으로 개선책을 강구해 온 점에 대해 의견을 피력하고 있어 재촉구 조치를 통해 설계 기준이 조속히 마련될 수 있도록 요구함이 타당하다.

5. 조치할 사항


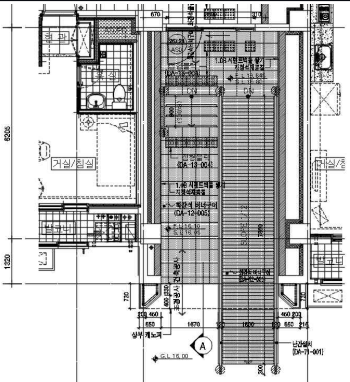
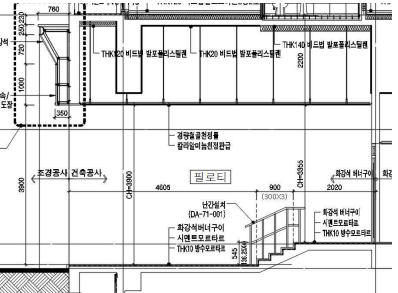

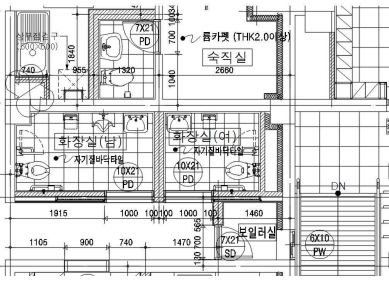
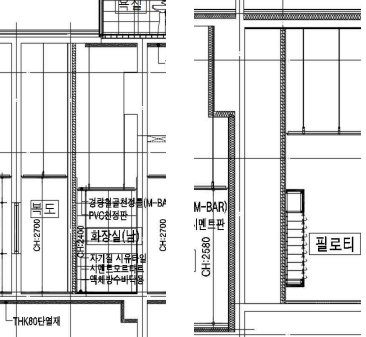
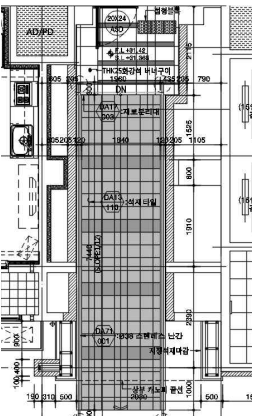
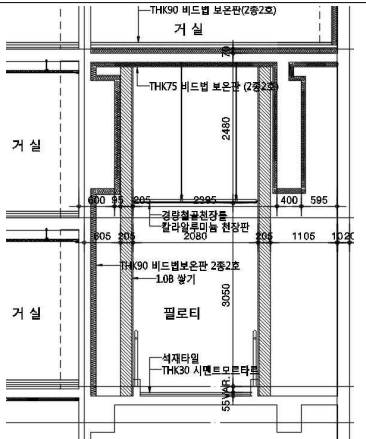
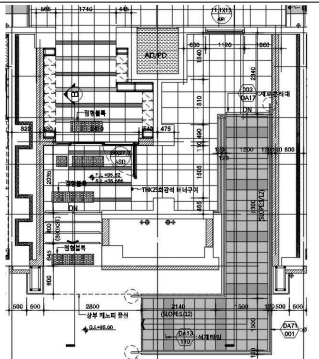
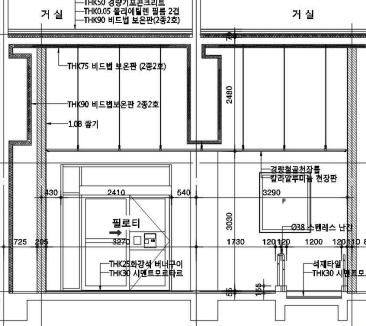
2) 경남지역본부 종합감사 중간보고 [◇◇◇◇◇◇처-3273('17.06.09)]

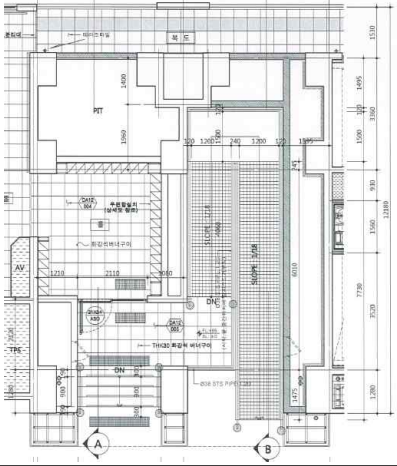
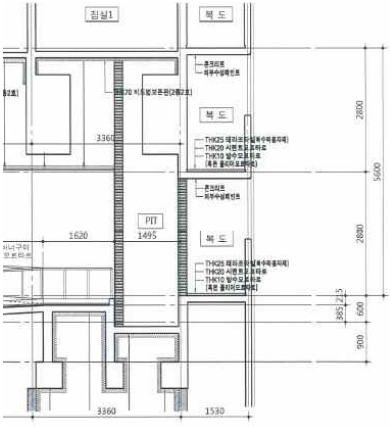
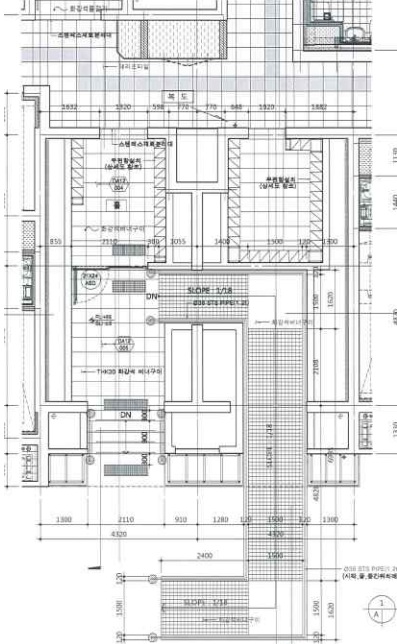
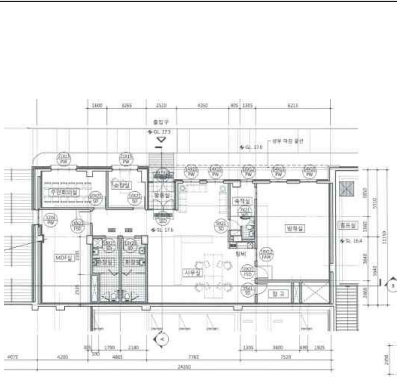
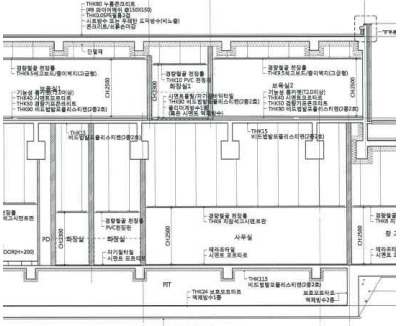
3) ◇◇◇◇◇◇처 차장 ★★★(감사결과 심의위원회 참석 번호)

◇◇◇◇◇◇◇처장은

아파트 공용부위 벽돌쌓기와 관련하여 추가로 검토 중인 구조 및 화재안전 기준 등을 조속히 보완하여 설계기준을 수립하시기 바라며, 공사진행지구에 대해서는 품질보완(대체공법 검토) 계획 등을 마련하여 적정 품질을 확보할 수 있도록 조치하시기 바랍니다 (통보).

【붙임1】 경남지역본부 공용부위 조직벽체 적용 현황

지구명	설계현황		비고
	평면	단면	
 (501동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티
 (502동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 0.5B 부 위: 피로티
 A3 (301동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티
 A3 (305동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티

지구명	설계현황		비고
	평면	단면	
○○○○○ A-3 (301동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티
○○○○○ A-3 (303동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티
○○○○○ A-3 (관리사무소)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티
