

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고 요구, 통보

제 목 : [2] 배전선로이설비용 부담주체 판정 잘못 및 정산업무 소홀

관 계 부 서 : 하동지사, 함양지사

조 치 부 서 : 경남본부 경영지원부, 하동지사, 함양지사

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 기설 배전선로가 도로공사, 기타 법률에 정한 사업 등에 지장을 주는 경우 그 지장 사유를 해소하기 위하여 이설공사를 시행하고 있다.

전력설비의 무분별한 이설은 국가경제적 낭비 및 우리 회사의 손실로 이어질 수 있기 때문에 배전선로이설 업무 담당자는 「배전선로이설업무기준」에 따라 이설 요청자, 이설 필요성, 지장의 정도, 적법한 권원 확보 여부, 관련 법령 등을 면밀히 검토한 후 배전선로 이설비용 부담주체를 결정하고 있다.

[표 1] 최근 3개년('22년~'24년) 하동·함양지사 배전선로이설공사 설계 건수

구분	사유지내 신증축	구내활용	법률에 의한 사업	도로공사	공중통행 불편	기타	합계
하동지사	56	303	37	58	25	73	552
함양지사	72	342	67	103	16	12	612

자료: 영업배전정보시스템 배전통계

2. 배전선로이설비용 부담주체 판정 잘못

가. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로이설업무기준」 제2장 2절에 따르면 배전부서는 공사비 부담주체를 판정하기 위한 배전설비 정보(설비번호, 토지 지번, 권원확보 유무 등)를 기록한 기초자료를 작성하여 영업부서에 제출하고, 영업부서는 배전부서에서 제출한 설비 정보를 참조하여 관련 법규 및 규정에 의거 공사비 부담주체를 최종 결정하여야 한다.

「배전선로이설업무기준」 제3장 4절에 따르면 도로구역으로 고시되었으나 아직 개설되지 않은 도로부지(신설 또는 확장예정부지)에 설치되어 있는 배전선로의 경우 설치 시점 기준 사유지 여부, 사업 관련 고시문을 통해 도로공사의 실 원인 및 목적 등을 면밀히 검토하여 부담주체를 판정하여야 한다. 이때 도시·군 관리계획, 도로구역 등 결정 효력이 발생하는 고시 기준은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조에 따른 지형 도면의 고시, 「농어촌도로 정비법」 제9조에 따른 도로노선의 지정 고시 등으로 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

하동, 함양지사에 접수된 배전선로 이설공사의 업무처리 적정성을 검토한 결과, [표 2]와 같이 ① 도로공사 고시일과 이설공사비 부담주체 결정 기준을 잘못 적용하여 부담주체를 착오 판정하였으며, ② 부담주체 판정 기초자료의 전주 설치일을 잘못 작성하여 부담주체를 당사부담으로 착오 판정하였다.

[표 2] 배전선로이설 공사비 부담주체 판정 착오 내역

(단위: 천 원)

순번	사업소	접수번호	요청 사유	대상	부담주체 판정		착오금액	사 유
					誤	正		
1	하동	익명화	도로 공사	6기	전액당사	일부고객 (전주 5기)	84,524	고시일 착오
2	함양	익명화	도로 공사	1기	전액당사	전액고객	2,208	전주설치일 착오
합 계(2건)							86,732	

[표 2] 순번 1의 경우 ○★●에서 아래 [그림 1]과 같이 왕복 2차선(폭 7m) 도로개설공사에 지장이 되어 전주 6기를 이설 요청한 건으로 하동지사 담당자는 「농어촌도로 정비법」에 따른 농어촌도로 기본계획 수립일 이후 전주가 설치되었다 판단하여 ‘고시 이후 전주가 설치된 경우’를 적용하였으며, 점용허가를 받지 않은 전주의 경우 「농어촌정비법」 제128조에 따라 ◆▼■□㉮가 직접 혹은 지자체에 원상회복을 의뢰할 수 있다고 판단하여 전액 당사부담으로 판정하였다.

[그림 1] ♣♣●■ 확포장공사 배전선로 이설 현장 전경

도로공사 전		도로공사 후	
익명화	익명화	익명화	익명화

그런데 해당 공사의 고시문을 확인한 결과 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 제32조에 근거한 군관리계획 결정 및 지형도면 고시에 따른 도로◆-目○★호선 도로 신설 확포장공사로 공사의 목적이 차량의 원활한 통행, 교통 사고 예방임을 확인할 수 있었다.

따라서 해당 공사는 「농어촌도로 정비법」 혹은 「농어촌정비법」이 아닌 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 근거한 고시에 따른 도로공사이므로 ◆▼■□目 소유 사유지에 위치한 전주 5기는 「배전선로이설업무기준」 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 ‘고시 이전 전주가 설치된 경우’를 적용하여 부담주체를 고객부담으로 판정했어야 한다.

한편 [표 2] 순번 2의 경우 배전부서 담당자가 부담주체 판정 기초자료 작성 시 전주 설치일을 ‘확인불가’로 작성하였고, 이에 영업부서 담당자는 전주 설치일을 확인할 수 없어 이설 접수일 기준으로 전주가 ‘국공유지에 설치되어 있는 경우’를 적용하여 당사부담으로 판정하였다.

그런데 영업배전정보시스템 정보를 확인한 결과, [그림 2]와 같이 기별재료 명세서, 전주번호찰 사진을 통해 해당 전주가 2004년에 설치되었다는 사실을 알 수 있었고, 전주 설치 당시 해당 토지는 사유지였으므로 「배전선로이설업무기준」 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 고객 부담으로 판정했어야 한다.

[표 3] 부담주체 판정조서 착오 작성내역

순번	설비번호	전주 설치일		토지 소유자		부담주체 판정	
		오	정	오	정	오	정
1	익명화	확인불가	2004년	국유지	사유지	당사부담	고객부담

[그림 2] 전주설치일자 확인 자료

부담주체 판정조서	기별재료 명세서	전주번호찰
익명화	익명화	익명화

관계부서 의견

하동지사 영업부서 담당자는 향후 도로공사에 의한 배전선로이설 부담주체 판정 시 「배전선로이설업무기준」 제3장 제4절 5.에 기재된 법률별 고시종류를 기준으로 하여 업무를 처리하겠다고 답변하였으며, 함양지사 배전부서 담당자는 기초자료에 기재한 정보가 정확하지 못했음을 인정하였고, 영업부서 담당자 역시 전주설치일이 확인불가로 기재된 설비에 대해 영업부서의 최종검토를 면밀히 수행하지 못하였음을 인정하였다.


3. 고객시설부담공사 정산업무 소홀

가. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로이설업무기준」 제2장 2절에 따르면, 배전선로 이설공사 업무처리 흐름도는 [그림 3]과 같으며, 고객시설부담금이 발생하는 배전선로이설의 경우

공사 시공부서는 고객시설부담공사의 공사 준공 후 30일 이내에 공사준공 정산조서를 작성하여 영업부서에 송부하고, 영업부서는 공사준공정산서에 의하여 확정된 고객시설부담금 차액을 추가입금 요청 또는 환불하여야 한다.

[그림 3] 배전선로 이설업무 처리절차

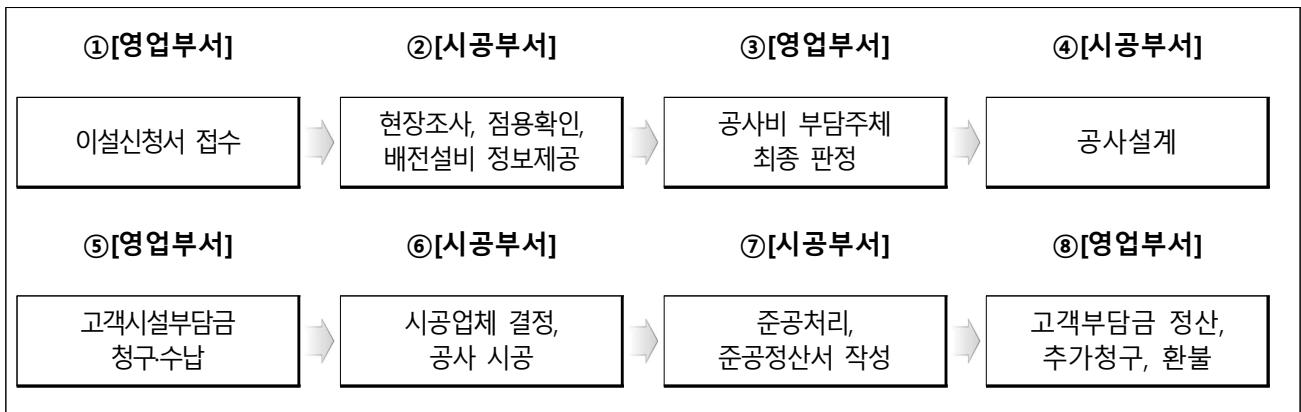

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 하동지사의 준공 완료된 고객시설부담공사에 대한 부담금 정산 업무 처리 적정성을 검토한 결과 [표 4]와 같이 9건의 경우 준공 후 30일이 지났음에도 추가청구 및 환불하지 않는 등 고객시설부담금을 장기 미정산하였다.

[표 4] 고객시설부담공사 장기 미정산 내역

(단위: 천 원)

순번	공사번호	준공일	정산일		청구금액	정산금액	차액	지연부서
			시공부서	영업부서				
1	익명화	'22.12.19.	'23.01.02.	-	74,120	104,989	30,869	영업부서
2	익명화	'19.12.24.	'19.12.24.	-	105,531	80,252	(25,279)	
3	익명화	'17.06.15.	'20.06.15.	-	1,816	1,482	(333)	
4	익명화	'21.03.25.	'21.04.02.	-	23,053	24,244	1,191	
5	익명화	'21.09.13.	'21.09.15.	-	14,597	13,144	(1,452)	

6	익명화	'21.09.13.	'21.09.30.	-	1,738	1,854	115	영업부서
7	익명화	'25.02.04.	'25.02.04.	-	29,739	24,731	(5,008)	
8	익명화	'24.09.26.	-	-	11,556	11,628	71	시공부서
9	익명화	'24.08.22.	-	-	18,534	17,161	(1,372)	
합 계(9건)						추징	32,247	
						환불	33,444	

순번 1~7 공사건의 경우, 공사 시공부서에서 고객시설부담공사 준공 후 정산조서를 작성하여 영업부서에 송부하였으나, 영업부서 담당자가 인사이동 시 인수인계 누락 사유로 추가청구 및 환불을 시행하지 않았다. 특히 순번 1의 경우 공사 착공 이전에 70%만 납부한 분할 납부 공사건임에도 실 준공일 이후에 잔여 공사비 30%와 정산금을 정산하지 않았으며, 순번 2는 감사일 기준 5년 이상 미정산 상태로 방치되는 등 고객시설부담금 정산 업무를 소홀히 하였다.

한편 순번 8~9 공사건은 시공부서에서 전체 이설공사비 중 우리회사의 필요에 의하여 시행한 설비 개량공사 부분을 제외하고 고객시설부담금을 산정하여야 하나, 이를 제외하지 않고 전체 이설공사비를 고객시설부담금으로 산정하였다. 이후 영업부서에서 착오 산정된 사실을 인지하여 재정산을 요청하였으나 시공부서에서 재정산을 지연하여 고객시설부담금이 장기 미정산되었다.

고객시설부담금이 장기 미정산된 사유를 확인한 결과, 최근 3년 동안의 영업부서 고객시설부담금 정산 업무를 대부분 입사 3년 미만의 신입직원이 담당하였고, [표 5]와 같이 담당자 변경이 8차례 있는 등 잦은 인사이동 및 업무변경으로 인해 인계인수 과정에서 누락이 발생하였음을 확인하였다.

[표 5] 고객시설부담금 영업부서 담당자 변경 내역

'22.7~'23.1	'23.1~'23.5	'23.5~'24.2	'24.2~'24.5	'24.5~'24.7	'24.7~'24.10	'24.7~'24.10	'25.1~'25.6
♠ ♡ ▶	▢ ▣ ▤	◀ ◁ ⊙	▢ ▣ ▤	◀ ◁ ⊙	▣ ▤ ★	▣ ▤ ★ ■ □ ▢	▢ ▣ ▤ ◆ ● ■

영업부서 직원들은 대부분 입사 3년 미만인 업무 경험과 실무지식이 부족한 신입직원이므로 장기 미결 업무에 대한 팀장의 관리 감독이 더욱 필요한 상황이었으나, 이를 소홀히 하였으므로 담당 팀장에게 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

관계부서 의견

하동지사 영업부서와 시공부서 담당자 모두 적기 추가청구 및 환불이 이루어지지 않았음을 인정하였으며, 향후 미정산 고객시설부담공사에 대한 즉각적인 업무처리 및 재발 방지를 약속하였다.

조치할 사항

경남본부 경영지원부장은 담당 직원의 관리감독 업무를 소홀히 한 직상위자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

하동지사장은

- ① 착오 판정한 배전선로이설 공사비를 추징하여 주시기 바라고, (시정)
- ② 준공 후 미정산된 고객시설부담금을 정산하여 주시기 바라며, (시정)

③ 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

함양지사장은

- ① 착오 판정한 배전선로이설 공사비를 추징하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

하동지사 고객지원팀 (現 ▽☒☎☎) 차 장 ☎ □ ◆ (경고) [No. 1 병합]

하동지사 고객지원팀 차 장 ◆ □ ☎ (경고) [No. 1 병합]

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 3 통 보 2	추 징 [118,980,486원] 환 불 [32,247,962원]	경 고 2	하동지사 함양지사	경남본부 경영지원부 하동지사 함양지사
