


[15] [경고] 사항

1. 제 목 : 준공지구 피난층 계단실 방화문 설치 누락
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ▽▽▽▽부 차장대우 건축 4급 김★★ (경고)
4. 내 용 :

○○지역본부 관할 ◇◇PP 행복주택 건설공사 1공구(행복 612호)는 '15.08.11 동립건설과 계약체결하여 '15.09.23 착공하였으며, '17.10.14 준공되어 현재 입주가 완료된 상태이다.

우리 公社에서는 '15. 10월 그간의 종합감사 지적사항 등을 반영하여 피난층 방화문 설치기준 개선(안)²⁵⁾을 시행한 바 있으며, 해당 방침에 따르면 피난층의 계단실이 부득이 하게 통과형으로 설계된 경우 [그림 1]과 같이 계단실 양쪽에 갑종방화문을 설치토록 규정하고 있다.

[그림 1] 피난층 계단실 방화문 적용기준 (계단실 통과형)

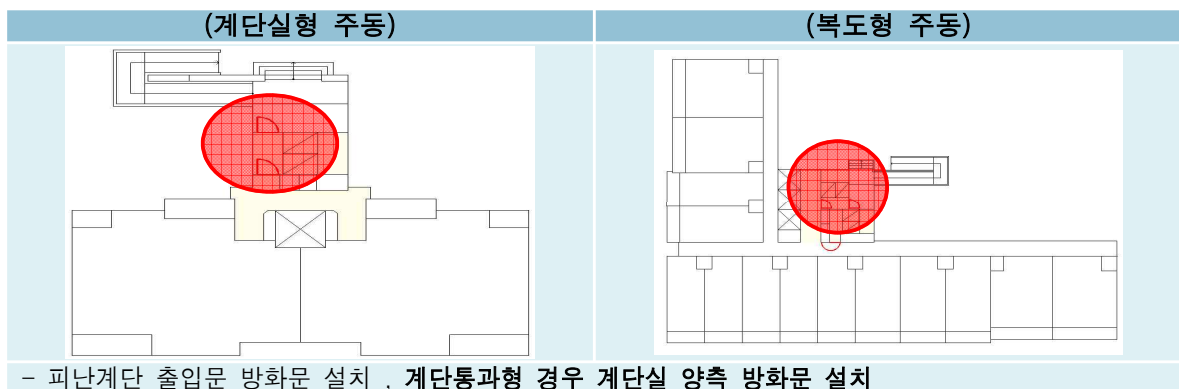


25) □□□□사업처-5868('15.10.07) 「피난층 방화문 설치기준 개선(안) 알림」

또한 해당사항은 2015년 ○○지역본부 종합감사 시 지적되어 처분된 사항으로 해당지역본부에서는 동일사항이 재발되지 않도록 설계변경 등을 통하여 준공 전에 적정하게 시공될 수 있도록 반드시 조치를 했어야 한다.

하지만 금번 ○○지역본부 종합감사 중 해당현장을 점검한 결과 아래 [그림 2]와 같이 피난층 계단실에 대한 설계검토 소홀 등으로 준공지구의 방화문 설치가 누락 되는 등 부적정 사항이 재차 확인되었다.

[그림 2] 각 동별 피난층 계단실 방화문 누락 현황

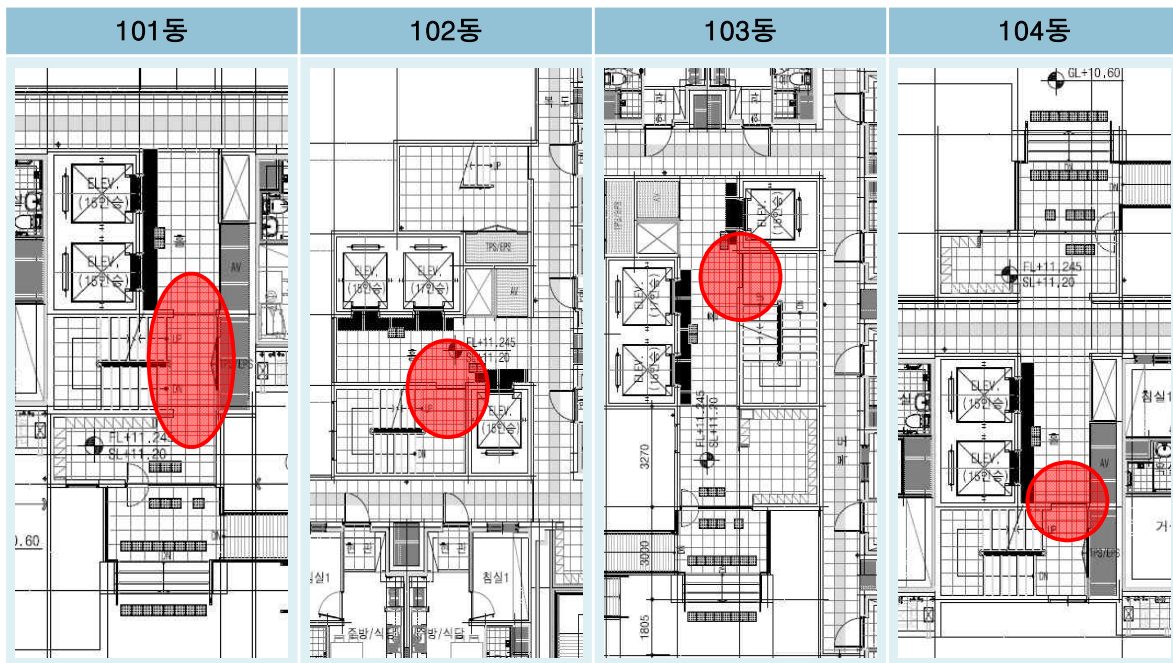

* 자료: ○○지역본부 제공자료 재구성

그 결과 피난계단 방화성능 부족 등으로 입주자 안전우려와 관련법령을 저촉할 가능성을 내포하고 있어 보완시공계획을 수립하는 등 관련조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

해당지구의 피난층 계단실 방화문 성능확보 방안을 검토하여 적정하게 설치될 수 있도록 조치하시기 바라며, 관련업무를 중복하여 소홀히 한 차장대우 건축4급 김★★에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고, 통보).
