

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [13] 지향성 압입공사의 시공측량사 직종 변경 필요

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전계획처

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

대구본부 등 전 지역본부에서는 지중배전관로공사 중 지하매서물 또는 하천 등 횡단구간에 대하여 지향성 압입¹⁾공법을 적용하고 있으며, 배전계획처는 2021년 6월 25일 지향성 압입공사 표준설계서(이하 ‘표준설계서’)를 제정²⁾하여 전 지역본부로 통보하였다.

표준설계서의 압입공사 품셈 공종에 따르면 압입공사 시점부와 종점부 경과지 노선의 측량을 위하여 토질별로 시공측량사³⁾(기술계 중급기술자) 1인을 반영하도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

-
- 1) 지하매설물 또는 하천 등의 횡단을 위하여 HDD(Horizontal Directional Drilling) 장비 등을 활용하여 개착하지 않고 땅속에 지중배전관로를 매설하는 공사
 - 2) 문서번호 배계(지중)-795 ‘지향성압입공사 표준설계서 및 Check-List 제정 알림’
 - 3) 건설공사현장에서 공사진행을 위해 필요한 측량을 수행하는 전문가

지향성 압입공사 설계 시 「지중배전 압입공사 시공절차서」 및 표준설계서를 따라야 하며, 「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 비핵심사업·예산낭비 요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하도록 하고 있다.


따라서 공사 설계 시 현 시점의 현황과 문제점을 파악하고 예산낭비 요소가 없는지 점검하고 개선할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

대구본부에서 시행한 ‘♣ 하이테크파크 지향성 압입공사’ 등 8건의 설계서에 반영되어 있는 시공측량사가 직접 경과지 노선 측량을 시행하는지 여부에 대하여 현장 시공 사진 확인 및 감독자 면담 결과, 직접 측량을 시행하지 않는 것으로 확인되었다.

그 이유를 파악한 결과, [그림]과 같이 현재 경과지 노선측량은 압입장비의 드릴헤드에 송신기를 장착하여 드릴헤드의 위치, 방향, 심도 등의 정보가 지상에 있는 일명 수신탐지사로 불리는 사람이 가지고 있는 Locator(전파탐지기, 수신기)로 실시간으로 수신되고 그 수신된 정보를 장비 운전자에게 전달하여 원하는 추진방향으로 도달하는 것으로 확인되었다.

[그림] 지향성 압입공사 시공측량 현황

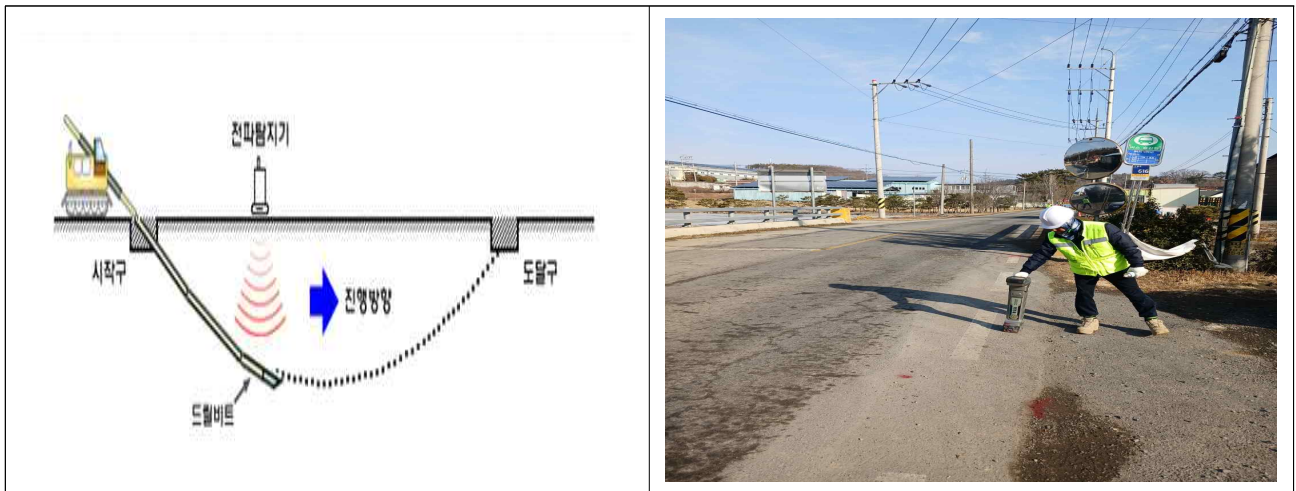

따라서 노선측량은 시공측량사가 직접 수행하지 않고 수신탐지사가 전파탐지기로 경과지 노선의 단순 위치 등만 확인하고 있는 실정이므로 현재 표준설계서 압입공사 품셈에 반영되어 있는 시공측량사를 기술계 중급기술자로 적용하는 것은 불합리하고 이를 기능계 측량에서 가장 낮은 단계의 초급기술자⁴⁾ 등으로 변경할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

배전계획처 업무담당자는 표준설계서 압입공사 품셈에 반영되어 있는 시공측량사를 기술계 중급기술자로 적용하는 것은 불합리하다는 감사자의 의견에 동의하였고 초급기술자로의 변경 등을 검토하겠다고 답변하였다.

4) 측량 기능직 중 가장 초급 수준이고 기준점 및 경계점의 표지 설치와 지형, 지물의 간단한 측정 업무 수행

조치할 사항

배전계획처장은 지향성 압입공사의 표준설계서에 반영되어 있는 압입공사 품셈의 시공측량사 직종 변경을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선 1	예산절감 [164,199,415원]	-	배전계획처 전 지역본부	배전계획처

※ 재정상조치 금액 산출 내역

(단위 : 원)

① 당초	② 변경	차액 (③=①-②)	④ 수량	⑤ 평균공수 (4공, 동시품할증)	소계 (⑥=③×④×⑤)	기타경비 등 (⑦=⑥×1.3)	절감액 (⑧=⑦×3년)
253,312	247,691	5,621	2,203m	340%	42,102,414	54,733,138	164,199,415

자료 : 배전계획처 및 대구본부 제출자료 재구성
