

시 정 요 구

【 12 】

제 목 결빙방지재 수량 부적정

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 설계업무

내 용


1. 업무개요

○○건설사업단은 2021. 7. 23. ☞☞(주) 외 3개사(☞☞(주), (주)◁◁, ■■(주), 이하 ‘계약상대자’)와 계약(계약금액 116,540,000천 원)을 맺고 2025. 12. 준공 예정으로 “고속국도 제32호 ㅅ~표선 ㄱ~ㄴ간 건설공사(제1공구)”를 시행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

“결빙방지재 혼입 포장 설계 적용방안(△△처-3723, 2022. 11. 14.)”에 따르면 [그림]과 같이 결빙방지재를 혼입한 포장은 배수성 포장 구간을 제외¹⁾한 아스팔트 포장 구간을 대상으로 하는 것으로 되어 있다.

[그림] 결빙방지재 혼입포장 모식도

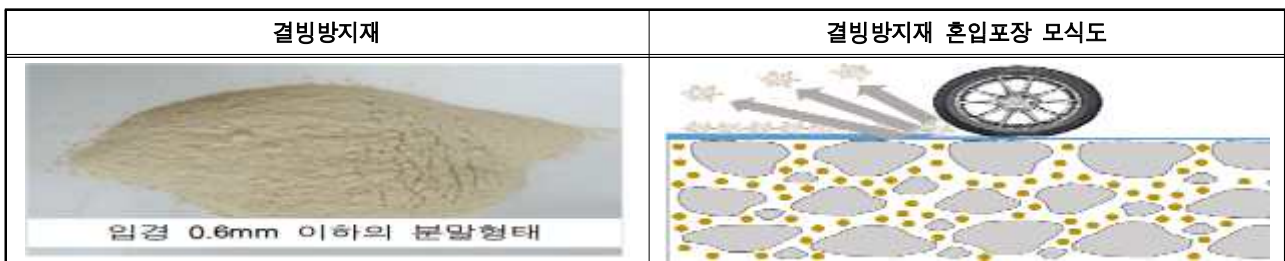

자료 : △△처 방침자료 재구성

1) 결빙방지재 혼입 포장 장기 효과분석 및 내구성 평가 연구용역 결과에 따르면, 배수성 포장 구간은 결빙방지재가 서서히 용출되면서 골재-아스팔트간 접착력이 약화되어 포장 손상을 가속화 시키는 것으로 추정하고 있음.
(“결빙방지재 혼입 포장 설계 적용방안(△△처-3723, 2022. 11. 14.)”)

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 ㄱㄴ 제1공구 본선 STA.0+781~STA.0+806 배수성 포장 구간의 경우 제외해야 하는 결빙방지재 23ton을 혼입하는 것으로 설계되어 있는 등 [표 1]과 같이 3개 구간에서 결빙방지재 152ton이 배수성 포장 구간에 반영되어 있는데도 그대로 두고 있다.

[표 1] 결빙방지재 설계 제외 대상구간 현황

(단위 : m, ton)

노선	공구	시점	종점	연장	포장공법	결빙방지재 혼입량
소계 (3개 구간)				924	배수성 및 콘크리트 포장	△152
ㄱㄴ	1	STA.0+781	STA.0+806	25	콘크리트 포장	△23
		STA.1+255	STA.2+049	794	배수성 포장	△117
		STA.2+049	STA.2+154	105	배수성 포장	△12

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

뿐만 아니라, 위 사업단은 ㄱㄴ 제1공구 내역서에 수량 오류로 인하여 결빙 방지재 599ton이 과다하게 설계에 반영되어 있는 등 총 751ton의 결빙방지재가 과다 계상되어 있어 공사비 1,877,500 천 원 상당액을 감액 조치해야 하는데도 그대로 두고 있다.

[표 2] 결빙방지재 공사비 과다계상 현황

(단위 : ton, 천 원)

노선	공구	결빙방지재 혼입량			공사비 증감(△)
		기준 부적정	수량 오류	증감(△)	
ㄱㄴ	1	△152	△599	△751	△1,877,500

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○건설사업단 및 위 계약상대자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 배수성 포장구간 등에 불필요하게 반영된 결빙방지재 공사비를 감액 조정 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○건설사업단장은 과다하게 반영된 1,877,500천 원 상당의 공사비를 「공사계약일반조건」 제19조 내지 제20조의 약정에 따라 설계변경 감액·조치하시기 바랍니다.(시정)
