

○ 영동선 안산휴게소 진입도로 및 부지조성공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	화정2교 P2 측면 지장물(한전주) 이설	사진		용지경계 선상에 존재 하므로 향후 유지관리를 위해 이설 검토	#1
			위치	화정2교 P2		
			내용	지장물(한전주) 이설 필요		
2020	시공업무	선부1교~2교 마을도로 배수 처리 검토	사진		인근 잔여지 민원인과 현재 협의중	#2
			위치	선부1교~선부2교 마을도로		
			내용	배수 처리 검토 필요		

○ 영동선 안산휴게소 진입도로 및 부지조성공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	교각 코핑 하면 면정리 미흡	사진		교각 코핑 하면 면정리	#3
			위치	화정2교 P1		
			내용	코핑 하면 면정리 미흡		
2020	시공업무	화정2교 하부 자재정리 미흡	사진		화정2교 하부 자재정리	#4
			위치	화정2교 하부		
			내용	자재정리 미흡		

○ 영동선 안산휴게소 진입도로 및 부지조성공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	화정2교 P5 토사 성토부 편측 토압 발생 우려	사진		화정2교 P5 토사 성토 편측 토압 발생 우려 토사 정리	#5
			위치	화정2교 P5		
			내용	성토부 편측 토압 발생		
2020	시공업무	화정1교 하부 침사지 설치 미흡	사진		화정2교 하부 침사지 접속 보완	#6
			위치	화정2교 하부		
			내용	침사지 설치 적정성		

○ 영동선 안산휴게소 진입도로 및 부지조성공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	화정2교 A2 날개벽 상부 방호벽 철근 보호조치 미흡	사진		날개벽 상부 방호벽 철근 방청처리 및 보호덮개 설치	#7
			위치	화정2교 A2 날개벽		
			내용	방호벽 철근 보호조치 미흡		
2020	시공업무	선부1교 A1(인천) 교대 전면부 폼타이 구멍 백태 발생	사진		해당 부분 방수 처리 검토 및 시행	#8
			위치	선부1교 A1(인천)		
			내용	교대 전면부 폼타이 구멍 백태 발생		

○ 영동선 안산휴게소 진입도로 및 부지조성공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	선부1교~2교(인천) 성토부 사면 녹화 조속 시공	사진		성토부 사면 녹화 조속 시행	#9
			위치	선부1교~선부2교(인천)		
			내용	성토부 사면 녹화 조속 시공 필요		
2020	시공업무	선부2교 A1(인천) 가시설 앵커부 그라우팅 미흡	사진		가시설 앵커부 그라우팅	#10
			위치	선부2교 A1(인천)		
			내용	가시설 앵커부 그라우팅 미흡		

○ 영동선 안산휴게소 진입도로 및 부지조성공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	선부2교 A1(인천) 가시설 하부 토류판 틈새 발생	사진		-가시설 하부 토류판 틈새 보강 -교대 뒤편 작업 조속 시행	#11
			위치	선부2교 A1(인천)		
			내용	가시설 하부 토류판 틈새 발생		
2020	시공업무	Ramp-B1교 하부 가교 난간 설치 미흡	사진		가교 난간 용접 보강	#12
			위치	Ramp-B1교		
			내용	가교 난간 설치 미흡		

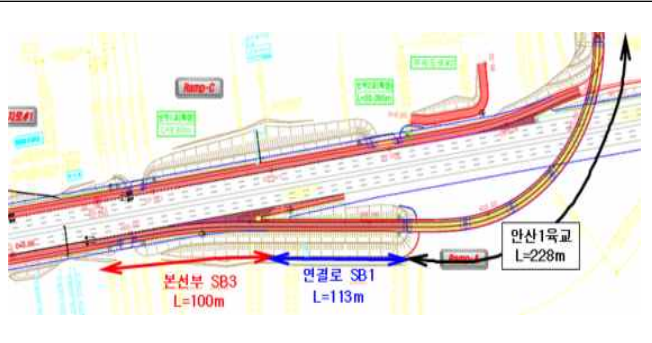
○ 영동선 안산휴게소 진입도로 및 부지조성공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	Ramp-B1교 A2 교대 균열 유발 줄눈 미설치	사진		교대 균열유발 줄눈 대체 방안 검토	#13
			위치	Ramp-B1교 A2		
			내용	균열유발 줄눈 미설치		
2020	시공업무	Ramp-B1교 워킹타워 하부 고정조치 미흡	사진		워킹 타워 하부 고정	#14
			위치	Ramp-B1교		
			내용	워킹타워 하부 고정조치 미흡		

○ 영동선 안산휴게소 진입도로 및 부지조성공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	Ramp-C교 도로 횡단구간 낙하물 방호선반 미설치	사진		도로 횡단구간 낙하물 방호선반 설치	#15
			위치	Ramp-C교		
			내용	낙하물 방호선반 미설치		
2020	시공업무	선부2교 가벤트 설치 적정성 확인	사진		- 받침보 강결 검토 - 각 부재별 볼트이음 부 구조검토 적정성 확인	#16
			위치	선부2교		
			내용	가벤트 설치 적정성		

○ 영동선 안산휴게소 진입도로 및 부지조성공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항	지 도 시 정 내 용	비 고
2020	설계업무	취약구간 연성방호울타리 등급 조정	사진  위치 안산휴게소 Ramp-A 내용 본선 진출 연결로 가드레일은 본선 설계속도 (100km/h)에 해당하는 기본등급(SB3) 적용	안산휴게소 Ramp-A 노즈부 연결로 방호울타리 등급상향 검토	#17

○ 판교 EX-Smart Center 신축현장

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	지상 1층 계단실 철근 보호 미흡	사진		철근 보호 조치	#18
			위치	지상 1층 계단실		
			내용	철근 보호 미흡		
2020	시공업무	지상 1층 현장자재 정리 미흡	사진		자재 정리 보관	#19
			위치	지상 1층		
			내용	자재 정리 미흡		

○ 판교 EX-Smart Center 신축현장

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	지상 1층 기둥 철근 보호 미흡	사진		철근 보호 조치	#20
			위치	지상 1층		
			내용	철근 보호 미흡		
2020	시공업무	지하1층 계단실 벽체 콘크리트 재료분리	사진		벽체 보수 보강 조치	#21
			위치	지하 1층		
			내용	벽체 계단실 재료 분리		

○ 판교 EX-Smart Center 신축현장

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	지하 1층 기둥 콘크리트 마감면 균열 관리 미흡	사진		균열 추적 관리	#22
			위치	지하 1층		
			내용	기둥 마감면 균열		
2020	시공업무	지하 1층 콘크리트 벽체 시공이음 불량	사진		벽체 보수 보강 조치	#23
			위치	지하 1층		
			내용	콘크리트 벽체 시공이음 불량		

○ 판교 EX-Smart Center 신축현장

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	지하 1층 공조실 창호 부위 콘크리트 시공이 음 관리 미흡	사진		벽체 콘크리트 면보수	#24
			위치	지하 1층 공조실		
			내용	공조실 창호 부위 콘크리트 시공이음 관리 미흡		
2020	시공업무	지하 1층 이음철근 보호 등 안전조치 미흡	사진		철근 보호 등 안전조치	#25
			위치	지하 1층 D/A		
			내용	이음철근 보호 등 안전조치 미흡		

○ 판교 EX-Smart Center 신축현장

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2020	시공업무	지하 3층 CIP 표면 탈락	사진		표면 탈락부위 보수 보강	#26
			위치	지하 3층		
			내용	표면 탈락 부위 보수 보강요망		
2020	시공업무	사다리 이동통로 안전 조치 미흡	사진		임시 사다리 주변 철근보양 등 안전조치 및 정규 이동통로 신속 설치	#27
			위치	지하 3층		
			내용	사다리 이동통로 안전조치 미흡		
