

주 의 요 구

제 목 시공감리 시 내압시험 규정 압력 미준수

관 련 부 서 경남서부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○본부)

내 용

1. 업무 개요

경남서부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경상남도 진주시, 통영시 등 2개 시 5개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스사업자 배관의 시공감리는 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다.)을 따르며, 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1), 이하 “지침”이라 한다」에서 정하는 업무처리 방법 등의 철자를 준수하여야 한다.

상세기준 KGS FS551 4.2.2.10에 따라 중압 이상의 배관은 최고사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 해야 한다.

따라서 검사원은 최고 사용압력이 중압인 일반도시가스사업자 배관 시공감리

시 내압시험 압력을 최고사용압력의 1.5배 이상으로 설정하여 실시해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남서부지사 관련자(4급 ○○○ 차장(現 ○○본부))은 ‘A 부설공사’에 대한 시공감리를 실시하면서 최고사용압력이 0.97 MPa인 배관에 대한 내압시험을 실시하면서 시험압력을 규정압력(최고사용압력의 1.5배)인 1.455 MPa보다 낮은 압력(1.45 MPa 미만)로 설정하여 시험을 실시·완료하였으나 최종 시공감리를 “적합”처리하여 안전성 확보가 미흡한 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

([표 1] 참고)

[표 1] 내압시험 규정 압력 미준수 내역

접수번호	공사명	최고사용압력		규정 시험 압력	실제 시험 압력	검사원
		기술검토 서류	최종 시공감리 서류			
2024-2207969	“A 부설공사”	0.98 MPa	0.97 MPa	1.455 MPa 이상	1.45 MPa미만*	4급 ○○○ (現 ○○본부)

* 내압시험기록지 판독 시 1.45Mpa 미만(약 1.43Mpa)로 확인([첨부 1] 확인)

※ 자료출처 : 감사기간 중 경남서부지사에서 제출한 검사서류 참조

[첨 부] 1. 내압시험기록지 및 확대사진 각 1부.

2. 시공감리 신청 및 최종 시공감리 서류 각 1부. <첨부 삭제_개인성명 등>

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

시공감리 시 내압시험을 실시하면서 시험압력을 규정압력보다 낮은 압력으로 설정하여 실시하였음에도 이를 제대로 확인하지 않고 최종 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)


[관련자] 경남서부지사 4급 ○○○(現 ○○본부)

[첨부 1] 기밀시험기록지 및 세부사진

A 부설공사(접수번호 : 2024-2207969)

배관내압기밀시험실시결과서 (기록지)

- 시 설 명 : [REDACTED]
- 시 험 구 간 : 기존 사업자 본관 서비스 "T" ~ 특정사용시설 정압기 전단밸브까지
- 최고 사용압력 : 0.98 MPa
- 시 험 압 력 : 1.45 MPa
- 배 관 내 용 적 : 1m³ 이하
- 유 지 시 간 : 30분 이상
- 기 록 지

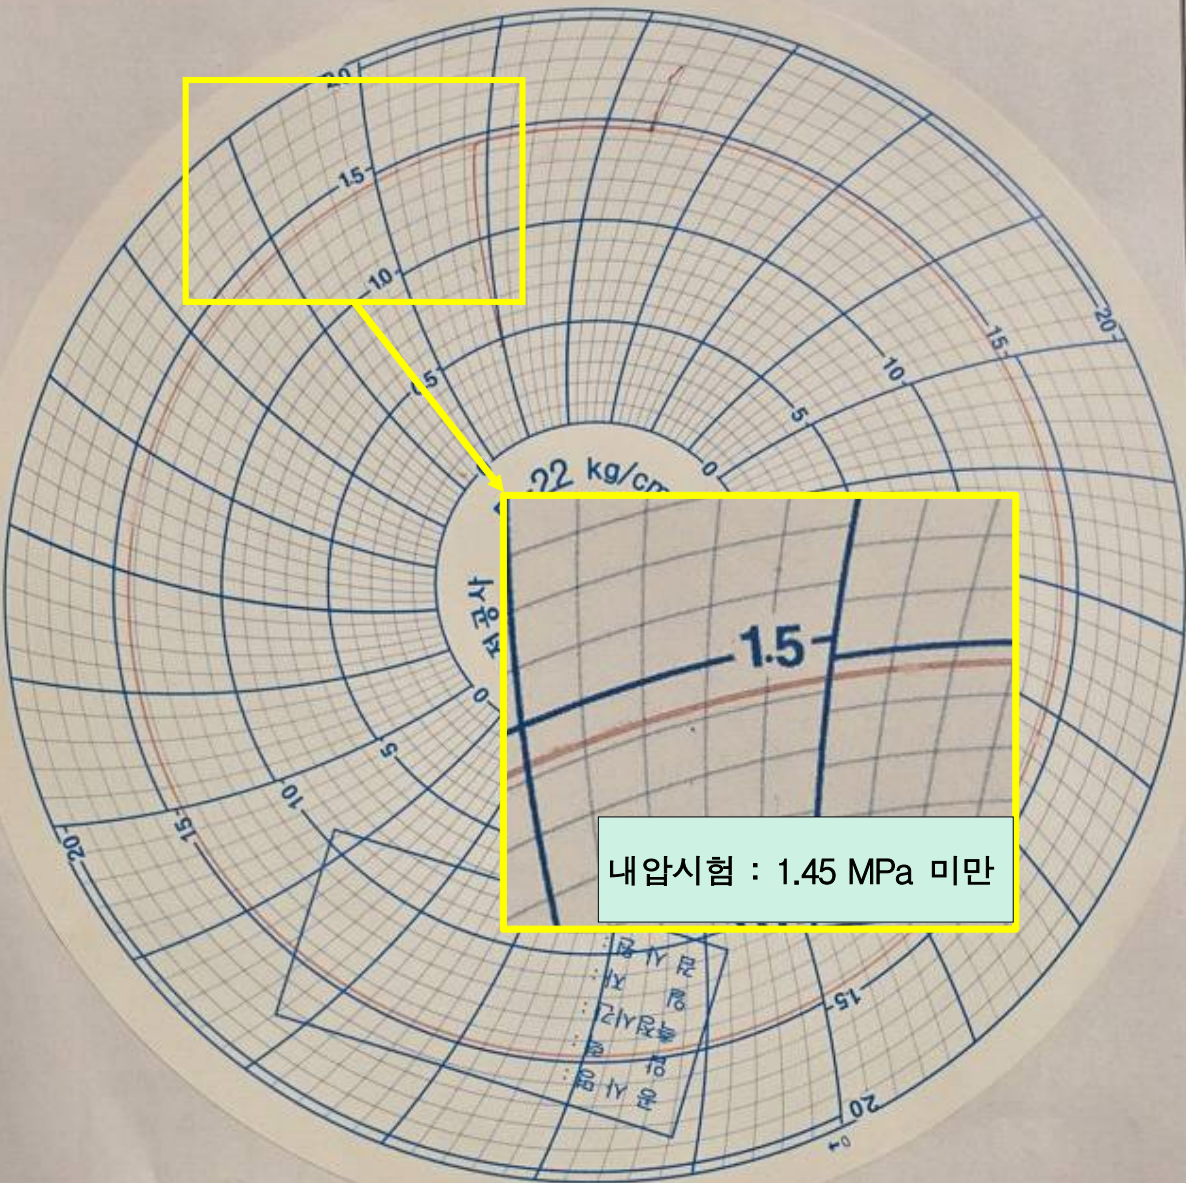

- 검사결과 : 합격
- 검사일자 : 2024 년 11월 28일
- 검 사 원 : [REDACTED]
- 시공관리자 : [REDACTED]
