

한국농어촌공사 감사

(시정) 요구

제 목 하상보호공 및 복토공종 설계변경 소홀

해당부서 □●지사, ▢▣⊙⊙지사

조치부서 □●지사, ▢▣⊙⊙지사

내 용

1. 업무개요

▲△지역본부 □●지사와 ▢▣⊙⊙지역본부 ▢▣⊙⊙지사에서는 농경지 침수방지를 통한 농작물 수확량 증대, 농경지 이용률 증대 및 영농여건을 개선하고 토양 침식 방지 및 재해예방을 위하여 각각 “□□지구 배수개선사업(이하 ‘□□지구’라 한다)”과 “△△지구 배수개선사업(이하 ‘△△지구’라 한다)”을 [표 1]과 공사계약을 체결하여 시행하고 있으며, 이에 대한 주요 공사 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 공사 계약현황

지사명	계약명	공사계약			준공 (예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
▢▣⊙⊙	□□지구 배수개선사업 토목건축공사					
▢▣⊙⊙	△△지구 배수개선사업 토목건축공사					

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사내용

지사명	지구명	사업명	주요공종	사업비 (백만 원)
▢▣⊙⊙	□□	배수개선	○배수문 6개소, 배수로 7조 2.91km, 매립 18.2ha	9,867
▢▣⊙⊙	△△	배수개선	○배수장 4개소, 배수로 2조 0.824km, 매립 8.58ha	6,845

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

公社「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하여, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 하며,

기획재정부「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.


따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ■■지구의 경우

■●지사에서는 ■■지구를 시행하면서 ① 배수문 0개소에 [그림 1]과 같이 상·하류부 바닥 세굴 방지 및 보호를 위해 사석쌓기 공종이 설계되어 있는데도, 현장 여건에 따라 시공이 불가능하다는 사유로 하류부 구간에 사석 쌓기(000m³)를 시공하지 않았고, ② 배수로 구간(7조 L=0,000m)에 양서류 등의 이동을 위한 등선로(생태이동로) 00개소 중 0호 배수로 등 0개 노선에 반영된 등선로 0개소를 시공하지 않았으나,

[그림 1] 배수문 하상보호공 설치 일반도 및 전경사진

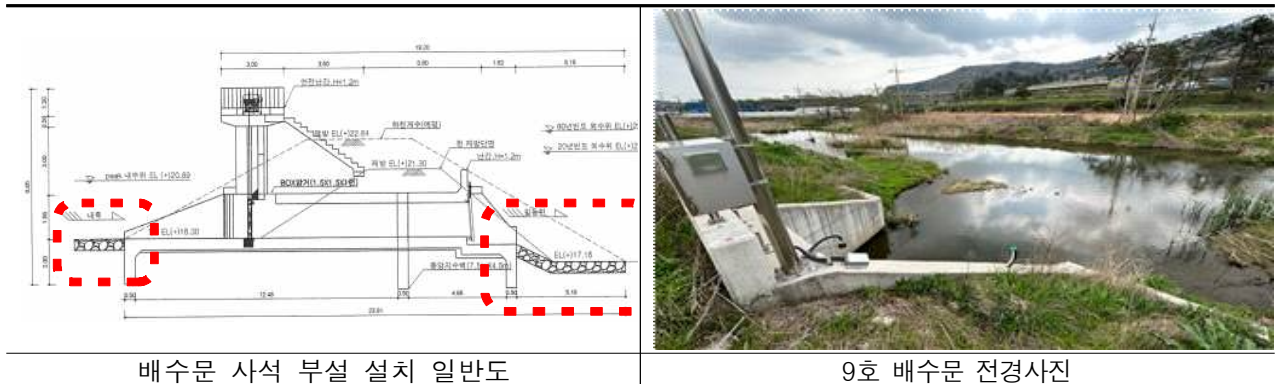

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 3]과 같이 현장여건 등에 따라 시공하지 않은 하상보호공 및 등선로에 대한 공사금액 00,000천 원 상당액이 설계서에 반영되어 있는데도, 감사일 현재 까지 설계변경 및 계약금액 조정을 이행하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 하상보호공 및 등선로 공사비 정산 현황

(단위: 천 원)

지구	공종	규격	당 초(A)		정 당(B)		증 감(B-A)		비고
			물량	금액	물량	금액	물량	금액	
계									
□□	사석쌓기 및 고르기	굴삭기+덤프							
	등선로								

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

나. △△지구의 경우

□□⊙⊙지사에서는 △△지구를 시행하면서 사업구역 내 진주시 지수면 △△리 000-0 등 00필지(면적:-m²)에 배수로와 배수장 공종에서 발생된 사토물량 00,000m³를 유용하여 복토(평균매립고: -m)하도록 설계에 반영되어 있으나,

[그림 2]와 같이 토지 소유자의 토사반출 반대, 공사 민원 등으로 실제 000-0 등 0필지(면적:0,000㎡)에 유용토량 0,000㎥만 복토하여 토사량 0,000㎥(평균매립고: 0.00m)¹⁾를 부족하게 시공하였는데도,

[그림 2] 매립(복토)공종 조서 및 검측 사진

	
실제 매립(복토) 조서	지수면 ㄴㄴ리 000-0

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 4]와 같이 현장여건 변동 등으로 시공하지 않은 복토공종에 대한 공사 금액 000,000천 원 상당액이 설계서에 반영되어 있는데도, 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정을 이행하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 복토 공사비 정산 현황

(단위:㎡, 천 원)

지구	공종	규격	당 초(A)		정 당(B)		증 감(B-A)		비고
			물량	금액	물량	금액	물량	금액	
계									
ㄴㄴ	복토	굴삭기 +덤프							

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 000,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

1) 감사기간 중 ㄴㄴㄴ지사에서 2024.3.15. 복토공종에 시공물량 확인을 위한 검측을 실시함

4. 관계부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락오류 또는 상호모순되는 점에 대해 「공사계약 일반조건」 등에 따라 설계변경시 반영하여 계약금액을 조정하고, 향후 직원교육을 실시하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하여 사업을 시행토록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 시정

① 사장(■●지사장, □□⊖⊖지사장)은 ■■지구와 △△지구 배수개선사업에서 설계도서와 다르게 현장여건 변동, 민원 등으로 시공하지 않은 공사물량(공종)에 대하여 「공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경 하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 000,000천 원 상당액 (■■: 00,000, △△: 000,000)을 「감액」 조치하시기 바랍니다. (시정)
