

시 정 요 구

【 11 】

제 목 교량 재설계 용역관리 부적정

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 시공업무


내 용

1. 업무개요

○○건설사업단은 2021. 7. 23. ☞☞(주) 외 3개사(☞☞(주), (주)◁◁, ■■(주)와 계약 (계약금액 116,540,000천 원)을 맺고 2025. 12. 준공 예정으로 “고속국도 제32호 ㅅ~표선 ㄱ~ㄴ간 건설공사(제1공구)”를 시행하고 있다.

그리고 위 사업단은 ㄱㄴ 제1공구 ㄴㄹ교1)의 경우 경제성 확보2) 등의 사유로 당초 수로이설 등 5개 공사내역을 삭제 또는 축소하고, [그림]과 같이 당초 3경간 (L=105.6m) 교량을 4경간(L=140.6m)으로 변경 계획하였다.

[그림] ㄴㄹ교 재설계 경간 변경 현황

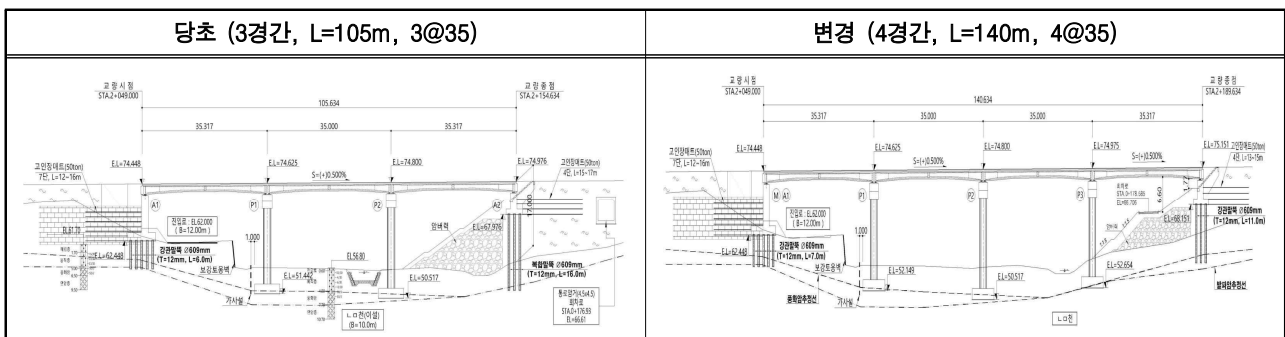

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

- 1) 교량형식 : 반일체식 + PSC I-빔교(신기술), 「시설물안전법」 상 제2종시설물(100m 이상 교량)에 해당
- 2) 소하천 수로이설 미시행(감 171,194천 원), 수로암거 1개소 삭제(감 120,985천 원), 통로암거 1개소 삭제 (감 310,408천 원), 보강토옹벽 축소(감 321,965천 원), 회차로 연장 조정(감 21,738천 원), 교량 경간 연장 (증 673,120천 원), 재설계비(증 118,957천 원)으로 총 154,213천 원 공사비 절감 효과가 있는 것으로 확인

이에 따라 위 사업단은 2023. 8. 3. (주)○○(이하, '계약상대자')과 계약(계약금액 118,957천 원)을 맺고 용역기간은 같은 해 8. 10.부터 2024. 1. 6.(150일간)까지로 정하고 “고속국도 제32호 ㄱ-포선(ㄱ-ㄴ) 1공구 ㄴㄱ교 재설계 용역”을 추진하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제6조(설계심의)에 따르면 교량 1종·2종 시설물의 구조 및 공법의 중요한 변경 또는 신설 등에 관한 사항은 기술자문위원회의 설계심의 대상으로 규정되어 있으며, 위 용역 「과업내용서」 I. 일반사항(제5절 과업수행기간, 제6절 과업의 범위), VI. 기술자문심의 및 「설계서」 5. 과업기간에는 과업의 범위로 설계적정성심의(기술자문 심의)를 추진하여 우리공사 기술심사처에서 시행하는 기술자문 심의를 득하도록 되어 있고 계약상대자는 설계심의를 위하여 과업종료 1개월 전에 용역성과를 정리하여 제출하도록 되어 있다.

그리고 「용역계약일반조건」 제32조(용역의 일시정지) 및 제20조(검사)에 따르면 계약담당자는 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하거나 기타 우리공사의 필요에 의하여 계약담당자가 지시한 경우에는 용역의 전부 또는 일부의 수행을 정지시킬 수 있도록 되어 있으며, 계약상대자는 용역을 완료하였을 때에는 그 사실을 서면으로 계약담당자에게 통지하여야 하고 계약담당자는 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 ㄱㄴ 제1공구 ㄴㄱ교의 경우 「시설물안전법」 상 제2종 시설물(100m 이상 교량)에 해당하여 시설물 구조가 변경(3경간, 105m→4경간, 140m)되는 사항인데도 과업종료 1개월 전까지 계약상대자가 설계심의를 위한

용역성과를 제출하지 않았는데도 제출요구 등의 관리감독 업무를 하지 않고 위 기준 등과 다르게 설계심의³⁾를 시행하지 않는 등 재설계 용역관리 업무를 소홀히 하였다.

그리고 위 사업단은 계약상대자가 2024. 1. 5. 위 용역 완료계 제출 이후에 추가 보완사항⁴⁾을 요청하면서 용역중지 또는 용역기간 연장 등의 조치를 하지 않았으며, 건설사업관리자의 기술적 검토가 완료(검토완료일 2024. 5. 22.)되지 않았는데도 같은 해 4. 23. 준공검사⁵⁾를 그대로 추진⁶⁾하였다.

관계기관 의견 ○○건설사업단은 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 앞으로 용역관리 업무에 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○건설사업단장은 ㄴㄱ교 재설계 용역성과품에 대한 걱정여부를 검토 후 수정 사항에 대해서는 계약상대자가 보완하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

인력처장은 재설계 용역관리 업무를 소홀히 한 다음 관련자에게 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○건설사업단	3급	B	2022. 1. 19. ~ 현 재	설계차장	○○건설사업단	경고

3) 타 사업단의 경우 교량연장 또는 확폭 등 변경사항 발생시 설계심의를 시행하고 있음.

4) 현장여건(ㄴㄱ교 P1 기초 지반선 0.7m 변경), 및 원설계 오류(난간방호벽→방음벽 형식)에 대해 유선으로 수정 요청

5) 건설사업관리자의 구조안전성 확보 등 구두 확인 후 준공검사 시행

6) 준공금 지급시기는 준공검사일과 동일하게 '24. 4. 23. 임.
