

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 수도 재정사업 자금 예측성 향상을 위한 내부통제 강화

소 관 부 서 ☆☆☆☆처

조 치 부 서 ☆☆☆☆처

내 용

1. 업무개요

최근 3년간 공사에서 총사업비 관리를 하고 있는 재정사업(국고 30%, 자체 70%)의 신규 발주는 아래 [표1]과 같이 총 17건이 있다.

[표1] 최근 3년간 재정사업 공사 발주 건

(단위 : 원)

연번	공사명	계약금액	비 고
1	(긴급)■■■■■권(2차) 급수체계조정사업(본구간) 시설공사	8,832,273,500	
2	■■■정수장 고도정수처리시설 설치사업 시설공사	61,717,151,029	
3	■■■■■권 광역상수도 관로복선화사업(1차) 시설공사	53,445,387,355	
4	■■■광역상수도 송수관로 복선화사업 시설공사	33,561,271,442	
5	■■■광역상수도(1단계) 노후관 개량사업(2차) 시설공사	45,146,739,709	
6	■■■계통 광역상수도 관로복선화사업 시설공사	25,367,745,290	
7	■■■■■권 4차 급수체계조정사업 시설공사(제1공구)	25,578,727,000	
8	■■■■■권 4차 급수체계조정사업 시설공사(제2공구)	10,853,656,000	
9	■■■■■산업지역 공업용수도(해수담수화)사업 건설공사	251,287,000,000	턴키사업
10	■■■■■권 광역상수도사업(제2공구-■■■계통) 및 추가사업 시설공사	42,991,752,779	
11	■■■■■권 광역상수도사업(제3공구-정수시설) 시설공사	44,664,005,000	
12	■■■■■권 광역상수도사업(제1공구-■■■계통) 시설공사	66,443,466,232	
13	■■■■■용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사	65,753,590,212	

14	■■■(Ⅰ 단계)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(■■■구간)	73,774,129,834	
15	■■■(Ⅰ 단계)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(■■■구간)	31,396,542,159	
16	■■■광역상수도 노후관 개량사업(2차) 및 추가사업 시설공사	24,415,054,929	
17	■■■■(Ⅳ) 광역상수도(■■■■계통) 복선화사업 시설공사	32,023,036,180	

자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「예산관리지침」에 따르면, 경영전략회의 심의와 이사회 의결을 거쳐 당해 회계연도 개시 전까지 예산을 확정하여야 하며, 관련 법령 및 기준에서 정하는 바에 따라 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.

「투자심사 및 총사업비관리에 관한 규정」 및 「투자및자금업무심의위원회운영지침」에 따르면, 투자사업 중 총사업비 50억 원 이상의 사업 등에 대해서 위원회를 구성하고 투자 및 자금업무를 심의하여 이사회에 보고한다.

「자금관리규정」 제6조에 따르면, 장·단기 자금수지를 고려하여 공사의 사업이 원활하게 추진되고 금융비용을 절감할 수 있도록 자금을 관리하여야 한다.

「재무관리준칙」 제8조에 따르면, 자금관리 업무 담당 부서의 장은 「자금관리규정」에 따라 자금운용계획을 수립하고 계획대로 이행이 될 수 있도록 노력해야 하며, 장·단기 자금수지 예측을 통해 적정 시재를 유지하여 불필요하게 차입 규모가 증가하지 않도록 노력하여야 한다.

「이사회운영규정」 제5조에 따르면, 예산의 확정 및 변경, 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환계획 등은 이사회에 부의하여 의결하여야 한다.

「건설기술관리규정」 제4조에 따르면, 건설공사를 적정하고 합리적으로 수행할 수 있도록 그 타당성 및 적정성 등을 심의하고 「건진법 시행령」 제19조에 따른 기술자문위원회의 기능을 수행하기 위하여 기술심의위원회를 둔다.

동 규정 제5조에 따르면, 총용역비 5억 원 이상의 설계 등 용역(자체설계 포함)의 성과품에 대하여 기술적 타당성 및 적정성에 대하여 심의한다.

「건설기술 진흥법(이하, 건진법) 시행령」 제19조에 따르면, 발주청은 기술자문위원회를 구성하고 건설공사의 설계 및 시공 등의 적정성에 관하여 발주청이 자문하는 사항에 대하여 심의한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1]에 명시된 공사 총 16건(“■■■■■산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업 건설공사”는 턴키공사로 제외)의 1차년도(설계 후 최초 착공년도)에 대해서 계획 대비 실 착공일을 확인한 결과, 아래 [표2]와 같이 전 공사에서 착공이 지연되었다.(평균적으로 약 120일)

[표2] 1차년도 공사 착공시기

(단위 : 일)

연번	공사명	예정 착공일	실 착공일	차 이
1	(긴급)■■■■■권(2차) 급수체계조정사업(본구간) 시설공사	2024-01-16	2024-06-01	137
2	■■■정수장 고도정수처리시설 설치사업 시설공사	2024-01-08	2024-04-25	108
3	■■■■■권 광역상수도 관로복선화사업(1차) 시설공사	2023-12-21	2024-04-16	117
4	■■■광역상수도 송수관로 복선화사업 시설공사	2023-07-03	2023-10-23	112
5	■■■■■광역상수도(1단계) 노후관 개량사업(2차) 시설공사	2023-06-09	2023-10-16	129
6	■■■■■계통 광역상수도 관로복선화사업 시설공사	2022-12-22	2023-05-16	145
7	■■■■■권 4차 급수체계조정사업 시설공사(제1공구)	2022-11-14	2023-03-27	133
8	■■■■■권 4차 급수체계조정사업 시설공사(제2공구)	2022-11-14	2023-05-17	184
9	■■■■■권 광역상수도사업(제2공구-■■■계통) 및 추가사업 시설공사	2021-11-30	2022-03-14	104
10	■■■■■권 광역상수도사업(제3공구-정수시설) 시설공사	2022-04-01	2022-11-18	231
11	■■■■■권 광역상수도사업(제1공구-■■■계통) 시설공사	2021-11-22	2022-02-17	87
12	■■■■■용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사	2021-12-01	2022-02-08	69
13	■■■(Ⅰ 단계)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	2021-11-02	2022-02-07	97
14	■■■(Ⅰ 단계)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(광양구간)	2021-11-02	2022-02-07	97
15	■■■■■상수도 노후관 개량사업(2차) 및 추가사업 시설공사	2021-09-29	2021-12-02	64
16	■■■■■(Ⅳ) 광역상수도(■■■■■계통) 복선화사업 시설공사	2021-05-11	2021-09-01	113

자료: 감사 제출자료 재구성

또한, 위 공사들의 예산 집행현황을 확인한 결과, 아래 [표3]과 같이 당초

계획과 달리 감액 준공된 사례가 16건 중 10건(62.5%)이 있었으며, 예정 집행예산 약 1,764억 원 중 실적은 1,118억 원(63.4%)만이 집행되었다.

[표3] 1차년도 공사 예산집행 현황


(단위 : 원)

연번	공사명	계약금액	준공금액	차 이
1	(긴급)■■■■■권(2차) 급수체계조정사업(본구간) 시설공사	5,332,280,000	5,332,280,000	-
2	■■■정수장 고도정수처리시설 설치사업 시설공사	16,222,000,000	16,222,000,000	-
3	■■■■■권 광역상수도 관로복선화사업(1차) 시설공사	19,853,500,000	19,853,500,000	-
4	■■■광역상수도 송수관로 복선화사업 시설공사	4,700,000,000	2,524,000,000	(2,176,000,000)
5	■■■광역상수도(1단계) 노후관 개량사업(2차) 시설공사	8,016,000,000	8,016,000,000	-
6	■■■계통 광역상수도 관로복선화사업 시설공사	9,294,183,890	8,000,300,000	(1,293,883,890)
7	■■■■■권 4차 급수체계조정사업 시설공사(제1공구)	25,578,727,000	6,300,000,000	(19,278,727,000)
8	■■■■■권 4차 급수체계조정사업 시설공사(제2공구)	10,853,656,000	1,105,500,000	(9,748,156,000)
9	■■■■■권 광역상수도사업(제2공구-■■■계통) 및 추가사업 시설공사	8,746,100,000	5,446,200,000	(3,299,900,000)
10	■■■■■권 광역상수도사업(제3공구-정수시설) 시설공사	8,688,900,000	1,536,000,000	(7,152,900,000)
11	■■■■■권 광역상수도사업(제1공구-■■■계통) 시설공사	12,791,900,000	6,158,000,000	(6,633,900,000)
12	■■■■■용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사	12,171,500,000	2,055,570,000	(10,115,930,000)
13	■■■(Ⅰ 단계)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(■■■구간)	15,325,700,000	15,325,700,000	-
14	■■■(Ⅰ 단계)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(■■■구간)	4,318,798,000	4,290,187,000	(28,611,000)
15	■■■■■상수도 노후관 개량사업(2차) 및 추가사업 시설공사	10,000,000,000	5,119,000,000	(4,881,000,000)
16	■■■권(Ⅳ) 광역상수도(■■■■■계통) 복선화사업 시설공사	4,502,300,000	4,502,300,000	-

자료: 감사 제출자료 재구성

위와 같이 계획 대비 착공 지연 및 예산 미집행이 발생하는 사유를 살펴보면, 아래 [그림]과 같이 인허가 및 보상 협의 기간이 소요되어 적정 시기에 착공이 어려웠으며, 계획한 노선에 시공이 불가하여 노선을 조정한 사항 등이 주요 사유로 확인되었다.

[그림] 수도건설 공기 지연 사유

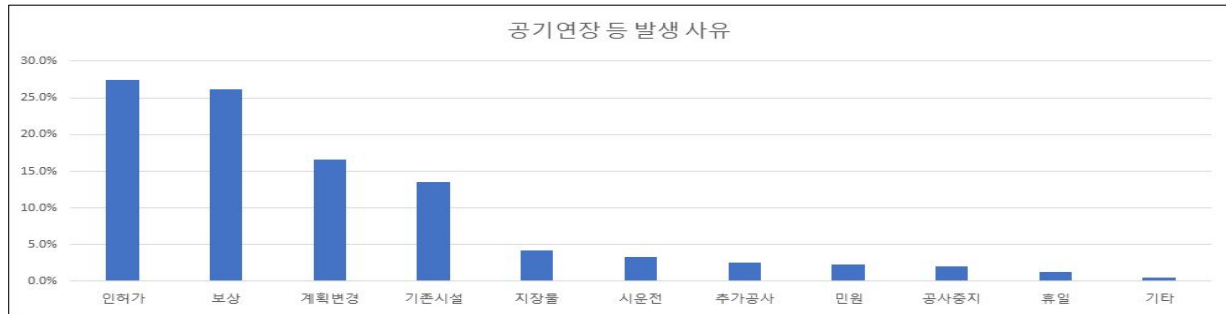

자료: 감사 제출자료 재구성

한편, 「이사회운영규정」 등에 따라 우리 공사에서는 익년도 예산(안) 및 운영계획(안)과 차입계획(안) 등에 대해서, 심의를 거쳐 매년 12월경에 이사회에 부의 후 최종 확정하고 있다.

그런데, 위에 확인된 바와 같이 재정 수도사업의 경우 해당년도에 계획한 예산을 집행하지 못하는 상황이 발생하고 있으며, 이로 인해 기관의 자금관리 예측정확도는 떨어지고, 안정적인 자금흐름 관리가 어려워질 우려가 있다.(2023년 우리 공사의 자금관리 정확도는 87.89%(집행금 기준) 수준)

따라서, 기관의 자금관리 예측정확도를 높이고, 불필요한 차입금을 최소화하여 금융비용을 절감할 수 있도록 자금을 관리하기 위해서는, 예산 집행계획의 현실화가 필요하다.

그러므로, 장기 계속 공사 중 적어도 설계용역이 준공되고 받주하는 최초 착공년도(1차년도) 공사분에 대해서는 현장에서 당초 계획대로 공사 추진 할 수 있도록, 설계단계에서 주요 인허가 사항 등이 완료될 수 있도록 지속 노력이 필요하다.

관련부서 의견 ☆☆☆☆처는 인허가 사항은 협의 대상기관이 다양하고, 협

의·승인에 상당한 시일이 소요되는 등 어려움이 존재하나, 설계단계 인허가 강화를 위해 설계 내실화 종합대책 수립('23.11) 등 지속적으로 노력하고 있으며, 향후에도 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 ☆☆☆☆처장은 예산 집행계획 현실화 및 발주 이후 원활한 공사 수행이 가능하도록, 최초 착공년도 설계 시 적정 공사구간 선정 및 관련 인허가 사항을 조속히 완료될 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**
