

감사결과 처분요구서

- 건설현장 특정감사(□□, ○○, ☆☆) -

2021. 11.

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처 분
1	□□	외부반출 토사 활용을 통한 예산절감	공사	수범사례
2	○○	적극적 업무 처리를 통한 교통영향분석 개선비용 절감	공사	수범사례
3	☆☆	토사 운반거리 단축을 통한 예산절감	공사	수범사례
4	□□	세륜세차시설 설치비 반영에 관한 사항	공사	시 정
5	□□	옥상 방수공사 시행 범위에 관한 사항	공사	시 정
6	□□	건설공사 지정폐기물 처리비용 계상에 관한 사항	공사	시 정
7	○○	외부 토사 반입을 위한 시추조사 반영에 관한 사항	공사	시 정
8	○○	항공등화 배관 자재 선정에 관한 사항	공사	시 정
9	☆☆	호남고속철도 환승주차장 공사구역 중첩 반영	공사	시 정
10	☆☆	화물터미널 개량 공사 시행 시기에 관한 사항	공사	시 정
11	☆☆	하도급계약 적정성 검토에 관한 사항	공사	시 정
12	☆☆	탑승교 설치 및 예비품 반영에 관한 사항	공사	시 정

KAC 감 사 실

☐ 부경 · 부패신고: ☎ 02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

수 범 사 례

1

제 목 외부반출 토사 활용을 통한 예산절감

관 계 부 서 □□지역본부

구 분 공사

내 용

□□지역본부에서는 항공기 이동지역의 안전확보를 위하여 노후된 콘크리트 포장을 재포장하는 ‘□□공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장공사(이하 콘크리트 재포장공사라 한다.)’를 【표】와 같이 추진 중에 있다.

【표】 □□공항 국제선계류장 콘크리트 재포장공사 현황

(단위 : 천원)

사업명	사업년도	사업비 (총차년도)	사업내용	기대효과
□□국제공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장공사	2020년 6월 ~ 2025년 12월	7,595,000 (38,817,079)	콘크리트 재포장 : 115,903m2	포장 공용성 확보

공사 시행 중 발생한 토사에 대하여는 다른 건설공사에 효율적으로 활용될 수 있도록 토석정보공유시스템을 이용하여 토사를 활용하도록 하고 있으나 □□공항 주변 건설현장은 터파기 공종이 대부분으로 건설현장 발생 토사를 외부에 반출하기 위해서는 토사처리비와 운반비용이 추가로 소요된다.

한편, □□공항 녹지대는 급경사 비탈면과 저습지가 곳곳에 산재되어 있어 녹지대 식물의 제조작업이 곤란하고 습지대 물고임으로 인한 조류 서식으로 인하여 항공기 안전운항에 저해요소로 작용하고 있다.

이에 □□지역본부에서는 녹지대 급경사와 저습지 물고임에 따른 조류 유인을 해소하기 위하여 ‘□□공항 콘크리트 재포장공사’에서 발생한 토사를 유용하여 녹지대 경사를 완화하고 습지대를 제거 후 배수흐름을 개선하였다.

그 결과 외부 사토를 위한 토사 운반비와 사토처리비 304,000천 원을 절감하는 효과를 가져왔다.

조치할 사항

- ① 감사실에서 시행하는 2021년도 종합감사 수범사례에 포함, 평가결과에 따라 조치(수범사례)
- ② 전 소속기관장은 위 수범사항을 참고하여 업무에 적극 활용하시기 바랍니다.

수 범 사 례

2

제 목 적극적 업무 처리를 통한 교통영향분석 개선비용 절감

관 계 부 서 ○○지역본부

구 분 공사

내 용

‘○○공항 제3차 교통영향분석 개선대책(2016. 11월)’에 따르면 여객터미널 전면 고가도로는 4차로로 운영하도록 하고 있고 터미널 전면에는 버스승차장을 설치하여 이용객의 편의를 도모하도록 하고 있다.

그런데 여객터미널 전면 고가도로는 현재 3차로로 운영하고 있어 4차로로 도로를 변경하기 위해서는 기존 보도의 폭을 줄여 차로로 확보하여야 함에 따라 도로로 이동하는 이용객들의 불편이 야기될 수 있다.

또한, 버스승차장을 터미널 전면에 설치할 경우에는 대기버스 행렬로 인하여 커브사이드¹⁾의 혼잡이 가중될 우려가 있다.

이에 ○○지역본부에서는 기존 ‘○○공항 교통영향분석 개선대책’을 합리적으로 개선하기 위하여 ‘○○공항 제4차 교통영향평가 변경심의(2021. 6월)’를 통하여 심의위원회에 개선대책의 불합리성을 강조하고 대책의 변경을 지속적으로 요구²⁾하여 구 고가도로에 설치하도록 한 버스승차장을 신설 고가도로에 설치하

도록 위치를 변경하고 터미널 이용객들의 편의를 위하여 커브사이드를 현재 폭 원으로 유지하도록 개선대책을 변경 협의하였다.

그 결과 당초 예산 반영되어 있는 ‘○○공항 구 고가도로 정밀안전진단비’ 95,000천원의 예산을 집행하지 않게 되었고 교통영향분석 개선대책으로 인한 고가도로 시설개선 비용³⁾ 213,000천 원을 절감하는 등의 효과를 가져왔다.

조치할 사항

- ① 감사실에서 시행하는 2021년도 종합감사 수범사례에 포함, 평가결과에 따라 조치(수범사례)
- ② 전 소속기관장은 위 수범사항을 참고하여 업무에 적극 활용하시기 바랍니다.

1) ‘커브사이드’란 공항 여객터미널 전면부에 위치하여 차량에서 승객이 승하차 할 수 있도록 한 구역을 말한다.
2) 개선대책 변경 요구 내용 : 관계자 간담회 개최(1회), 지자체 방문(3회), 전문가자문(2회), 시뮬레이션 모니터링(1주)

3) ‘시설개선비용’에는 버스승차장 변경으로 인한 안내표지 변경, 고가도로 구조변경을 위한 시설개선비용, 보도폭 축소 및 차로 추가 설치를 위한 시설개선비용 등으로 구성된다.

수 범 사 례

3

제 목 토사 운반거리 단축을 통한 예산절감
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 공사
내 용

☆☆공항에서는 장래 여객 증가에 따른 주차장 적정 규모 확보를 위하여 ‘☆☆공항 주차장 확장공사’를 【표1】 과 같이 추진 중에 있다.

【표1】 주차장 확장공사 계약현황

(단위 : 천원)

사 업 명	사업년도	계약금액	사업내용	기대효과
☆☆공항 주차장 확장공사	2021.5월~11월	2,473,335	주차장 확장 33,000m ²	주차장 혼잡완화

‘☆☆공항 주차장 확장공사’는 기존 녹지대를 개량하여 주차장을 조성하는 공사로써 녹지대 개량에는 유효토사가 34,333m³ 발생하여 이를 적절히 처리하기 위하여 사토처리비 455,974천원(운반거리 13.5km)이 공사내역에 반영되어 있다.

한편, ☆☆공항에서는 사토처리에 따른 운반거리를 줄이기 위하여 공항 주변 지역의 토사 활용 가능 여부를 조사하고 인근 주민들에게 유효토사의 품질 우수성을 적극적으로 홍보하여 사토처리 운반거리를 【표2】 와 같이 당초 13.5km에서 최소 5.0km까지 줄이도록 하였다.

그 결과 사토 운반거리 단축을 통하여 사토처리비 123,364천 원의 예산을 절감하였다.

【표2】 사토 운반거리 변경 현황

구 분	운반거리	단위	당초수량	변경수량
사토처리	L=13.5km	m ³	34,333	-
	L= 5.0km	m ³	-	15,535
	L= 7.3km	m ³	-	6,283
	L= 8.1km	m ³	-	5,585
	L= 9.2km	m ³	-	6,930
합 계		m ³	34,333	34,333

조치할 사항

- ① 감사실에서 시행하는 2021년도 종합감사 수범사례에 포함, 평가결과에 따라 조치(수범사례)
- ② 전 소속기관장은 위 수범사항을 참고하여 업무에 적극 활용하시기 바랍니다.

시 정 요 구

4

제 목 세륜세차시설⁴⁾ 설치비 반영에 관한 사항

관 계 부 서 □□지역본부

구 분 공사

내 용

□□지역본부에서는 항공기 이동지역의 안전확보를 위하여 노후된 콘크리트 포장을 재포장하는 ‘□□국제공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장공사(이하 콘크리트 재포장공사라 한다.)’를 【표】와 같이 추진 중에 있다.

【표】 □□공항 국제선계류장 콘크리트 재포장공사 현황

(단위 : 천원)

사업명	사업년도	사업비 (총차년도)	사업내용	기대효과
□□국제공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장공사	2020년 6월 ~ 2025년 12월	7,595,000 (38,817,079)	콘크리트 재포장 : 115,903m ²	포장 공용성 확보

‘콘크리트 재포장공사’ 설계내역에는 공사장 비산먼지 발생 억제를 위하여 세륜세차시설을 설치하여 덤프트럭 등 장비의 이동 시 비산먼지를 억제하도록 하고 있다.


그런데, ‘콘크리트 재포장공사’는 □□공항 국제선 계류장의 무중단 운영을 위하여 공사구역을 【그림】과 같이 6단계로 나누어 시행중에 있어 공사구역별 진출입 위치가 상이하고 운영 중인 계류장과 접해 있어 여유부지가 협소함에 따

라 세륜세차시설을 고정하여 설치, 운영하기 곤란하다.

한편, 공사현장에서는 살수차를 운영하여 비산먼지 발생을 억제하고 있는 실정이다.

따라서, 공사에 반영되어 있는 세륜세차시설 설치비 73,972천원을 공사내역에서 제외할 필요가 있다.

【그림】 ‘콘크리트 재포장공사’ 공사구역 현황도

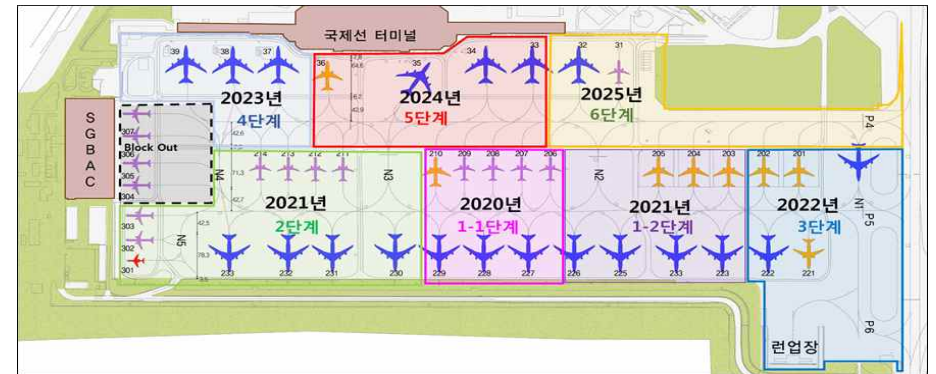

【관계부서 의견 및 판단】 □□지역본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□지역본부장은 ‘□□공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장공사’ 공사 현장이 협소하여 세륜세차시설을 설치, 운영하기 곤란함에 따라 공사에 반영되어 있는 세륜세차시설 설치비를 공사내역에서 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 조정(73,972천 원)하시기 바랍니다.(시정)

4) ‘세륜세차시설’이란 건설현장을 드나드는 트럭 등의 장비가 인접한 도로에 진입하기 전 차량의 몸체와 바퀴를 물로 씻어내는 장치를 말하며 공사장 주변에서 발생하는 비산 먼지를 최대한 저감하기 위한 장치이다.

시 정 요 구

5

제 목 옥상 방수공사 시행 범위에 관한 사항

관 계 부 서 □□지역본부

구 분 공사

내 용


□□지역본부에서는 □□공항 내 노후화된 건축물의 내구성 증진을 위해 ‘공사청사 도장 및 부대시설 보수공사’를 감사일 현재(2021. 10. 15.) 【표】와 같이 시행중에 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
공사청사 도장 및 부대시설 보수공사	2021.07.19. ~ 11.15.	381,859	A

위 공사는 공사청사 최상층 구 전망대(현 휴게시설, 일명 ‘숨 라운지’)의 누수 문제 해결을 위해 옥상 일부구역에 대한 방수공사를 포함하고 있으며, 공사 내역에는 【그림】과 같이 옥상바닥의 기존 방수층(방수시트 및 보호모르타르)을 재시공하고 지붕의 노후화된 금속패널 주변 코킹을 전면 재시공하는 것으로 계획되어 있다.

【그림】 공사청사 방수공사 시행부위 (지붕 및 옥상 바닥)

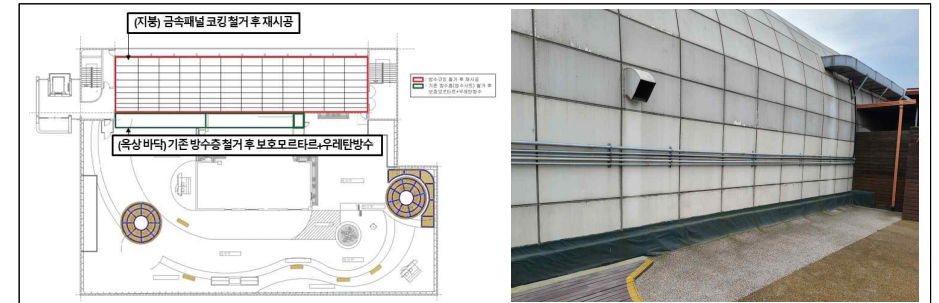

그런데 공사현장 옥상 바닥 방수시트는 【그림】과 같이 시설물 설치 상태가 대체적으로 양호하고 지붕 금속패널의 코킹이 손상되어 설치상태가 불량함에 따라 옥상 바닥 누수의 원인은 바닥 방수층의 파손이 아닌 지붕 금속패널의 손상된 코킹 부위에서 발생한 것으로 볼 수 있다.

또한, 최근 공사를 완료⁵⁾한 ‘공사청사 휴게시설 조성공사’를 시행하면서 해당 구역 하부의 내부 천장 누수부위에 배수통로를 설치하여 누수로 인한 시설물 손상을 최소화하였고, 옥상바닥 방수층을 일부 구간만 철거 후 재시공할 경우에는 신·구 방수층 연결부 등에 추가 누수가 발생할 수 있는 우려가 있다.

따라서 지붕 금속패널 코킹 철거 및 재시공은 전체 구간이 아닌 상태가 불량한 구간에 대해서만 선택 시행하고, 바닥 방수층 철거 후 재시공은 신규방수층 연결부 등의 추가 누수 우려로 인하여 공사 시행범위에서 제외하여 사업비를 절감할 필요가 있다.

【관계부서 의견 및 판단】 □□지역본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

5) 공사기간 : 2021. 5. 17. ~ 8. 4.

조치할 사항

□□지역본부장은 공사청사 옥상의 방수공사는 누수의 원인이 되는 노후된 금속 관넬의 코킹 일부 부위만을 교체하고 신구방수층 연결부위의 추가 누수 발생 우려에 따라 시설물 설치상태가 양호한 옥상바닥 방수층 철거 및 재시공은 사업범위에서 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 조정(6,900천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

6

제 목 건설공사 지정폐기물 처리비용 계상에 관한 사항

관 계 부 서 □□지역본부

구 분 공사

내 용

□□지역본부에서는 공사청사 및 항공지원센터의 노후화된 외벽 등의 보수·도장을 위해 ‘공사청사 도장 및 부대시설 보수공사’를 감사일 현재(2021. 10. 15.) 【표】와 같이 시행중에 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
공사청사 도장 및 부대시설 보수공사	2021.07.19. ~ 11.15.	381,859	A

「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 "환경관리비"라 한다.)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상⁶⁾하여야 하고, 같은 법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등)에서는 [별표8]의 환경관리비 세부 산출기준에 따라 건설공사 현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용과 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용을 합하여 환경관리비를 산정하되 사용실적에 따라 정산하도록 하고 있다.

6) 적용제외 공사 : 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리공사

한편, 도장공사 시 발생하는 페페인트의 경우 「폐기물관리법」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에 따라 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 인체에 위해를 줄 수 있는 ‘지정폐기물’로 분류되어 있어 관계법령에 따라 적절한 처리가 요구된다.

그런데 위 공사내역에는 페인트칠 도장 작업 6,210㎡(69통/18L)가 반영되어 있어, 지정폐기물인 페페인트에 대한 처리비용이 공사 산출내역서에 반영되어 있어야하나 지정폐기물 처리비용이 반영되어 있지 않아 폐기물이 적법하게 처리되지 않을 우려가 있으므로 페페인트 처리를 위한 폐기물처리비용의 반영이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] □□지역본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□지역본부장은 ‘공사청사 도장 및 부대시설보수공사’에서 발생하는 지정폐기물(페페인트)에 대하여 관계법령에 따른 적법한 처리를 위하여 폐기물 처리비용을 반영하는 설계변경을 통해 계약금액을 조정하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

7

제 목 외부 토사 반입을 위한 시추조사 반영에 관한 사항
관 계 부 서 ○○지역본부
구 분 공사
내 용

○○지역본부에서는 ○○공항 이용객들의 주차장 혼잡완화를 위하여 ‘○○공항 단기대책 2단계 매입부지 주차장 개발 기본 및 실시설계 용역(이하 ‘주차장 설계용역’이라 한다.)’을 【표1】과 같이 추진 중에 있다.

【표1】주차장 설계용역 계약현황

(단위 : 천원)

사 업 명	사업년도	사업비 (총차년도)	사업내용	기대효과
매입부지 주차장 개발 기본 및 실시설계 용역	2020년 10월 ~ 2021년 12월	385,741 (451,091)	주차장 설계 : 115,903m2	주차장 혼잡완화

‘주차장 설계용역’ 도급내역에는 주차장 하부지반의 기초지력력 조사를 위하여 【표2】와 같이 주차장 부지내 시추조사 4개소와 매입부지내 토사활용이 곤란한 경우를 대비하여 외부 토사반입을 위한 시추조사 2개소가 설계내역에 반영되어 있다.

【표2】 ‘주차장 설계용역’ 시추조사 반영 현황

구 분	조사장소	조사수량	반영항목	반영금액
시추조사	주차장 부지내	4개소	표준관입시험 등 현장 및 실내시험	33,913천 원
”	외부 지정장소	2개소	”	15,620천 원
합 계	-	6개소	-	49,533천 원

그런데 ‘주차장 확장부지에 대한 시추조사 실시결과 보고서’에 따르면 부지내 지반의 흙은 양호한 상태로 조사⁷⁾되어 기존 매입부지의 토사는 주차장 개발사업에 활용이 가능하다.

따라서 외부토사 반입이 필요 없어 시추조사 내역에 반영되어 있는 외부 시추조사 비용(15,620천원)을 설계내역에서 제외할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지역본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○지역본부장은 ‘○○공항 단기대책 2단계 매입부지 주차장 개발 기본 및 실시설계 용역’ 시추조사 결과에 따르면 부지내 지반의 흙은 양호한 상태로 조사되어 외부 토사 반입이 불필요함에 따라 설계에 반영되어 있는 외부 시추조사 비용을 설계내역에서 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 조정(15,620천 원)하시기 바랍니다.(시정)

7) ‘지반조사 결과에 따른 노상토 적정성 검토 결과 보고서’에 따르면 노상토 검토 결과 지반개량은 불필요한 것으로 검토됨(○○지역본부 자료 제공)

시 정 요 구

8

제 목 항공등화 배관 자재 선정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○지역본부

구 분 공사

내 용

○○지역본부에서는 항공기 안전운항을 위하여 2021년에 A사(대표 B)와 ‘○○공항 항공등화보수공사’를 계약체결(계약금액 : 1,246,275천 원, 공사기간 : 2021. 4. 19. ~ 2021. 11. 14.)하고 2021. 4. 19. 착공하여 2021. 11. 14. 준공예정으로 시행 중에 있다.

「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제①항 제4목 및 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제①항 제4목 ‘시공방법의 변경’에 따라 계약담당자는 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 계약상대자에게 서면으로 통보하고 설계변경 하도록 하고 있다.

○○지역본부에서 시행중인 위 공사의 공정별 내역 중에는 유도로중심선등 총 6회로(A~F) 중 장애발생시 장애구간을 축소하고 회로별 부하량을 분배하기 위해 구간이 길고 부하량이 많은 2회로(A, B)를 4회로(A, B, G, H)로 개량하도록 공사에 반영되어 있다.

또한 설계도서(도면, 내역서, 지방서 등)를 확인한 결과 증설되는 2회로(G,

H)의 분기점인 P유도로(아스콘 포장지역, 배관길이 30m) 유도로중심선등에서 #10-4 맨홀(녹지대지역, 배관길이 40m)까지는 스틸배관(ST 54C 2Line)으로 설계되어 있다.

그런데 녹지대에 설치되는 배관의 경우에는 아스콘 포장지역과 달리 배관시공 시 열이나 압력을 받지 않으며 시공완료 후에도 차량 등의 통행이 없어 스틸배관(ST 54C)으로 시공하기 보다는 자재와 노무비용이 다소 적게 소요되는 내충격성 염화 비닐전선관(HI-PVC 54C)을 사용하여 시공하도록 하여 예산을 절감할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지역본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○지역본부장은 유도로중심선등 회로가 증설되는 2회로(G, H)의 분기점인 P유도로 유도로중심선등에서 #10-4 맨홀까지 구간 중 배관시공 시 열이나 압력을 받지 않으며 시공완료 후에도 차량 등의 통행이 없는 녹지대 구간(배관길이 40m)에 대하여는 자재와 노무 비용이 다소 적게 소요되는 내충격성 염화 비닐전선관(HI-PVC 54C)을 사용하여 시공하도록 설계변경을 통해 계약금액을 조정(13,582천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

9

제 목	호남고속철도 환승주차장 공사구역 중복 반영
관 계 부 서	☆☆공항
구 분	공사
내 용	

☆☆공항에서는 장래 여객 증가에 따른 주차장 적정 규모 확보를 위하여 ‘☆☆공항 주차장 확장공사’를 【표1】 과 같이 추진 중에 있다.

【표1】 주차장 확장공사 계약현황

(단위 : 천원)

사 업 명	사업년도	계약금액	사업내용	기대효과
☆☆공항 주차장 확장공사	2021.5월~11월	2,473,335	주차장 확장 33,000m ²	주차장 혼잡완화

한편, 국가철도공단에서는 장래 공항 활성화와 공항 접근성 향상을 위하여 ‘호남고속철도 2단계 건설공사’를 시행 예정으로 【표2】 와 같이 ☆☆공항 여객터미널 전면에 환승주차장을 신설할 계획으로 있다.


【표2】 환승주차장 건설공사 개요

사 업 명	사업년도	사업내용	기대효과	비고
호남고속철도 2단계 건설공사(환승주차장)	2021년 12월 ~ 2025년 12월	주차빌딩 신설 (지상 3층)	KTX 이용객 주차수요 확보	연면적 6,613㎡

그런데, ‘☆☆공항 주차장 확장공사’는 여객터미널 전면 유희 부지를 활용하여 여객주차장을 조성할 계획에 있으며 호남고속철도 환승주차장은 【그림】 과 같이 ☆☆공항 여객터미널 전면 주차장에 위치할 계획으로 주차장 확장공사와

공사구역이 일부 중복된다.

【그림】 환승주차장 건설공사 위치도

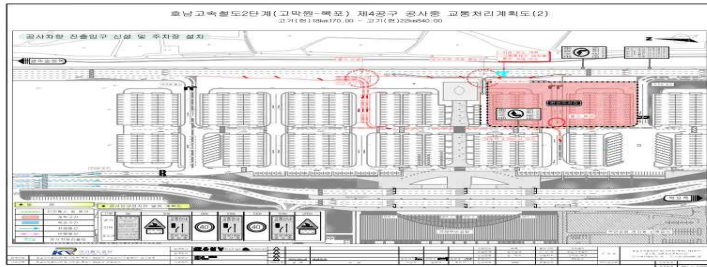

따라서 환승주차장 공사로 인한 매몰비용 발생 예방을 위하여 주차장 확장공사 공사구간과 중복되는 일부구간(120㎡, 14,114천원)을 사업에서 제외하여 예산을 절감할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 매몰비용 발생 예방을 위하여 ‘호남고속철도 환승주차장 공사’에 반영되어 있는 공사구역 중 ‘☆☆공항 주차장 확장공사’ 공사구역과 중복 반영되어 있는 공사구역을 설계내역에서 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 조정(14,114천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

10

제 목 화물터미널 개량 공사 시행 시기에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆공항

구 분 공사

내 용

☆☆공항에서는 기존 장비고의 공간 부족 문제 해소와 ☆☆·△△공항 통합 대비 화물터미널의 기능 복원을 위해 ‘☆☆공항 장비고 신축 및 기존시설 개량 공사’(도급금액 : 2,397,362천 원, 공사기간 : 2021. 4. 26. ~ 11. 25.)를 시행하고 있다.

☆☆공항에서는 기존 장비고의 공간 부족으로 인하여 화물터미널⁸⁾ 일부를 장비와 자재창고(토목유지관리 자회사 사무실 포함)로 사용하여 왔으며, 위 장비고 신축공사 완료 후에는 화물터미널에 보관중인 장비와 자재창고 시설을 신축 장비고로 이전할 계획이다.

한편, 위 공사에는 화물터미널 본래 기능 회복과 향후 화물업체 임대 등을 위해 화물터미널에 대한 노후시설 보수⁹⁾와 사무실 내부개량 및 창고시설(현 자회사 사용) 철거 등이 반영되어 있다.

8) 현재 화물터미널은 혼련용 항공기 정비고와 토목·조경 장비고 및 자재창고로 절반씩 나뉘어 사용되고 있음

9) 오버헤드도어 교체, 철골 내화 도장 등

그런데, 감사일 현재까지 화물터미널 활용계획이 수립되지 않고 있고 향후 사용자(임대업체 등)에 따라 시설개량 범위가 변경되거나 창고시설 등이 재사용될 수 있는 등 화물터미널 사무실 내부개량과 창고시설의 향후 세부 활용 여부가 결정되어 있지 않음에 따라 중복 투자 방지 등을 감안하여 사업 시행시기를 조정할 필요가 있다.

따라서 화물터미널 사무실 내부개량과 창고시설 철거에 대해서는 중복 투자 방지 및 효율적 공사 시행을 위해 향후 화물터미널 세부 활용 계획 수립 이후 공사를 추진하는 것이 타당하다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 ‘☆☆공항 장비고 신축 및 기존시설 개량공사’ 중 화물터미널 사무실 내부개량과 창고시설 철거에 대해서는 향후 화물터미널 세부 활용 계획 수립 이후 공사를 시행할 수 있도록 시행 시기를 조정하는 설계변경을 통해 계약금액(7,300천 원)을 조정하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

11

제 목 하도급계약 적정성 검토에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆공항

구 분 공사

내 용

☆☆공항에서는 ☆☆·△△공항 통합계획에 의거 여객터미널의 여객처리능력 향상 및 국제선·국내선 시설의 효율적 활용을 위해 ‘☆☆공항 여객터미널 시설 재배치 공사’를 시행(도급금액 7,307,443천 원, 공사기간 : 2021. 5. 6. ~ 2022. 12. 26.)하고 있으며, 감사일 현재(2021. 10. 29.)까지 계약상대자(주식회사 A)가 체결하여 통보한 하도급 계약은 【표】와 같다.

【표】 하도급계약 체결 현황

(단위 : 천원)

하도급 공종	하도급자	하도급 대상금액	하도급 계약금액	하도급비율
수하물처리시설 공사	B	1,215,247	1,023,000	84.2%
기계공사	C	1,035,430	880,000	84.9%
금속 및 수장공사	D	591,250	495,000	83.7%
철골공사	E	343,497	330,000	96.1%
금속 및 창호공사	F	483,620	431,530	89.2%

「건설산업기본법」 제31조와 같은 법 시행령 제34조(하도급계약의 적정성 심사 등)에 따르면 발주자는 하도급 계약금액이 도급금액 중 하도급부분에 해당하는 금액의 100분의 82에 미달하는 지 여부와 예정가격 중 하도급부분에 해당하는 금액의 100분의 64에 미달하는지 여부를 각각 검토하여 하수급인의 시공능력,

하도급 계약내용의 적정성 등을 심사하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆공항에서는 위 하도급계약의 적정성 심사 대상 여부를 검토함에 있어 하도급 계약금액이 도급금액 중 하도급부분에 해당하는 금액의 100분의 82에 미달하는 지 여부는 검토하였으나 예정가격 중 하도급부분에 해당하는 금액의 100분의 64에 미달하는 지 여부는 검토하지 않아 하도급계약이 부실하게 체결될 우려가 있다.

따라서, 위 공사의 하도급 계약에 대하여 예정가격에 따른 하도급 적정성 검토를 추가로 시행하여 하도급 계약이 부실하지 않도록 검토할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 ‘☆☆공항 여객터미널 시설재비치공사’ 하도급 계약에 대해 하도급 계약금액이 예정가격 중 하도급부분에 해당하는 금액의 100분의 64 이상인지 여부를 추가 검토하시어 하도급계약이 부실하게 체결되지 않도록 관련법령에 따라 조치하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

12

제 목 탑승교 설치 및 예비품 반영에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆공항

구 분 공사

내 용

☆☆공항에서는 ‘☆☆공항 여객터미널 시설재배치 공사’를 주식회사 대승건설(대표 임현주)과 2021. 5. 3. 계약(계약금액 7,307,443천 원, 계약기간 2021. 5. 6. ~ 2022. 12. 26.)을 체결하여 시설공사를 시행 중에 있다.

‘☆☆공항 여객터미널 시설재비치 공사’는 ☆☆☆△△공항 통합이전 계획에 따라 증가하는 항공수요에 대응하기 위하여 【표】와 같이 신규 탑승교 1대 제작·설치와 예비품을 납품하도록 되어 있다.

【표】☆☆공항 탑승교시설 사업내용

구 분	수 량	금 액	비 고
탑승교 설치 및 중앙감시반 연동	1식	207,110천 원	
탑승교 제작비	1식	841,782천 원	
예비품 및 공구	17종	50,805천 원	
합 계		1,099,697천 원	

신규 제작 중인 탑승교 구성품에는 우리 공사 홍보를 위하여 탑승교 고정터널 측면 유리에 홍보용 디스플레이(1,230mm × 696mm) 1대를 설치하도록 되어 있다.

그런데 홍보용 디스플레이는 햇빛이 강할 때에는 디스플레이의 시인성을 확보하기 곤란하고 탑승교 외부에 설치하도록 하고 있어 항공기에 탑승하는 공항 이용객들에게는 홍보 효과가 크지 않다.

따라서 탑승교 외부에 설치되는 홍보용 디스플레이는 설치하지 않는 것이 타당하다.

또한, ☆☆공항에서는 2020년과 2021년 분기자재 구매를 통하여 탑승교 예비품중 인버터와 모터 감속기를 보유하고 있으며 기존 탑승교시설은 내구연수가 오래되어 교체 예정으로 있어 인버터 및 모터 감속기를 추가 확보할 필요가 없다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 '☆☆공항 여객터미널 시설재배치 공사'에 반영되어 있는 홍보용 디스플레이는 탑승교 외부에 설치되어 홍보효과가 적고 햇빛이 강할 때 시인성 확보가 곤란함에 따라 공사내역에서 제외하고, 탑승교 예비품으로 반영되어 있는 인버터와 모터 감속기는 기존 탑승교 시설이 내구연수가 오래되어 교체예정에 있고 감사일 현재 분기자재 구매를 통하여 예비품을 확보하고 있음에 따라 설계내역에서 인버터와 모터 감속기를 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 조정(18,374천 원) 하시기 바랍니다.(시정)
