

일련번호	03	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ◀◀◀◀◀ 준공에 따른 †† 호 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 운영 계획 수립

소 관 부 서 ★★★★★처

조 치 부 서 ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

★★★★처는 †† 호의 긍정적 이미지를 부각하고 환경·문화·관광 자원의 가치 증진을 위한 홍보·문화·교육·연구사업을 시행하기 위한 목적으로 '19년 사단법인 †† 호ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ을 설립하였다. 사단법인이 입주하고 있는 †† 호 ㄹㄹㄹㄹㄹ센터는 ◀◀◀◀◀ 제ㄷㄷ호 수변공원에 위치하고 있으며, ◁◁지구 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ협의회 합의('16.7)에 따라 ① ◁◁지구 수질·대기환경 및 환경개선 성과를 활용한 환경교육 ② 주변시설과 연계한 체험학습 ③ 철새도래지 일반 방문객 탐조 및 휴게 공간 ④ †† 호ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 사무공간을 주요기능으로 한다. 준공 이후 시설운영과 관련하여 추후 재논의 하기로 하였으며, 환경개선특별대책 로드맵 사업비 중 '교육·문화·홍보 기반시설 사업비'로 집행하였고, 설립('18.12) 이후 현재까지 ★★★★★처에서 임시 운영·관리 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조(공공시설 및 토지 등의 귀속) 제1항에 따르면 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되며, 동법 제4항에 의거 해당 사업이 준공되어 관리청에 준공인가 통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속된 것으로 본다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○처는 ▲▲▲▲▲ 조성사업 10차 지역의 준공을 위한 실시계획 변경(제26차)을 신청('24.6)하였고, 산업입지 및 개발에 관한 법률 제17조의2 및 제19조의2의 규정에 따라 실시계획의 변경승인 및 변경고시 절차가 완료('24.11)되었다. 주요 변경 내용으로 (ㄱ)(ㄱ)시 요청에 따라 ㄱㄱ호 공원의 종류를 당초 수변공원에서 문화공원으로 변경하는 내용을 포함하고 있으며, 해당 내용을 반영하여 10차 지역 분리준공 신청할 경우 '25년 상반기 준공이 예상되고 준공 이후 시설물 운영주체는 (ㄱ)(ㄱ)시로 이관된다.

† † 호 ㄹㄹㄹㄹ센터는 ㄱㄱ호 공원 내 위치한 공원시설물로서 준공 후 (ㄱ)(ㄱ)시 무상귀속 대상에 해당하나 신설 법인의 안정화 등을 명분으로 그간 부분준공 지역에서 제척해왔으며, 미준공 상태의 시설물로서 현재까지 ★★★★★처 주관으로 운영관리를 시행하고 있다. ★★★★★처는 향후 소유주인 (ㄱ)(ㄱ)시의 신속한 이관과 지속위 합의사항('16.7) 이행을 위하여 '† † 호 ㄹㄹㄹㄹ센터 현안사항'을 제476회 ㄹㄹㄹㄹ협의회('23.5) 안건으로 상정하였다. 해당 안건에 대한 논

의 시 ★★★★★처는 사단법인이 지정기부금 단체로서 공익법인에 해당하므로 공유재산법 시행령 제13조의 규정에 따른 사용·수익 허가를 통해 공원 이관 후에도 지속적인 입주가 가능한 것으로 검토하였으며, 협의회 논의결과 관계기관 (K-water↔(주)K시) 간의 선 협의 후 논의를 재개하기로 하였다.

한편, 사단법인에서 K-water에 제출한 '※※ 호○○○○○○○○ 사업보고 및 회계결산 제출 내역'(‘23.2, ‘24.2)을 검토한 결과, K-water 위탁사업이 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 기존 감사의견에서 제시했던 바와 같은 정부, 지자체, 공공기관 공모사업 참여 등 중장기 자립을 위한 실적을 확보하기 위해서는 보다 많은 시간이 필요할 것으로 판단된다. 또한 주민참여형 환경개선사업, ○○○○○센터 환경교육 프로그램, 각종 행사 및 생태관광사업과 무인카페 운영 등 ○○○○○센터와 주변 인프라를 기반으로 시행하는 사업들이 대부분인 점을 감안할 때, ○○○호 공원 준공에 따라 법인 사무공간을 이주하게 되는 상황이 발생할 경우 법인의 중장기적인 자립성 약화가 불가피할 것으로 우려된다.

★★★★처에서 검토한 바와 같이 공유재산법에 따른 사용·수익허가를 통해 파트너십에서 지속적으로 입주토록 하는 방안은 (주)K시 의회, 공유재산심의회 심의 등이 필요하나 (주)K시 주관부서(국국국국과)는 해당 절차 이행에 미온적인 입장이며, 현재까지 ○○○○○센터 활용 및 사단법인 입주와 관련하여 명확하게 합의된 바는 없는 상황이다. 따라서 ○○○호 공원 준공 이후에도 ○○○○○센터 주변 인프라를 활용한 법인의 안정적인 운영과 중장기적인 자립을 지원할 수 있도록 조치방안 마련이 필요하다.

관련부서 의견 사단법인 * * 호 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ의 * * 호 교육·문화·홍보
기능 유지 및 중장기 자립 방안을 마련하기 위하여, (ㄱ)(ㄱ)시 관계부서(ㄱㄱㄱㄱ
과)와 논의를 통해 향후 ㄴㄴㄴㄴ센터 활용 및 사단법인 입주 관련 조치방안을
마련하도록 하겠다는 의견을 제시하였다

조치할 사항 ★★★★★처장은 사단법인 * * 호 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ의 중장기
자립을 위한 운영계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	04	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	계약금액 조정	재정상 조치금액	280백만원

시정완료(금액)

제 목 ○○○○ ○○○○○ 건설공사 지하차도 시점부 사면보강에
관한 사항

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단(舊 ∞∞∞사업단)은 ◀◀◀◀◀ 및 (ㄱ)(ㄴ) ∩∩신도시 개발에
따른 교통혼잡 해소를 위하여 ◀◀◀◀◀ ○○○○ ○○○○○ 건설공사를 시행 중
이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「(계약예규) 공사일반계약조건」 제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의
제한 등) 제①항 따르면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제
98조에 따른 기본설계 기술제안입찰 및 실시설계 기술제안입찰(기술제안이 채택
된 부분에 한함)의 방법으로 체결된 공사계약에 있어서는 설계변경으로 계약내
용을 변경하는 경우에도 정부에 책임있는 사유 또는 천재·지변 등 불가항력의

사유로 인한 경우를 제외하고는 그 계약금액을 증액할 수 없다.

●●●● ●●●●● 건설공사 입찰안내서 1.2.4 계약상대자 공사시행 및 비용부담 한계에 따르면 계획변경에 따라 추가비용이 발생할 경우, 발생 원인을 따져 책임자가 비용을 부담하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○사업단은 ●●●● ●●●●● 건설공사 지하차도 시점부 절토부 ↑↓ 방향 지층선 상이로 인하여 절토부 사면보강을 위한 옹벽 설치계획을 실정보고를 통해 승인하고, 설치비용 280백만원을 설계변경을 통해 증액하고, 옹벽설치를 지난 '24년 3월에 완료하였다.

그런데 ●●●● ●●●●● 건설공사는 실시설계 기술제안 입찰 공사로 시공사 실시설계 기술제안 당시 지반조사 및 실시설계를 통해 표준경사로 설계에 적용하였고, 설계와 실제 시공 여건이 상이하여 발생한 설계변경은 기술제안 당시 현장 지반조사를 통해 표준경사로 설계한 시공사의 귀책으로 볼 수 있다.

따라서, 옹벽설치 사면보강 설계 변경 비용 280백만원은 계약금액 내 합산 조정으로 공사비를 감액하는 것이 타당하다.

관련부서 의견 ○○○○사업단은 감사의견에 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 지하차도 사면보강 옹벽설치 공사비 280

백만원을 계약금액 내 합산조정(감액) 하시기 바랍니다. (시정완료(금액))

일련번호	05	감사자	전기 3급 →→→		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	시정요구(금액)	재정상 조치금액	267,553,951

시정요구(금액)

제 목 지하주차장 건물에너지관리시스템 중복 물량 조정

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단은 「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정(Co.Co.Co.Co. Co.Co.부 고시 제2024-110호)¹⁾」에 의거 ⇔⇔호 근린공원 지하주차장의 효율적 에너지 관리를 위하여 건물에너지관리시스템(BEMS)²⁾를 도입하고자 한다.

2. 감사결과 확인된 문제

현재 BEMS 시스템은 기계설비(냉난방 등) 감시제어 신호를 위한 케이블 공사분이 통신공사와 기계설비 제어시스템(관급자재)에 중복되어 반영되어 있어, 중복된 내역을 조정하여 사업비 중복 집행(약 268백만원) 예방이 필요하다.

1) 제6조(신축건축물의 에너지이용 효율화 추진)에 따라 공공기관이 연면적 10,000㎡ 건축물의 신축 시 건물에너지관리시스템 의무 도입 대상

2) BEMS(Building Energy Management System) : 건물의 조명, 냉난방 등의 실시간 모니터링, 제어를 통하여 건물 에너지를 효율적으로 관리하는 시스템

관계부서 의견 ○○○○사업단은 향후 기계 자동제어시스템 발주 시 통신 공사분에 이미 반영된 배관·배선 내역 확인 및 담당자 간 협의 후 중복내역을 제외하여 발주하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 중복하여 반영된 내역을 조정하여 시행 하시기 바랍니다. (268백만원 감액) (시정(금액))

일련번호	08	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 크크크크크크 ♥♥지구 1단계 1공구 조성공사 내부토취원
추가 발굴을 통한 사업비 절감 방안 검토

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단(舊 :: ::사업단)은 크크크크크크 동측 및 °F°F지구 개발 성숙
화 단계에 접어들어 ●●●●권 성장거점 도약 및 정부정책 적극 이행을 위해 ♥
♥지구 1단계 제1공구 조성공사를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

aaaa부 「25년 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 공기업 및 준정부
기관은 재무건전성을 개선하기 위한 노력을 강화해야한다. 또한, 우리 공사 「예
산관리지침」 제10조(예산운용의 원칙)에 예산관리자는 예산·회계관계법령, 「공기
업·준정부기관회계기준」, 예산총칙 및 이 지침에서 정하는 바에 따라 예산을 효
율적으로 운용하여야 한다.

「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무) 제3항 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제51조(공사착수단계 설계도서 등 검토업무) 제2항 8호에 따라 공사감독원은 사업비 절감을 위한 검토 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

크크크크크크 ♥♥지구 1단계 1공구 공사 계약상대자는 실시설계 기술제안 입찰 시 골프장부지 지반조사를 통해 공사구역 내 양질토 유무를 확인하여 내부토취원으로 활용하고, 성토재 95만^m를 확보하는 것으로 기술제안 하였다.

또한, 기술심의 의견에 따라 유용가능한 범위, 심도 및 수량을 구체적으로 파악하기 위해 지반조사를 시행하고, 그 결과를 반영하여 굴착위치를 변경하였다.

그런데 변경된 내부토취원은 성토재 활용이 정상적으로 이루어지고 있어 당초 목표 성토재 물량 95만^m는 확보 가능할 것으로 예상되나, 당초 내부토취원으로 활용하고자 했던 부지와 변경된 내부토취원 부지는 인접 구간으로 추가 유용토 확보가 가능할 것으로 판단되며 내부토취원의 추가 발굴을 통하여 외부 토사 반입량을 저감을 통한 사업비 절감 검토가 필요하다.

관련부서 의견 ●●●●사업단은 내부토취원 추가 검토를 통해 외부 토사 반입량을 저감을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●사업단장은 내부토취원 추가 검토를 통한 사업비 절

감방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	09	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	1,477백만원

시정요구(금액)

제 목 크크크크 °F°F지구 1단계 조경공사 공사계획 변경

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단(舊:::사업단)은 크크크크크크 개발사업 °F°F지구의 토목기반공사의 완료시기와 분양 및 입주계획을 고려하여 ‘크크크크크크 개발사업 °F°F지구 1단계 조경공사’를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

K-water 「건설기술관리규정」 제64조(실정보고) 제2항에 따라 공사시행부서의 장은 시공 중 공사계획상 중요한 사항을 변경할 필요가 있는 경우 사업주관부서의 장에게 그 사유를 구체적으로 명시하여 실정보고를 하여야 하며, 같은 규정 제68조(설계변경) 제1항에 따라 공사시행부서의 장은 시공 중 관계법령 및 계약에서 정하는 바에 따라 설계를 변경할 사유가 발생하였을 때에는 변경 설계도서를 작성하여야 한다.

그리고, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제1항에 따라 설

제서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질·용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 해당하면 설계변경할 수 있으며, 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제1항에 따라 계약담당공무원은 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정공종의 삭제, 공정계획의 변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위해 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, 2024. 7. 22. ●●●●사업단은 ㄴㄴㄴㄴㄴ 개발사업 °F°F지구 1단계 조경공사에 포함되어 있는 ㄹ호 근린공원의 주요 공간을 인근 산업단지 근로자를 위한 녹음·휴게 및 전망을 위한 저관리형 공간으로 개선하기 위해 향후 공원 유지관리기관인 ■■시 KKKK과에 변경 계획을 첨부하여 의견 요청을 하였고, 이에 2024. 8. 23. ■■시는 ㄹ호 근린공원 내 중앙 산마루에서 산책로로 연결된 보행교 및 수변공간 변경계획에 의견이 없음을 회신하였다.³⁾

ㄴㄴㄴㄴㄴ ㄹ호 근린공원 공간 변경 계획에 대해 향후 공원 유지관리기관(지자체)와 협의가 완료되었고, 「(계약예규)공사계약일반조건」 및 K-water 「건설기술관리규정」에 따라 ㄴㄴㄴㄴㄴ °F°F지구 1단계 조경공사 중 ㄹ호 근린공원 내 반영된 보행교 및 연못 공사 물량은 제외하고 숲길 및 전망공간 공사 물량은

3) 산마루 간 보행교 연결은 원활한 순환 동선과 조망경관을 위하여 조치하거나 대체 가능한 연결 동선 마련, 연못 등 시설 변경 구간은 조기녹음을 통한 경관축 조성 가능토록 식재기반 조성 선행 등 부가 의견 7건 제시

반영하는 등 실정보고 및 설계변경이 시행되어야 하나 감사일 현재까지 시행되지 않아 공사비가 과다하게 계상되어 있다.

관계부서 의견 ●●●●사업단은 감사의견을 수용하며 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 변경된 공원 조성 계획에 따라 크크크크
크크 °F°F지구 1단계 조경공사 내 반영된 보행교 공사 물량 제외 등 설계변경을
시행하시기 바랍니다. (시정(금액))

일련번호	10	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 연동침하방지공법 부상토 재활용 부적정

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ≡≡≡≡실, ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단(舊:::사업단)은 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 개발사업 광역교통개선대책에 따라 사업지 남측과 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구와의 도로망 연결을 통한 남북측 간선 도로망 구축을 위한 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구 연결도로 건설공사와 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ √√√√√√ 사업협약 및 민간사업자 제안 내용에 따른 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ √√√√ √√ 주거단지 조성공사를 시행중이다.

그리고, 위 공사에는 성토시 인접구조물의 연동침하와 측방유동 방지를 위해 심층혼합처리공법4)(이하 “DCM공법”이라 한다.)과 차수형 수평교반 연속벽체 공법5)(이하 “TCM공법”이라 한다.)이 반영되어 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

4) 시멘트와 물을 혼합한 고화재를 지반내에 주입하면서 교반기를 회전시켜 교반혼합하고 시멘트의 경화반응을 이용하여 원지반 내에 개량체를 조성하는 공법
5) 지반 내 커터를 관입한 후 횡방향으로 수평이동 하면서 지반을 굴삭하고 시멘트와 물을 혼합한 고화재를 주입하여 연속벽체를 조성하는 공법

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」(이하 “건설폐기물법”이라 한다.) 제16조(건설폐기물 처리용역의 위탁·수탁 계약 등)에 따라 배출자는 해당 건설공사 현장에서 발생하는 건설폐기물을 스스로 처리하거나 건설폐기물 처리업자 등에게 위탁하여 처리하여야 한다.

한편, 「건설폐기물법」, 「폐기물관리법」에 따른 건설폐기물의 배출, 수집·운반, 보관 및 처리 등 건설폐기물의 친환경적 적정처리 및 재활용 촉진을 위한 업무를 처리함에 있어 행정의 일관성 및 신뢰성 등의 확보를 위한 사항들을 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」(이하 “건설폐기물 처리지침”이라 한다.)으로 정하고 있으며, 건설폐기물 처리지침에 따르면 굴착공사, 지하구조물 공사 등을 하는 경우 연약지반을 안정화시키는 과정 등에서 발생(건설공사장의 지반보강용 등으로 사용한 슬라임 또는 벤토나이트혼합물 등)하는 무기성오니는 일반적으로는 건설오니로 분류되나, 시멘트가 주성분으로서 시간이 지나면 폐콘크리트와 마찬가지로 딱딱하게 굳어 고체 상태인 폐콘크리트가 되면 폐콘크리트로도 분류할 수 있다.

그리고, 건설오니는 해당 처리시설(탈수·건조시설)을 갖추고, 건설오니를 영업대상 폐기물로 허가를 받은 건설폐기물중간처리업자에게 위탁처리 하여야 하고, 재활용이 가능한 건설오니는 수분함량 70% 이하가 되도록 탈수·건조한 후 일반토사류나 순환토사를 부피기준으로 50% 이상 혼합하여 성토재 등으로 활용할 수 있으나, 건설오니를 재활용하는 경우에는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따라 시험한 결과 「폐기물관리법 시행규칙」에 따른 유해물질 함유기준

이내이고, 「토양환경보전법 시행규칙」에 따른 토양오염우려기준 이내여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ●●●●사업단은 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구 연결도로 건설공사와 ㄱㄱ
ㄱㄱㄱㄱ ㅂㅂㅂㅂㅂㅂ 주거단지 조성공사에 반영된 DCM공법 및 TCM공법을
시공하면서 발생한 부상토를 성토재로 활용하면서, 관련 기준에 따른 토양오염
우려기준 이내 여부만 확인하고, 유해물질 함유기준 이내 여부는 확인하지 않았다.

관련자 의견 ●●●●사업단은 유해물질 함유기준 이내 여부가 사전에 확
인된 친환경 고화재를 재료로 사용하였기 때문에 토양오염우려기준 이내 여부만
확인하였다는 의견을 제시하였다. 그러나 건설폐기물 처리지침에는 사용 재료의
종류에 따라 유해물질 함유기준 이내가 아니어도 된다는 단서를 정하고 있지 않
으므로, 시공시 발생하는 부상토를 성토재로 재활용하는 경우 토양오염우려기준
과 유해물질 함유기준 이내인지 확인하여야 한다.

조치할 사항

① ㄷㄷㄷㄷ실장은 「건설폐기물 처리지침」에 따라 건설폐기물의 재활용 가능여부를
적정하게 확인하지 않고 처리한 관련자를 주의처분 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ●●●●사업단장은 향후 연동침하방지공법 시행중 발생한 부상토 재활용시
관련 지침을 준수하시기 바랍니다. (통 보)

일련번호	11	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	기타	재정상 조치금액	204억원

시정요구(금액) 및 통보

제 목 ♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ 추진에 관한 사항

소 관 부 서 %%%% 처

조 치 부 서 %%%% 처

내 용

1. 업무 개요

%%%% 처(舊♣♣♣♣ 처)는 2015. 8월 ♥♥지구 ♪♪♪ 근린공원 내 홍보 및 마케팅, 공공시설(공원) 특화를 위한 ♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ 건립 계획을 수립하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

K-water 「투자심사 및 총사업비관리에 관한 규정」 제23조(단계별·공종별 관리)에 따르면 사업부서의 장은 기본계획, 설계, 발주·계약 및 시공 등 단계별로 사업을 추진하고, 각 단계별로 총사업비 관리를 하여야 하며, 총사업비 규모 뿐만 아니라 공종별·세부사업별 사업비도 각각 독립하여 관리하되, 이를 임의로 조정하여서는 안된다. 또한, 단지사업은 공사비 비목의 세부 사업구분별로 분리하여야 한다.

이에 따라 %%%% 처는 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 개발사업 총사업비를 단계별, 공종별, 세부사업별로 구분하여 관리하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, %%%%처는 2015. 8월 %%%% 건립계획 수립 이후 향후 시설물 유지관리 기관의 협의의견 등을 반영하여 2019. 12월 %%%% 전시 콘텐츠 설계를 완료하고, 2020. 1월 %%%% 건축설계를 완료한 후 %%%% 건립공사를 시행하고자 하였으나, %%%% 건립공사 시행에 대한 일상감사 사전검토의견에 따라 %%%% ♥♥지구 마스터플랜 수립 이후 단지 및 기반시설 조성, 분양 계획 등 사업 여건을 고려하여 향후 건립시기를 재검토하는 것으로 건립시기를 조정하였다.

이후, 2024. 6월 %%%%처는 %%%% ⇒⇒·°F°F지구 활성화 및 ♥♥지구 본격 착수에 따라 도시 이미지를 제고하고 분양 활성화에 기여하기 위해 ‘%%%% 도시 홍보시설 강화 추진계획’을 수립(%%%-1447, 2024. 6. 17.)하면서, %%%%에 대해서는 건립예정지 주변의 %%%%전망대와 %%%%공원 조성 계획과 연계하여 유사 또는 중복되는 시설을 기능별로 통합·구분하여 추진하는 것으로 하고, %%%% 건립을 유보하였다.

그런데, %%%% 건립비용 204억 원은 %%%% 개발사업 총사업비 내 공사비 중 ♥♥지구 조경공사비에 포함되어있으나, %%%%의 잔여 기능인 도시통합운영센터 건립은 향후 ♥♥지구 기반시설 계획과 연계하여 별도 추진될 예정일 뿐만 아니라 조경공사비 성격과는 불부합하므로 별도 사업비 항목으로 집행이 필요하며, 당초 반영되어 있던 %%%% 건립비용은 다른 항목으로 활용함이 적정할 것으로 판단된다.

아울러, ☞☞☞☞☞ 건립 및 기능사항에 대해서는 향후 유지관리 기관인 ■
■시의 협의의견을 반영하여 추진되었던 사항으로, 도시통합운영센터 건립을 포
함한 ☞☞☞☞☞ 건립에 대해서는 향후 유지관리 기관과 협의 후 추진하여야 할
것으로 판단된다.

관계부서 의견 %%%%처는 감사의견을 수용하며 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① %%%%처장은 향후 유지관리기관인 관할 지자체와의 협의 결과에 따라 ☞
☞☞☞☞ 추진 여부를 결정하시기 바랍니다. (통보)
- ② %%%%처장은 ☞☞☞☞☞ 건립을 위해 반영되어 있는 ♥♥지구 조경공사
비 204억원을 타용도로 대체하시기 바랍니다. (시정(금액))

일련번호	12	감사자	전기 3급 →→→		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	시정(금액)	재정상 조치금액	63,815,951

시정요구(금액)

제 목 가로등 조명 제어방식 변경

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단은 크크크크크크 내 입주민의 안전성 확보를 위해 「크크크크 크크 °F°F지구 2공구 전기공사」를 통하여 가로등, 신호등 등 도시기반시설을 설치하고 있다.


2. 관계 규정 및 판단기준

「◆◆도 범죄예방 도시환경 디자인 조례」 제6조(기본 계획의 수립·시행 등) 및 「◆◆도 범죄예방 도시환경 디자인 기본계획·가이드라인」에 따르면, 상업지역은 은신 가능 구역 방지, 야간 골목 시야 확보를 위한 균일한 조도 확보 등 범죄 취약 구간이 발생하지 않도록 충분한 조명시설을 계획하여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

●●●●사업단은 °F°F지구의 토지이용계획에 따른 구분 없이 전 부지의 가로등을 모두 “격등제어”를 하도록 설치할 계획이나, 유동 인구가 많은 상업지구의 경우 관련 조례에 따라 범죄예방을 위한 균일한 조도 확보를 위하여 격등제어 대신 상시조명을 설치를 검토할 필요가 있다.

[그림] 조명제어 방식

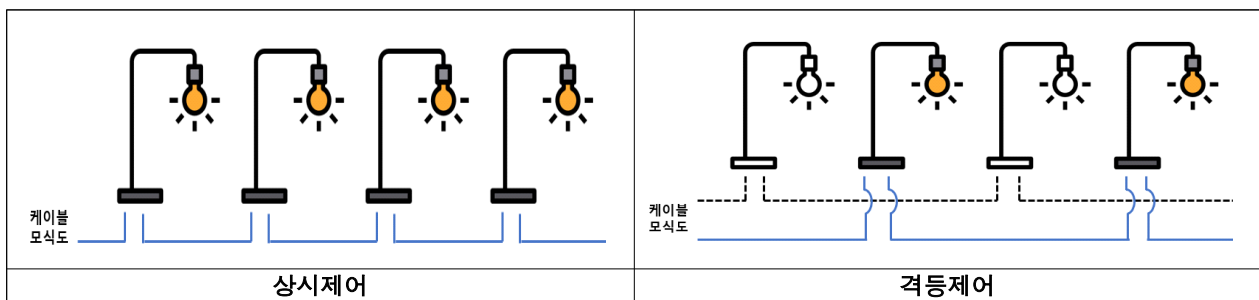

자료: 감사 제출자료 재구성

따라서 향후 토지이용계획 변경(예정) 시 ■■시 협의를 통하여 토지용지별 제어방식을 구분하여 설치하여 범죄예방 및 예산 절감이 필요하다고 판단된다. (상업지구의 격등제어 → 상시조명 변경 시 약 64백만원 절감 가능)

관계부서 의견 ●●●●사업단은 관련 조례 및 기본계획·가이드라인에 맞추어 상업지구 내 가로등 제어방식을 상시조명으로 변경하여 예산 절감 및 야간 범죄 가능성 감소하도록 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●사업단장은 ■■시와 협의를 통해 상업지역 내 조명 제어 방식 변경을 검토·시행하시기 바랍니다. (64백만원 감액) (시정(금액))

일련번호	13	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

부서주의 및 통보(시정완료)

제 목 용역관리 미흡

소 관 부 서 ★★★★★처, ○○○○사업단

조 치 부 서 ●●●●처, ★★★★★처, ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

★★★★처와 ○○○○사업단(舊∞∞∞사업단)은 ◁◁지구 개발사업 관리, ◀◀◀◀ 개발사업 관리 등을 위해 다수의 용역을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다.) 제14조(검사)에 따라 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.

그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다.) 제55조(검사) 제1항에 따라 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료해야 하며, 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 aaaa부장관이 기간을 정

하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내에 완료해야 한다.

한편, aaaa부는 2020. 12. 28. 「국가계약법 시행령」 제26조 제6항, 제27조 제3항, 제37조 제1항, 제50조 제1항, 제52조 제1항, ‘제55조 제1항’, 제58조 제1항의 규정에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(aaaa부 고시 제2020-38호)를 고시하였고, 「국가계약법 시행령」 ‘제55조 제1항’에 대한 한시적 특례 적용기간은 현재까지 지속 연장되고 있으며, ㉠㉡㉢㉣처는 관련 내용을 전부서에 안내하고 있다.

따라서 「국가계약법 시행령」 제55조 제1항 단서 조항에 의거하여 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내에 검사를 완료하여야 한다.

또한, K-water 「건설기술관리규정」 제73조(검사기한 및 결과보고)에서는 검사원은 검사원 임명통지를 받은 후 「국가계약법 시행령」 제55조 제1항, 제5항 및 제6항에서 정한 기한까지 검사조서를 작성하여 제71조에 따른 임명권자에게 검사결과를 보고하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ★★★★★처는 7건의 용역, ○○○○사업단은 10건의 용역에 대해 용역수급사의 준공검사 청구일로부터 7일을 초과하여 준공검사를 완료하여 「국가계약법 시행령」 및 「건설기술관리규정」을 위반하였으며, 경기침체에 따른 내수·민생 어려움을 완화하기 위해 시행중인 정부 지침을 적정하게 이행하지 않고 있다.

관련자 의견 ★★★★★처과 ○○○○사업단은 감사의견을 수용하며 이견을
제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ★★★★★처장은 「국가계약법 시행령」, 「건설기술관리규정」에 따른 기한 내
준공 검사가 완료될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② ○○○○사업단장은 「국가계약법 시행령」, 「건설기술관리규정」에 따른 기한 내
준공 검사가 완료될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ③ ●●●●처장은 「국가계약법 시행령」, 「건설기술관리규정」에 따른 준공기한을
도과하여 준공하는 유사 사례가 발생하지 않도록 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보(시정완료))

일련번호	14	감사자	전기 3급 →→→		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 기술개발제품 선정위원회 운영 관련

소 관 부 서 ○○○○사업단, ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●처, ○○○○사업단, ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단과 ●●●●사업단은 「 : : : : : : : : 조성사업 전기시설 공사」 및 「크크크크크 °F°F지구 1공구 전기공사」의 관급자재를 기술개발제품으로 구매하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약업무규정」 제9조(중소기업 기술개발제품 등의 우선구매) 및 「기술개발 제품 우선구매 가이드라인」에 따르면, 2천만 원 이상의 기술개발제품 구매 시 과반수의 타 부서 인원이 포함된 선정평가위원회를 통해 제품을 선정하게 되어 있으며,

「계약업무규정」 제4조(청렴·공정계약 이행 의무 준수) 및 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의6(계약담당공무원 유의 사항) 따르면, 계약 담당자는 청렴 및

공정계약 의무를 준수해야 하며 평가 기준을 수립하면서 공정성, 객관성, 적합성이 있어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

「◀◀◀◀ : : : : 수배전반 제조구매설치」, 「ㄱㄱㄱㄱ ⇒⇒ 1공구 펌프장 관급자재(인버터기동반) 구매」 및 「ㄱㄱㄱㄱ ⇒⇒ 1공구 펌프장 관급자재(비상발전기) 구매」는 발주(설계) 담당자가 평가위원으로 참여함에 따라 계약 절차의 공정성에 대한 불필요한 외부지적 또는 민원 발생 등이 우려되며,

기술개발제품 제3자 단가계약 및 수의계약 절차의 공정성 확보를 위해 마련된 「기술개발제품 우선구매 가이드라인」 제정 취지를 고려하면, 제품 선정평가 위원회는 발주(설계) 담당자와 독립적으로 운영되는 것이 적합하다고 판단된다.

따라서, 계약 절차의 공정성 제고 방안으로 발주(설계) 담당자의 평가위원 직접 참여 지양을 위한 관련 기준 정비, 교육 등 재발 방지 마련이 필요하다.

관계부서 의견

① ●●●●처는 감사의견을 수용하여 관련 교육 및 사례전파 등 재발 방지방안 필요성에 공감하였다.

② ○○○○사업단은 「기술개발제품 우선구매 가이드라인」에 따라 제품 선정평가위원의 과반수를 타 부서 인원으로 구성하여 제품을 선정하였으며, 향후 발주 시에는 감사의견을 수용하여 발주(설계) 담당자를 선정평가위원에서 제외하겠다

는 의견을 제시하였다.

③ ●●●●사업단은 향후 기술개발제품 구매 시 선정평가위원회 인원 구성을 발주(설계)담당자를 제외한 평가위원으로 구성하여 계약 절차의 공정성을 제고 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ○○○○처장은 기술개발제품 선정 평가위원회의 공정성 제고를 위하여 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② ○○○○사업단장은 관련 규정 제정 취지에 맞춰 계약 절차의 공정성이 담보되도록 기술개발제품 선정 평가위원회를 운영하시기 바랍니다. (통보)

③ ●●●●사업단장은 관련 규정 제정 취지에 맞춰 계약 절차의 공정성이 담보되도록 기술개발제품 선정 평가위원회를 운영 하시기 바랍니다. (통보)

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 선박 운항 구역에 관한 사항

★★★★처는 ‘† † 호 선박운항 계획 수립·시행(★★★★처-887, ‘24.2.22)’에 따라 † † 호 불법행위 순찰·계도·단속지원을 위한 운항경로를 † † 호 전역으로 설정하고 있다. 현재 † † 호 공유수면에 인접한 3개 지자체((ㄸ)(ㄸ)시, ㄱㄱ시, ㄴㄴ시)간의 경계는 명확하지 않은 실정이나(해수부 유권해석 결과 확인 필요), ◀◀ ◀◀◀, ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ, ◁◁방조제 등 기존 사업구역과 인접한 지역을 기준으로 관행적으로 각 지자체간 관리가 이루어지고 있는 상황이다. 하지만 관리선(◁◁ 호)의 선박검사증서상 항해구역은 † † 호 내로 명시하고 있는 것에 반하여 순시선(호)의 항해구역은 ‘ㄱㄱ시 † † 호 내’에 한정하고 있어 향후 선박안전법상 규정 위반 논란의 소지가 있다.

나. 선박운항 실적에 관한 사항

호(순시선)의 ‘22년 운항실적은 3회, ‘23년 운항실적은 2회에 불과하다. 이에 대하여 ★★★★★처는 전년대비 기상상황, 수질조사, 불법행위 단속지원 등 현장여건에 따라 운항횟수가 감소한 것으로 판단하고 있다. 현재 호(순시선)는 ◁◁호(관리선)와 함께 ↗↘선착장에 정박하고 있는 상황이며, 깊은 수심과 바람 및 파도의 영향으로 운항을 개시할 수 있는 환경적 여건이 어려운 것으로 판단된다. 갯벌 주행이 가능한 수륙양용선박인 호의 활용을 보다 효율적으로 하기 위하여 † † 호 상류에 위치한 ㄱㄱ시 선착장으로의 이동 등 적절한 활용방안을 마련하는 것이 필요하다.

관련부서 의견 † † 호 선박 운영 관련, '항해구역 재설정', '순시선의 효율적 활용방안'은 관계기관 협의 및 내부 검토를 통해 조치토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★★★★처장은 † † 호 선박 운영 관련, '항해구역 재설정', '순시선의 효율적 활용방안'을 관계기관 협의 및 내부 검토를 통해 마련하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	19	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ◀◀◀◀◀ ↗↗↗, ΣΣΣ 개발사업 위탁수수료 청구 미흡

소 관 부 서 ★★★★★처, %%%%처

조 치 부 서 ★★★★★처, %%%%처

내 용

1. 업무 개요

★★★★처는 ◀◀◀◀◀ 개발사업 구역 내 ΣΣΣ 및 ↗↗↗ 부지를 분양하면서, 토지의 효율적인 활용과 창의적인 개발을 위해 매수인의 토지이용계획 변경 요청이 가능하고, 토지이용계획 변경 요구에 따른 소요 비용은 분양계약자가 부담하는 것으로 분양계약을 체결하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

◀◀◀◀◀ 특별계획구역(ΣΣΣ) 분양에 따른 분양계약서 제13조(특약사항) 및 특별계획구역 분양에 따른 특약사항 제5조(계획변경에 따른 비용부담)에 따르면, 분양계약자(주○○○○○○○○○○)가 요구한 토지이용계획 변경 관련 소요비용(이하 “위탁사업비”라 한다.)은 분양계약자가 부담하여야 하고, 이 비용에는 분양계약자가 요청한 토지이용계획 변경으로 인하여 추가되는 공사비, 조사설계

비, 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙」 별표1을 준용한 위탁수수료를 포함한다고 명시되어 있으며, 분양계약자는 K-water가 “위탁사업비”의 통보일로부터 1개월 내 지급하고, 용역 또는 공사 준공 후 각각 1개월 내 정산하는 것으로 명시되어 있다.

또한, 민간의 창의적 개발(안)을 받아들이기 위하여 민간사업자공모를 통해 토지분양계약을 체결한 ◀◀◀◀◀ ↗↗↗ 부지의 분양계약서 특약사항에서도 분양계약자의 토지이용계획 변경 요구, 토지이용계획 변경 관련 소요비용에 대해 ΣΣΣ 부지와 동일하게 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, ΣΣΣ 및 ↗↗↗ 각 분양계약자의 토지이용계획 변경 요구에 따라 발생한 추가 공사를 K-water가 각 분양계약자로부터 위탁받아 시행하여 위탁수수료가 발생하는 것이므로, ♣♣♣♣처(舊◁◁사업처)와 ★★★★★처는 분양계약서 특약사항에 의거해 각 분양계약자에게 위탁수수료 납부를 요청하였으나, 분양계약자는 K-water가 제3자 위탁 없이 스스로 공사를 시행하였으므로 위탁수수료는 발생하지 않는 것으로 주장하며 위탁수수료 납부를 거부하고 있다.

K-water의 지속적인 위탁수수료 납부 요청에도 분양계약서 특약사항에 따른 위탁수수료의 발생여부에 대한 당사자 사이의 이견이 좁혀지지 않고 있으므로, 위탁수수료의 발생여부에 대해 내·외부 법률자문을 통한 법리적 검토를 시행하고, 그 결과를 고려하여 소송을 통한 해당 비용 청구 여부에 대해 조속한 의사결정이 필요할 것으로 판단되나, 해당 법리적 검토 및 소송 청구 업무 주체에

대한 관련부서간의 이견으로 감사일 현재까지 관련 업무가 진행되지 않고 있다.

관계부서 의견

① ★★★★★처는 위탁수수료 발생 여부에 대한 이견으로 우리공사와 분양계약자가 협의를 이루지 못한 상황으로, 소요비용 산출 및 분양계약자 협의 담당 부서에서 해당 비용 발생에 대한 법리적 검토와 지연이자를 포함한 정확한 비용산출, 분양계약자와 정산협의를 선행되어야 위탁사업비의 정산이 완료될 것으로 사료된다는 의견을 제시하였다.

② %%%%처는 분양계약서 특약사항 내용 중 위탁수수료의 발생 여부의 해석에 대한 분양계약자와의 이견에 따른 것으로, 분양 담당 부서에서 해당 비용 발생에 대한 법리적 검토가 선행되어야 하며, 향후 위탁수수료 청구 및 수납을 위해 관련부서와 협의하여 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ★★★★★처장은 위탁수수료 청구에 대한 법률자문, 소송청구 등 업무주체에 대해 유관부서 협의하시기 바라며, 해당 비용 수납을 위한 법률자문 및 소송여부 의사결정 등 후속 절차가 이뤄지도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

② %%%%처장은 위탁수수료 청구에 대한 법률자문, 소송청구 등 업무주체에 대해 유관부서 협의하시기 바라며, 해당 비용 수납을 위한 법률자문 및 소송여부 의사결정 등 후속 절차가 이뤄지도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	20	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 † † 호 환경영향조사 중복 시행

소 관 부 서 ★★★★★처

조 치 부 서 ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

★★★★처는 「환경영향평가법」에 따라 ◁◁지구 개발사업에 따른 사업구역 및 인접지역에 대한 환경영향을 조사하는 사후환경영향조사 용역을 시행 중이며, 「해양환경관리법」에 따라 ㄴㄴㄴㄴ~◀◀◀◀ 연결도로 건설공사로 인한 해양환경에 대한 영향을 조사하는 해양환경영향조사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「(계약예규)예정가격작성기준」 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 제3항 및 제4항에 따라 계약담당공무원은 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량 산출은 계약 목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 하며, 각 세비목 및 그 물량산출은 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법으로 작성하여야 한다.

또한, 같은 기준 제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) 제1항에

따르면 계약담당공무원은 원가계산방법으로 예정가격을 작성할 때에는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 고려하여야 한다.

그리고, 「예산관리지침」 제10조(예산운용의 원칙)에 따라 예산관리자는 예산·회계관계법령, 「공기업·준정부기관회계기준」 예산총칙 및 「예산관리지침」에서 정하는 바에 따라 예산을 효율적으로 운용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★처에서 시행하고 있는 ‘(24~25)◁◁지구 개발사업 사후환경영향조사 용역’과 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ-◀◀◀◀◀ 연결도로 해양환경영향조사 용역’에서 수행중인 각종 조사항목의 조사 위치를 확인한 결과 아래 표와 같이 해양수질 항목과 해양 퇴적물 항목의 조사 위치가 인접한 위치에서 중복적으로 이루어지고 있으며, 조사항목 또한 중복되는 것으로 확인하였다.

따라서 두 용역의 인접 위치에서 중복적으로 조사하고 있는 사항을 통합하여 시행할 경우 용역 및 예산관리가 효율적으로 운용될 수 있을 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ★★★★★처는 감사의견을 수용하며 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★★★★처장은 두 용역의 인접 위치에서 중복으로 조사하고 있는 동일·유사한 조사항목을 통합하는 것으로 관련 인허가 기관과 협의 후 그 결과에 따라 용역 과업을 조정하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	21	감사자	전기 3급 →→→		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 환경학교 전기요금 적정예산 사용

소 관 부 서 ★★★★★처

조 치 부 서 ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

★★★★처는 †† 호 자연환경을 활용하여, 미래세대를 위한 환경교육 제공을 위해 「†† 호 환경학교」를 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가재정법」 제45조(예산의 목적 외 사용금지)에 따르면 예산이 정한 목적 외 경비를 사용할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

현재 「†† 호 환경학교」는 크크크크크크의 전망대에서 전기를 공급받아 운영관리 중이며, ●●●●사업단에서 크크크크크크 예산으로 전기요금을 통합 납부하고 있다.

그러나 「† † 호 환경학교」는 ◀◀◀◀◀의 “환경개선 특별대책 로드맵(사업비 4,471억)”에 의거 추진·운영 중인 사업으로 환경개선 특별대책 예산을 활용하여 운영관리비를 부담하여야 한다.

「† † 호 환경학교」 별도 수전, 전력량계 설치 등의 조치를 통해 전기요금에 대하여 적정예산을 활용하도록 할 필요가 있다.

관계부서 의견 ★★★★★처는 「† † 호 환경학교」의 전기 사용과 관련하여 ●●●●사업단과 협의 및 검토 후 「† † 호 환경학교」 운영사업비(◀◀◀◀◀환경개선 특별대책 로드맵 사업비)로 전기요금을 납부 할 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★★★★처장은 「† † 호 환경학교」 운영관리비의 적정예산을 활용하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	22	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ◀◀◀◀◀ 지하주차장 건립공사에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단(舊 ∞∞∞사업단)에서는 ◀◀◀◀◀ ↗↗↗ 특화단지 주차난 해소를 통한 공공성 확보 및 도시활성화를 위한 ◀◀◀◀◀ 지하주차장 건립공사 (이하 “지하주차장 공사”라 한다.) 및 해당공사의 건설사업관리용역(이하 “감리용역”이라 한다.)을 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제33조(용역감독) 제1항에 따르면 감독원은 과업수행을 위한 수급인의 지휘 및 감독, 과업수행계획의 적정성 검토 및 승인, 공정진도의 확인 등 용역 감독원의 업무를 성실히 수행하여야 하며, 제53조(공정관리) 제1항에 따르면 감독원은 공정예정표에 따라 공사 진행을 감독하여 기간 내에 완공되도록 하여야 한다. 그리고, 제89조(감독 권한대행 등 건설사업관리의 시행) 제2항에 따르면 공사관리관감독원은 공사수행에 따른 문제점의 파악, 건설사업관리 업무

수행계획서 검토 등의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

감독원은 건설공사 시공단계에서 건설사업관리계획을 수립하여 건설사업관리용역 시행 시 해당 건설공사의 공정에 맞추어 건설사업관리용역 기술인을 적정하게 배치하여 건설공사의 공정률과 건설사업관리용역 기술인의 투입률을 균형 있게 맞추어 관리 감독 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○사업단 실지감사 기간(2024. 11. 18. ~ 11. 22.) 중 지하주차장 공사 및 감리용역의 공정률을 확인한 결과 지하주차장 공사의 경우 공사 주계약자인 √/√건설이 채권 가압류(약 15억원), 국세납입증명서 발급 제한 등으로 적절한 계약이행이 불가능한 상태로 중도탈퇴 의사 공문을 접수('24년 10월) 후 공정률 15%인 상태로 공사가 중지된 상황이다. 이에 따라 감리용역도 공정률 25%로 용역 중지를 시행하였다.

지하주차장 공사의 경우 잔존 구성원인 ♪♪종합건설(주)의 잔여 공사 이행 의지에 따라 공동수급체 구성원을 신규로 추가하는 절차를 진행하고, √/√건설의 공사 시행분에 대한 타절 기성 절차를 진행중이다. 따라서 신규 구성원 추가 및 타절 기성 절차를 조속히 마무리하여 지하주차장 공사가 정상적으로 시행될 수 있도록 조치가 필요하다.

또한, 감리용역은 공정률 25%인 상태로 용역 중지 중으로 현재 공사 공정률(15%)와 비교시 공정률 약 10%를 초과한 것을 확인하였다. 따라서, 향후 공사 재개시 지하주차장 공사와 감리용역의 철저한 공정관리가 필요한 상황이다.

관련부서 의견 ○○○○사업단은 지하주차장 공사가 조속히 재개될 수 있도록 조치하고 공사 및 감리용역 관리감독을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 ◀◀◀◀ 지하주차장 건립공사가 조속히 재개될 수 있도록 조치하시고, 향후 공사 및 건설사업관리용역에 대한 관리, 감독을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	23	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ◀◀◀◀◀ 조성사업 유지관리공사에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단(舊 ∞∞∞사업단)은 ◀◀◀◀◀ 조성사업 구간 중 공사 준공
은 되었으나 사업 미준공 및 지자체 미인계 지역에 대한 시설물 유지보수 및 민
원, 지자체 요구사항 처리를 위해 ‘◀◀◀◀◀ 조성사업 유지관리공사’를 시행
중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

‘◀◀◀◀◀ 조성사업 유지관리공사’(이하 유지관리공사라 한다.) 설계설명서에
따르면 계약상대자는 현장관리인력 투입 후 별도로 지정된 업무일지(별지1호)를
작성하여 K-water에 서면으로 보고하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○사업단에서 시행 중인 유지관리공사의 현장관리 및 점검업무는 계
약기간 동안 100일을 시행하는 것으로 설계설명서에 명시되어 있다.

그런데 유지관리공사의 계약상대자인 ☯☯건설주식회사는 현장관리 및 점검 업무 수행을 위해 유지관리공사 설계설명서 공사 세부 사항으로 명시된 바와 같이 업무일지를 작성하여 K-water에 서면보고하고 승인받아야 하나 업무일지 작성 이력이 없음을 ○○○○사업단 실지 감사 기간(2024. 11. 18. ~ 11. 22.) 동안 확인하였다.

따라서, 업무일지 작성을 철저히 하여 향후 현장관리 및 점검업무 수행의 대가지불 및 비용정산의 근거를 마련하고, 유지관리공사에 대한 관리 감독을 철저히 할 필요가 있다.

관련부서 의견 ○○○○사업단은 유지관리공사에 대한 업무일지 작성 및 관리감독을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 ◀◀◀◀ 조성사업 유지관리공사의 현장관리 및 점검 업무일지 작성 및 관리, 감독업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(통보)

일련번호	24	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ○○○○ ○○○○○ 건설공사 자재 관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단(舊○○○○사업단)은 ◀◀◀◀◀ 개발사업 및 주변 개발사업으로 인해 증가되는 교통량을 분산하여 ○○○○로 교통체계를 개선하기 위해 광역교통개선대책으로 반영된 ‘◀◀◀◀◀ 중1-117호선(○○○○ ○○○○○) 건설공사’(이하 “○○○○ ○○○○○ 건설공사”라 한다.)를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 “업무수행지침”이라 한다.) 제57조(사용자재의 적정성 검토)에 따라 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 공정계획에 따라 사전에 주요 기자재 공급원 승인요청서를 자재반입 10일 전까지 제출토록 하여야 하며⁶⁾, 건설사업관리기술인은 시험성과표가 품질기준을 만족하는지 여부를 검토하여 공사감독자에게 보고하고 공사감독자는 품명, 공급원, 납품실적, 건설사업관리기술인의 검토의견 등을 고려하여 적합한 것으로

⁶⁾ 관련법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

판단될 경우에는 이를 승인하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○ ○○○○ 건설공사 중 지하차도 굴착공사에 소요되는 지보재(H형강)에 대해 건설사업관리기술인으로부터 자재공급원을 승인받기 전 자재를 반입한 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 ○○○○사업단은 지하차도 굴착공사에 소요되는 지보재(H형강)은 업무수행지침에 따른 ‘주요자재’가 아닌 「건설공사 품질관리 업무수행지침」(이하 “품질관리지침”이라 한다.)에 따른 ‘가설기자재’에 해당하므로 주요 기자재 공급원 제출 및 승인 대상이 아닌 품질관리지침에 따른 가설기자재 품질시험 대상에 해당하며, 이에 따라 시공사가 제출한 KS 제품규격(KSD3503) 품질검사 증명서를 통해 품질시험 결과를 확인하였고, 이후 보다 확실한 품질확보를 위해 자체적으로 업무수행지침을 준용하여 공급원 승인 절차를 추가적으로 진행하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 관련 규정에 따라 적절하게 주요 기자재가 반입될 수 있도록 공사 및 건설사업관리 용역 감독을 철저히 하시기 바랍니다.

(통보)

일련번호	25	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 크크크크-◀◀◀◀◀◀ 연결도로 교대(A1) 비계설치 부적정

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단(舊∞∞∞사업단)은 † † 호로 단절된 크크크크크크 개발사업 ♥♥지구와 ◀◀◀◀◀◀의 도로망 연결을 통해 주변지역의 안정적인 교통수요 처리를 위해 크크크크크크 광역교통개선대책으로 반영된 크크크크크크-◀◀◀◀◀◀ 연결도로 건설공사를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무)에 따라 감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계서류 등을 숙지하고, 공정한 직무수행과 청렴의 의무를 지키며, 별표2 제2호에서 정한 해당 업무를 성실히 수행하여야 한다.

그리고 같은 규정 별표2에 따라 공사감독원은 설계도서 등에 적합하게 시공되고 있는지의 점검·검측, 확인 및 측량 입회하여야 하고, 건설사업관리 공사관리관은 건설사업관리기술자의 지도·관리, 건설사업관리기술자가 검토·확인한 시공업체의 품질관리 및 안전관리에 대한 지도 등 건설사업관리 용역계약에 따라

수행하여야 할 업무 및 그에 부수되는 사항을 지도하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ-ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ 연결도로 건설공사 중 교량 시점부 교대 (A1) 공사를 위한 비계를 설치하면서, 시공사가 제출한 시공상세도면과 다르게 설치된 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 〇〇〇〇사업단은 감사의견을 수용하며 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 〇〇〇〇사업단장은 관련 규정에 따라 설계도서 등에 적합하게 시공될 수 있도록 공사 및 건설사업관리 용역 감독을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	26	감사자	전기 3급 →→→		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	시정(금액)	재정상 조치금액	527,515,402

시정요구(금액)

제 목 크크 크크크크 퍼스널모빌리티 사업계획 재검토

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단은 크크크크크크 °F°F지구의 교통혼잡 해소, 주민 편의 제공 등을 위해 퍼스널모빌리티(Personal Mobility, 이하 “PM” 이라 함.)를 설치하고자 한다.

2. 감사결과 확인된 문제

PM은 설치 후 ■■시로 인계하여 지자체에서 운영해야 하는 시설로서, 사전에 ■■시와 시설물 사양, 운영방안, 사업 일정 등을 충분히 협의한 이후 사업 추진이 필요하다.

그러나 현재 ■■시의 공용 PM 사업에 대한 구체적인 정책이 확정되지 않아, 향후 ■■시 정책 결정 및 협의 과정에서 사업내용 변경이 예상된다.

따라서 PM 사업은 향후 ■■시와 협의 이후 재설계 및 사업 시행을 하는 것이 바람직하다고 판단된다.

관계부서 의견 ○○○○사업단장은 PM에 대한 구체적인 사업내용을 지자체와 충분히 협의 후 재설계 및 사업 시행을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 PM 사업에 대해 준공 이후 운영방안 등 ■■시 정책 확정 이후 추진하시기 바랍니다. (528백만원 감액) (시정(금액))

일련번호	27	감사자	전기 3급 →→→		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 준공서류 확인 절차 미흡

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단은 ◀◀◀◀ 및 ◀◀공단 내 전기시설 공사를 시행하여 추진하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제70조(감독조서), 제74조(기성부분 검사조서)에 따르면, 감독원은 공사 수급인으로부터 준공(기성) 검사 청구를 받으면 청구내용의 사실 여부를 검토하고 이상이 없을 시 감독조서를 작성·보고 해야 하며, 검사조서에는 검사 내역서 및 증빙서류를 첨부하게 되어 있다.

또한 「계약업무규정」 제58조(대가지급)에 따르면 준공(기성) 대가지급 시 고용·산재 보험료 납부(완납) 증명서를 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○○○사업단에서는 시행 중인 일부 공사의 준공 시 고용·산재 보험 완납 증명서 확인 절차를 누락하고 준공(기성)처리를 한 사실이 확인되었다. (다만 대금 지급 시 관련 증빙서류 확인 완료하여 정상 지급함)

관계부서 의견 ○○○○사업단은 관련 규정에 의거, 준공(기성) 검사 시 청구내용의 사실 여부 확인을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 준공(기성) 시 관련 규정에 따라 증빙자료를 철저히 확인하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	29	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구 연약지반처리공법 적용에 관한 사항

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단(舊 ∴∴사업단)은 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ⇒⇒지구 개발에 이은 °F°F 지구 개발 성숙화 단계에 접어들어 서해안권 성장거점 도약 및 정부정책 적극 이행을 위해 ♥♥지구의 ∨∨∨∨지구 및 1단계 3개 공구 공사를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

기획재정부 「25년 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 공기업 및 준 정부기관은 재무건전성을 개선하기 위한 노력을 강화해야한다. 또한, 우리 공사 「예산관리지침」 제10조(예산운용의 원칙)에 예산관리자는 예산·회계관계법령, 「공 기업·준정부기관회계기준」, 예산총칙 및 이 지침에서 정하는 바에 따라 예산을 효율적으로 운용하여야 한다.

「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무) 제3항 및 「건설공사 사업관리방

식 검토기준 및 업무수행지침」 제51조(공사착수단계 설계도서 등 검토업무) 제2항 8호에 따라 공사감독원은 사업비 절감을 위한 검토 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ ♥♥지구 1단계 1공구는 골프장 주변 녹지 및 경계부 확폭부에 지반의 압밀도 및 침하 안정성을 확보하기 위하여 연약지반처리공법(토목섬유 및 수평배수층)을 원안설계에서 적용하였다.

그런데 실시설계 보완설계 시 해당구간은 연약지반처리를 적용하지 않아도 처리기간(12개월) 내 압밀도 100% 도달 및 침하 안정성 확보가 가능한 것을 확인하고, 실정보고를 통해 연약지반처리공법을 삭제하고, 해당구간에 순성토를 시행하여 공사비 총 1,450백만원을 계약금액 내에서 조정하였다.

●●●●사업단 실지감시 기간 중 ♥♥지구 1단계 2공구 조성사업 설계자료를 확인 결과 연약지반처리공법을 추가 제외 가능구간이 있는 것을 확인하였다.

따라서, 연약지반처리공법 반영 구간에 대하여 추가 제외가 가능한 구간을 전수 검토하여 사업비를 절감할 필요가 있다.

관련부서 의견 ●●●●사업단은 ♥♥지구 연약지반처리공법 제외 가능구간을 추가로 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●사업단장은 ♥♥지구 연약지반처리공법 적용 구간 중 공법 제외 가능 구간을 검토하여 조치하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	30	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	1,522백만원

통 보

제 목 미끄럼방지포장 설치 형식 부적정

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단은(舊:::사업단)은 크크크크크 개발사업의 단계적 조성 계획에 따라 ⇒⇒지구, °F°F지구, ♥♥지구 순으로 단지 조성공사를 시행중에 있으며, 일부 조성공사에는 미끄럼방지포장이 반영되어 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「도로안전시설 설치 및 관리지침」에 따르면 미끄럼방지포장은 도로의 구간별로 기존의 노면 마찰계수가 도로교통 조건에 부합하지 않고 낮아서 위험한 구간, 도로의 선형에 있어서 전·후 선형의 연속성이 이루어지지 않아 주행속도의 차이가 20km/h 이상인 구간의 변화구간, 기타 사고발생의 위험이 높아 미끄럼방지포장을 설치하는 것이 효과가 있다고 인정되는 구간의 도로 조건 및 교통조건에서 미끄럼 마찰 증진이 요구되거나, 사고 발생 위험으로 필요하다고 인정되는 구간에 설치한다.

그리고, 미끄럼방지포장의 설치 형상은 구간의 노면 전체를 처리하는 전면 처리와 일정 간격을 띄워 부분처리하는 이격식으로 구분되며, 이격식은 1-3방식, 3-6방식으로 나뉘지는데, 적용 형상은 전면처리를 원칙으로 하되 이격식은 경각심을 주기 위한 목적으로 사용하고 적용 구간을 최소로 하도록 정하고 있다.

한편, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산업입지법”이라 한다.) 제17조(국가산업단지개발실시계획의 승인)에 따라 ≡≡≡≡부장관이 국가단지실시계획을 승인하려면 관할 시·도지사의 의견을 듣고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 하고, 같은 법 제39조(특수지역개발사업에의 준용)에 따라 특수지역개발사업은 같은 법 제17조(국가산업단지개발실시계획의 승인)을 준용하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

%%%%처는 2023. 3월 ≡≡≡≡≡≡ 개발사업 실시계획 변경(제14차) 승인 신청을 하였고, 인허가청인 -----청은 「산업입지법」에 따라 실시계획을 승인하기 위해 관할 시·도지사의 의견을 수렴하여, 사업시행자인 K-water에 관계기관 협의의견에 대한 조치계획을 제출 요청하였다.

그리고, 관할 지자체인 ■■시는 위 ≡≡≡≡≡≡ 개발사업 실시계획 변경(제14차) 건에 대한 협의의견으로 미끄럼방지포장시 전면포장이 아닌 이격식(1-3 또는 3-6 형식)으로 설치해 달라는 의견을 제시하였고, K-water는 협의의견에 따라 조치하겠다는 조치계획을 제출하였다.

그런데, ≡≡≡≡≡≡ 개발사업으로 시행중인 5개 단지 조성공사에는 미끄

럼방지포장이 전면포장 형식으로 반영된 사실이 확인되었다.

ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ 개발사업으로 설치된 도로, 상·하수관로 등 공공시설물은 향후 관할 지자체인 ■■시로 무상귀속 및 관리 이관되어야 함에 따라, 해당 지자체의 의견을 고려한 원활한 관리 이관을 위해 미끄럼방지포장은 이격식으로 설치할 필요가 있으며, 또한, 관할 지자체 협의의견에 따라 미끄럼방지포장을 1-3 형식으로 설치할 경우 1,522백만 원의 공사비를 절감할 수 있다.

관계부서 의견 ○○○○사업단은 ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ 개발사업 개발계획 변경을 위한 관계기관 협의를 진행 중으로서, 토지이용계획 변경에 따른 초등학교 위치 및 어린이 보호구역의 변경 등을 종합적으로 고려하여 미끄럼 방지포장의 설치 범위를 재조정할 필요가 있으므로, 향후 도로 포장 시공 시점에서 관계기관과의 추가적인 협의를 통하여 미끄럼 방지포장의 형식(전면포장 또는 이격식)을 결정하는 것이 타당할 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●사업단장은 향후 유지관리 기관의 협의의견을 반영하여 경제적 시공 및 유지관리를 위해 공사시행 전 이격식(1-3방식) 포장 형식으로 관계기관과 협의 후 협의 결과에 따라 설계변경 및 공사를 시행하시기 바랍니다.

(통보)

일련번호	31	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구 연결도로 노면표시용 도료 설계 부적정

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단은(舊:::사업단)은 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 개발사업의 광역교통개선대책에 따라 사업지 남측과 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구와의 도로망 연결을 통해 ㄱㄱㄱㄱ-◀◀◀◀ 연결도로와 더불어 남북측 간선도로망 구축으로 주변지역의 교통수요를 안정적으로 처리하기 위한 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구 연결도로 건설공사를 시행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「교통 노면표시 설치·관리 매뉴얼」에 따르면 노면표시의 도료는 시공시의 조건에 따라 1종(상온건조형), 2종(수용성형), 3종(가열형), 4종(융착식), 5종(상온경화형)이 있고, KS규격(KS M 6080 : 2011)에서 제시하는 재귀반사성능이 요구되는 노면표시 도료는 2종, 3종, 5종이며, 기타 1종, 3종 기능성 도료가 있다.

그리고, 노면표시는 사용하는 재료와 시공법에 의해서 내구성 및 양생기간

이 다르기 때문에 도로조건 및 기상 등의 환경, 시공성, 경제성 등을 고려하여 공법을 선택하는 것이 필요하며, 일반도로의 조건에 따른 각 도료별 공법은 아래 [표 1]와 같다.

[표 1] 일반도로의 조건에 따른 도료별 공법

도로 구분	노면 상태	노면 표시 구분	여름철		겨울철	
			교통량 少	교통량 多	교통량 少	교통량 多
일반 도로	일반적 노면	종방향선	용착식(4종)			상온경화형 (5종)
			상온경화형 (5종)	수용성형 (2종)	경화형 (5종)	
			기능성			
		횡단선 문자기호	용착식(4종)			기능성
			기능성			

자료: 교통노면표시 설치·관리 매뉴얼(≡≡≡청) 발췌

또한, 도료형 노면표시는 야간, 기상조건 등 조명이 없는 곳에서도 시인성을 확보하여야 하므로 아래 [표 2]과 같이 최소재귀반사성능을 정하고 있다.

[표 2] 도료형 노면표시 반사성능

조사각	관측각	구 분	최소재귀반사성능			비고
			백 색	황 색	청 색	
88.76° (1.24°)	1.05° (2.29°)	설치시	240(R4~5)	150(R3~5)	80(-)	기준
		재설치 시기	100(R2~5)	70(R1~5)	40(-)	권장
		우천(습윤)시	100(R2~5)	70(R1~5)	40(-)	권장

자료: 교통노면표시 설치·관리 매뉴얼(≡≡≡청) 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ≡≡≡≡≡≡ ♥♥지구 연결도로 건설공사 내 노면표시에 대한 도료의 설계 반영 현황을 확인한 결과, 모든 종류의 노면표시에 대한 도료가 종류 2종, 재귀반사성능 등급 R3으로 일괄 반영되어 있는 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ●●●●사업단은 「교통 노면표시 설치·관리 매뉴얼」에 따라 ≡≡≡≡≡≡ ♥♥지구 연결도로 건설공사의 노면표시용 도료의 종류 및 등

급을 상향 조정해야 할 것으로 판단되며, 향후 유지관리 주체(지자체, 경찰서 등)와 추가적인 협의 후 노면표시용 도료의 종류 및 등급을 결정하는 것이 타당할 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 「교통 노면표시 설치·관리 매뉴얼」에 따라 도로노면표시 도료의 종류 및 등급을 재검토 하고, 시공 전 관련기관과 협의를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	32	감사자	전기 3급 →→→		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 전기자동차 충전시설 보완

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단은 °F°F지구 ㄹ호 근린공원 내 전기자동차 완속 충전시설 7대 설치를 위한 부대시설 시공을 계획하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「◆◆도 환경친화적 자동차의 보급 및 이용 활성화를 위한 조례」 제8조의2 (전기자동차 충전시설 안전성 강화방안 마련 등)에 따르면, 전기자동차 충전시설의 안정성 강화를 위한 소화설비, 방화설비 등의 마련을 위해 노력해야 하며,

동 조례 제11조(충전시설의 종류 및 수량 등)에 따르면, 자동차 충전시설의 20% 이상은 급속 충전시설로 설치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

현재 설치 예정인 전기자동차 충전시설은 ◆◆도 조례와 차이가 있어, 향후 충전시설을 지자체로 인수인계하는 과정에서 조례 위반으로 이미 설치된 시설물 변경, 재투자 등이 우려되므로, 사전에 관련 조례 검토 및 지자체와 협의를 통하여 필요 시설의 설계반영 후 시공이 필요하다.

관계부서 의견 ●●●●사업단은 관련 조례에 맞추어 전기자동차 충전시설의 안전성 강화를 위한 소화설비, 방화설비 등의 마련과 급속 충전시설 수량에 대해 검토 후 설계에 반영하여 향후 지자체 인수인계에 차질이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●사업단장은 전기자동차 충전시설 설치 전 ◆◆도 조례 검토 및 지자체와 협의를 통해 필요 시설을 설계에 반영하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	33	감사자	행정4급 △△△		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보(모범사례)

제 목 J J J J J 센터 기술고도화, 운영체제 개선 등을 통한 사업활성화 도모

소 관 부 서 ★★★★★처

조 치 부 서 ★★★★★처

내 용

☆☆본부 ★★★★★처에서는 ▷▷▷·▷▷공단의 대기개선을 위해 대기개선특별 대책로드맵의 핵심사업인 J J J J J 센터 구축·운영 사업을 추진 중입니다. 2019년에 J J J J J 센터를 완공하고 2020년 9월부터 상업운전 중에 있으며, 현재 전문기관 위탁 운영 중에 있습니다.

J J J J J 센터를 운영하면서, 활성탄 재생 중 고농도 오염물질의 흡착에 따른 발화 방지 등 안정적이고 균일화된 활성탄 재생을 위해 활성탄 재생의 범용성 확장의 필요성이 대두되었고, 그에 따라 활성탄 재생기술의 고도화 및 운영체제 개선을 추진 중7)에 있으며 이를 통해 안정적인 활성탄 재생과 사업의 경제성 향상을 목표로 하고 있습니다.

첫 번째로 활성탄 재생기술 고도화를 위해 기존에 널리 사용하고 있는 활성탄 (펠릿형)의 단점 중 하나인 재생 중 발화를 방지할 수 있는 통기성이 강화된 활성탄8)

7) ★★★★★처-1300호('24. 03. 15.), 2937호('24. 06. 20.), 3162호('24. 07. 02.)

8) =====처 구매조건부 구매연계형 연구과제 시행 중인 제품

(별집형)을 선제적으로 도입하기로 결정하고, 활성탄의 발화 확률이 높은 사업장⁹⁾ 대상으로 테스트(흡착탑 50m³/분×2기)한 결과 휘발성유기화합물(VOCs) 탈착량과 재생시간에 상당한 개선을 확인하였습니다.

[표 1] 활성탄 재생 테스트 결과 비교

구분	펠릿형(기존)	별집형(개선)	개선율	비고
탈착THC 양 (수분포함)	30~33kg	56~76kg	86~130%	단위부피(m ³) 당
발화여부	○	×	미발화	
재생시간	90분	35~40분	55~61%	카트리지 1개 기준

이를 근거로 통기성이 강화된 활성탄을 적용하기 위해 실제 운영 중인 공장의 흡착탑을 교체(2건)¹⁰⁾ 하는 등 현재 그 효과를 분석 중에 있습니다.

또한, 국내 최초로 흡착탑에 상온에서 활성화되는 촉매¹¹⁾를 시범 도입하여 흡착탑에서 배출되는 오염물질(VOCs 등)의 급변에도 대기오염물질 배출허용기준을 안정적으로 준수할 수 있도록 하였습니다.

[표 2] 촉매 테스트(30m³/min 규모) 결과

구분		유입(ppm)	유출(ppm)	제거율(%)
THC (총탄화수소)	촉매(신품)	20,000	550	97.3
		450	20	95.6
	촉매(재생)	203	48	76.3

이를 근거로 상온에서 활성화되는 촉매를 적용하여 실제 운영 중인 공장의 흡착탑을 교체(1건) 하여 촉매 적용 효과를 분석한 결과 최대 99%의 제거효율을 보이는 것으로 확인되었으며 활성탄 오염물질 제거성능 저하, 순간적인 고농도

9) 흡착탑 내 자연발화 및 재생 중 발화로 활성탄 공동재생 참여 유예기업

10) ★★★★★처-2772호('24. 06. 12.), 3231호('24. 07. 05.)

11) 세계최초 금나노촉매 개발업체로, K-water 물산업펀드 투자 1호 기업


오염물질의 노출 등의 상황에서 대기로 배출되는 오염물질을 안정적으로 제어하는데 탁월한 효과를 나타낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[표 3] 실제 운영 중인 흡착탑 적용 결과

구분	유입(ppm)	유출(ppm)	제거율(%)
THC ¹²⁾ (총탄화수소)	5,306	34.7	99.3%
	1,600	28.7	98.2%
	235	37.1	84.2%

두 번째로 활성탄 수집·운반에 대한 운영체계 개선을 추진 중입니다. 최근 연이은 중대사고로 인해 우리 공사 최대 안전분야 위기 상황임을 인식하고 안전 사고 예방을 위한 근원적 혁신이 시급한 실정이며, 활성탄 재생설비 상업 운전 이후 당초 계획 대비 사업 참여율이 저조한 상태로 신규 수요처 확보가 절실한 상황입니다. 대기오염방지시설(흡착탑)의 활성탄 교체작업은 유해·위험요인¹³⁾이 수반되는 작업으로 안전사고 발생 가능성이 상존하고 있으며, 저가의 품질이 낮은 활성탄의 사용을 선호¹⁴⁾하는 사업주와 민간사업자 간 고착화된 현행 활성탄 유통체계¹⁵⁾로 인해 수요처의 확보에 한계가 있는 실정입니다.

[표 4] 현행 활성탄 유통체계

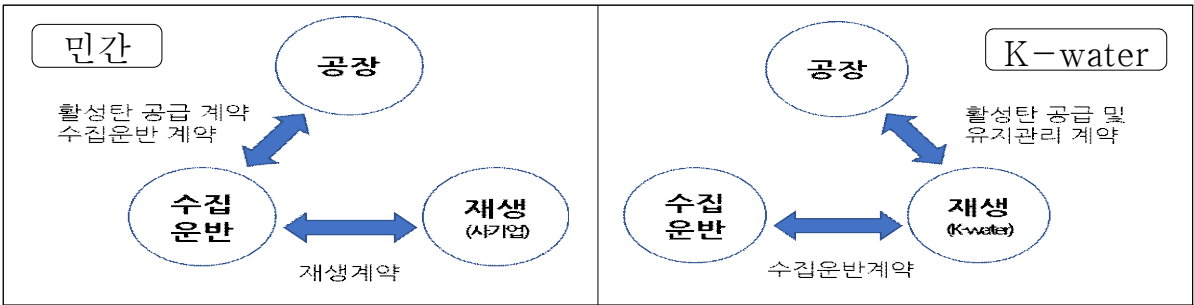

12) THC(총탄화수소) 배출허용기준: 40~200ppm (업종별로 상이), ※※※※※공단의 업종은 주로 110~200ppm 적용됨.
 13) (위험작업) 크레인, 고소 / (유해작업) 활성탄 분진 노출·흡입
 14) 대기용 활성탄 품질기준 폐지('08. 10.)로 활성탄 품질에 대한 규제 부재
 15) 활성탄 수집·운반 업체가 공장과 재생업체를 모두 관리하는 구조

이에 활성탄 재생 및 수거·운반 체계를 전환하여 민간(활성탄 수집·운반업체)과 공공(K-water)의 상생협력을 강화함과 동시에 안전리스크를 해소하고 재생 수요처 증대를 기대하고 있습니다.

[표 5] 활성탄 운영체계 비교


구분	당초	변경
계약관계	▪(흡착탑보급) K-water↔공장 ▪(재생) K-water↔공장 ▪(수집운반) K-water↔수집운반업체(하수급)	▪(흡착탑보급) K-water↔공장 ▪(재생) K-water↔수집운반업체 ▪(수집운반) 수집운반업체↔공장
활성탄 수집·운반	▪도급사업 안전관리 리스크 부담 * 중량물, 고소, 활성탄 분진 등	▪도급사업 안전관리 리스크 부담 해소
활성탄 재생	▪낮은 재생수수료로 인한 민간업체 반발 및 수요처 확보 곤란	▪재생 수요처 확보 용이 ▪민간 ↔ 공공의 상생협력 강화

또한, ◀▶▶▶▶ 국가산업단지에 영업 중인 중소기업장을 대상으로 대기오염 방지시설에 대해 「시설개선+운영지원+유지관리」가 복합된 공공형 新 사업모델 시범사업을 △△부(▽▽▽▽▽▽▽청)와 협업하여 추진 중입니다.¹⁶⁾

▽▽▽▽▽▽▽청 주관으로 각 기관별¹⁷⁾ 역할을 분담하고, 전문기관(●●●●●●●●센터)에 유지관리 전담기구를 구성하여, 2025년부터 시범사업을 본격적으로 추진할 예정입니다. (유지관리 전담기구 구성은 '24년부터 추진 중)¹⁸⁾

16) ◀▶▶▶▶ 대기개선특별대책 로드맵 활용 추진 합의 완료('24.10., ████████ 협의회)
17) ▽▽▽▽▽▽▽청, K-water, 지자체, 시민단체, 산업계, 전문기관
18) 인력파견요청(●●●●●●●●센터 사무국-23호('25.1.9.))에 따라 업무지원직 1인 파견 완료('24.1.13.)

[표 6] 협력적 거버넌스 구성(안)

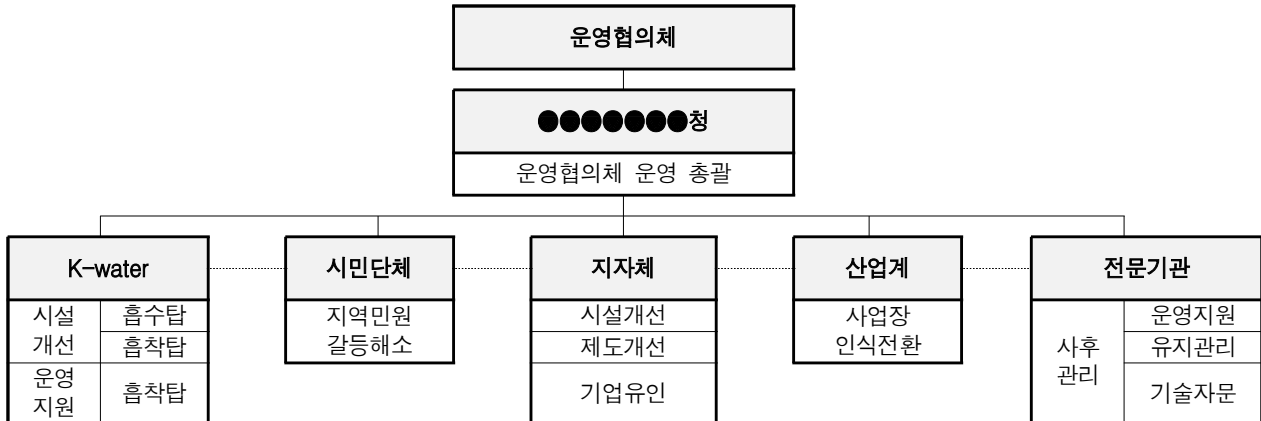

이를 통해 중소기업장의 대기오염방지시설 운영여건을 개선하고 활성탄 재생·수거 및 공급, 세정식 흡수탑의 폐세정수 보관·운반 등에 대한 운영을 지원함과 동시에 사후관리 체계(자가측정 및 유지관리, 실시간 모니터링, 빅데이터 시스템 구축, 근로자 환경교육, 컨설팅 등)를 구축하여 ▲▲·▲▲공단 지역의 대기환경 개선에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

개 선 효 과

활성탄 개선을 통해 단위 시간당 재생가능량이 대폭 증가(약 2배), 활성탄 발화 문제를 해소하여 활성탄 공동재생사업 참여 사업장의 확대를 도모하고, 재생시간 단축에 따른 운영경비(전기, 가스 등)를 절감할 수 있는 기틀을 마련하는데 기여하였습니다.

그리고 상온에서 활성화되는 촉매를 도입하여 흡착탑에서 배출되는 오염물질(VOCs 등)의 급변에도 대기오염물질 배출허용기준을 안정적으로 준수할 수 있도록 하였습니다.

또한, 활성탄 수집·운반에 대한 운영체계 개선을 통해 〰〰〰〰〰센터 유해·위험 작업에 대한 안전리스크를 해소하고 보다 안정적인 수요처의 확보가 가능하도록 하였으며, 민간업체(수집·운반)에서 고품질의 저렴한(시중가 대비 60%) 활성탄을 안정적으로 확보할 수 있도록 하여 민간과 공공의 상생협력을 강화하였습니다.

마지막으로 〰〰〰〰〰 공단에 영업 중인 중소기업장을 대상으로 대기오염방지 시설에 대해 「시설개선+운영지원+유지관리」가 복합된 공공형 新 사업모델 시범 사업을 〰〰부(〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰청)와 협업·추진하여 중소기업장의 대기오염방지시설의 운영·관리를 보다 체계적으로 지원할 수 있는 기틀을 마련하여, 지역 대개환경을 개선하기위해 노력하고 있습니다.

일련번호	34	감사자	행정4급 △△△		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통보(모범사례)

제 목 ♪♪호공원 미집행사업비 지자체 지급으로 지역 활성화 및 원가절감

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

○○○○사업단에서는 사업면적 302만평의 첨단복합도시를 조성하는 ◀◀◀◀◀◀ 조성사업을 '07.08월 착공하여 '25년 말(개발계획 기준)까지 사업을 추진 중이며, ◀◀◀◀◀◀의 핵심 상업지역인 ↗↗↗은 8차^(21년), 9차^(22년) 부분준공 등을 통해 대부분 시설이 (ㄱ)(ㄱ)시로 관리권이 이관 완료되었으며 '24년 현재, 잔여시설(약 8.7만 m²)에 대한 10차 부분준공을 추진하고 있습니다.

↗↗↗ 일원의 관리권을 인계받은 (ㄱ)(ㄱ)시는 약 12.6km²에 이르는 ↗↗↗ 해양레저 지역특화발전특구 지정을 추진하는 등 지역 활성화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있으나. 코로나 팬데믹, 침체된 부동산 시장 등 국내외적인 경제 불황으로 인해 상권 활성화 부진 및 지역사회의 지속적인 민원에 직면한 상황입니다.

[표 1] ◀◀◀ ↗↗↗ 활성화 언론 보도

XXX '23.06.05 활성화 주력 등록 2023.06.05 07:00:00 수정 2023.06.05 07:12:05 	OO 일보, '24.05.24 지구 상권 활성화 축구' 결의안 채택 A 원전설 기자 안승민 2024.05.24 13:15 
--	--

(ㄱ)시는 이러한 위기 극복을 위해 민자사업 유치 노력과 더불어, '23년 확정
 「♪♪호 문화공원 미집행 사업비 활용방안¹⁹⁾ 추가 협의 요청('24.5월)」을
 통해 당초 ⇔⇔호 공원에 반영기로 한 ① 무대공연 설비, ② 물놀이장 사업비 약
40억 원을 ↗↗↗ 활성화에 先 집행을 희망함에 따라 사업시행자로서 지역 활성
 화에 협력하고자 사업부서 방침(%%%%%-1598, 일상감사)에 근거하여 활용방안 변경계
 획을 수립하였습니다.

[표 2] ♪호 문화공원 미집행 사업비 활용방안 변경('24.6월)

구 분		위 치	내 용	사업비			
				당초	변경	총계	
시행 주체		공원		121억	121억	-	
(주)시	(주)시	♪♪호 문화	① 경관조명, 어트랙션	15억	좌동	75억	'23년 지급
		●●호 수변	② 해양 전망데크	20억	좌동		
		△△호 수변 외 5개 공원	(신설) 육해상 이동길, 경관녹지 공 원화, 안전·편의시설 개선 등	-	40억원		'24년 지급
	K-water	⇔⇔호 근린	③ 무대·공연 부대설비	30억	삭제		
			④ 물놀이장 설치	10억			
K-water		⇔⇔호 근린	⑤ 보완설계비	5억	총사업비 조정('23.12) 반영완료	46억	장래 집행
			⑥ 물가상승 공사비	10억			
			⑦ 전기/통신공사비	20억			
			⑧ 준공·이관 예비비	11억			

이에 따라, ○○○○사업단은 총 40억 원을 ↗↗↗ 일원에 필요한 활성화
기반시설 구축에 활용토록 (자)자시에 지급완료('24.6월, 8월)하였으며 목적 외 전

19) (♪)호 공원 미집행 사업비) 공원 미조성에 따른 총 121억 원에 대한 세부 활용방안 수립(市 75억, 수공 46억)

용 방지 등을 위해 관련 방침(∞∞∞사업단-2558)을 통해 사업비 지급 및 관리방안을 명문화하여 마련하였습니다.

<미집행 사업비 지급 및 관리방안>

- ① 목적사업 활용(↗↗↗ 활성화 및 ⇔⇔호 공원 기반시설)
- ② 공사 완료 후 3개월 내 정산 ③ ⇔⇔호 공원 무대 및 물놀이장 市 직접 시행
- ④ 지역 민원 市 책임관리 ⑤ 공원 조성 후 추가 요구 불가 및 즉시 인계

(ㄱ)(ㄴ)시는 先 지급된 미집행 사업비를 활용하여 ↗↗↗ 일원의 육해상 이동길, 안전·편의시설 확충, 경관조명 명소화 등 활성화 기반시설 확충을 추진하는 한편, 지속적인 방문객 유입을 위해 “↗↗↗ 사계절 축제계획”을 마련하여 ↗↗↗ 봄 달콤축제(‘24.5월), ↗↗↗ 해양축제(‘24.8월, 약 4만명), ††호 기념의 날(‘24.10월, 약 2.5만명), ↗↗↗ 산타페스타(‘24.12월 예정) 등 다양한 축제와 이벤트 개최가 방문객 증가로 이어졌고 미집행 사업비 先 집행을 통한 ↗↗↗ 활성화 효과는 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

◀◀◀ 사업관리 측면에서는 지역주민 요구사항으로 ⇔⇔호 공원에 반영예정이었던 무대공연 설비, 물놀이장 조성 목적 사업비로 그간 수변사업 시설이관 사례를 비추어 볼 때, 인계인수 시 공원관리청의 보완요구, 지역주민의 민원 등이 가장 빈번히 발생하는 대표적인 시설로서 사업시행자로서 각종 민원 등으로 인한 감독업무 효율 저하, 감정 노동 등의 애로사항이 발생 될 수 있던 사항을 市 직접 시행조건으로 변경함에 따라 지역 민원 대응 경감, 시설 하자책임 및 분쟁 방지, 준공이관 시 시설보완에 따른 사업비 증액요소 차단 등 감독업무 효율 향상 및 공사 재무적 측면에서도 이바지할 수 있을 것으로 판단됩니다.

아울러, 현재 진행 중인 ⇔⇔호 근린공원 보완 실시설계 용역^(336백만원)에 포함된 무대공연설비, 물놀이장 과업 내용 조정을 통해 용역비 절감(약 30백만원) 되는 등 ◀◀◀ 개발사업 총사업비 관리에도 기여할 것으로 사료됩니다.

개 선 효 과

- ① (지역 활성화) ↗↗↗ 기반시설 확충 및 사계절 축제 시행을 통한 활성화 도모
- ② (민원대응) 각종 민원이 다수 발생 예상되는 시설(무대공연 설비, 물놀이장)의 시행주체 변경(→市)에 따라 민원 대응 경감
- ③ (원가절감) 보완 실시설계 과업조정(삭제)에 따라 용역비 약 30백만원 절감

일련번호	35	감사자	행정4급 △△△		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보(모범사례)

제 목 보상토지 과납 재산세 환급을 통한 재무적 성과 창출

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

■시에서 '21년도 재산세 부과 시, 〃〃〃〃〃〃 〃F〃F지구를 종전 지번 기준이 아닌 조성토지 기준으로 산정함에 따라 재산세가 전년 대비 1,987백만원 가량 급증하였습니다. 당초에는 보상취득가격 기준으로 재산가액을 산정하였으나, 〃F〃F지구 조성공사가 본격적으로 착수됨에 따라 「〓〓부 개별공시지가 조사 산정지침」에 따라 조성토지에 대해 확정예정지번을 부여하고, 실시계획 기준으로 용도지역·면적을 적용하여 재산가액을 산정하는 방식으로 변경하였습니다.

그러나 일부 토지는 조성공사가 완료되지 않은 공유수면으로서, 공사 중인 공유수면 약 263천㎡에 대하여 '21년부터 재산세가 부과된 것을 확인하고 '21년 12월에 ■시에 경정을 청구하였습니다.

* [관련공문] 재산세 환급금 청구(∴ ∴ 사업단-7636, 2021.12.09.)

하지만 ■시 담당자는 고액환급에 대한 부담감으로 소극적인 자세를 취하였습니다. 게다가 담당자도 변경되면서 약 2년간 진척되지 못했습니다. 이에 ●

●●●사업단은 ■■시 세무부서에 지속적으로 방문하여 진행상황을 모니터링 하고, 해당 면적을 산정한 정밀한 도면을 증빙자료로 제출 및 관련 유권해석 등 참고자료를 수시로 지원하였습니다. 이러한 노력 결과, 과세표준 정정으로 과거 3년분 재산세 과납액 약 10억원을 환급받게 되었습니다.

또한 ■■시에서 '24년도 재산세 부과 시에도 단지조성사업지구 외 토지 중 기부채납 예정인 기반시설용 토지 및 수도부지인 토지 72필지에 대해 분리과세가 아닌 종합과세 대상으로 부과하여 재산세가 과다하게 산정됨을 확인하였습니다. 이에 ■■시 담당자에게 즉시 근거자료와 함께 고지 내역 정정을 요청하였고, 재산세 11백만원을 절감할 수 있었습니다.

[표 1] 재산세 납부 및 환급금액

(단위 : 천원)

과세년도	기존 납부(부과)금액	경정금액	과오납환급 (절감)	가산금	환급(절감) 총액	비고
2021	2,842,380	2,508,213	293,560	17,185	310,745	
2022	3,466,797	3,136,792	325,312	15,198	340,509	
2023	3,006,343	2,689,183	317,951	8,062	326,013	
2024	3,111,067	3,099,605	11,462	-	11,462	
합계	12,426,587	11,433,793	948,285	40,445	988,730	


개 선 효 과

●●●사업단에서는 재산세 과납액 환급 및 부과금액 정정을 통한 세무비용 절감으로 약 10억원의 재무적 성과를 창출하게 되었습니다. 이는 4년간의 재산세 절감뿐만 아니라, 과세대상의 근본적 조정을 통해 향후 재산세 부과금액 절감 효과에 기여하였습니다. 이는 매년 정기 재산세 부과시 세부 과세내역을 모니터링하고 공공시설 무상귀속 대상 토지 등 비과세 토지의 과세 여부를 검증

할 수 있는 밑바탕이 되었습니다.

그리고 정확한 업무처리를 통해 과세 경정청구 등 향후 불필요한 업무 발생을 방지하고 업무 효율성 향상을 도모할 수 있었습니다.

[별첨] 과납 재산세 공유수면 구간 제외대상

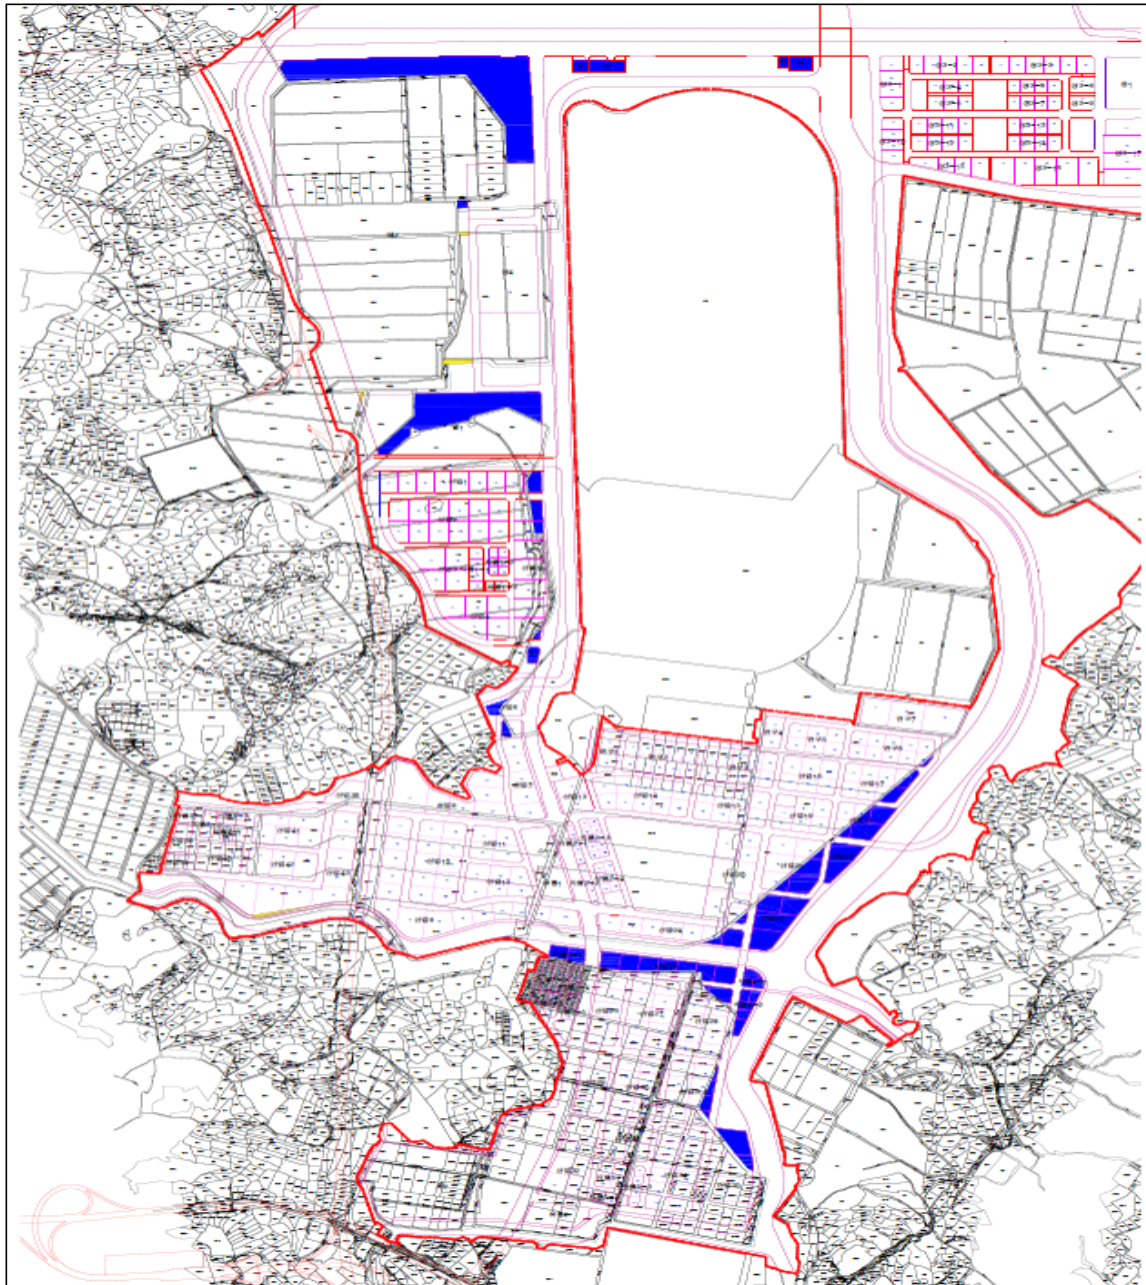

*  공유수면 미조성토지 재산세 부과 제외 대상
