

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018-74	처분요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	통보, 권고		
관 계 부 서	**본부(****처, **처, ****처, ****처), ****실 (****팀)		
제 목	건설분야 인력 및 조직구성 재검토		

지 적 내 용

公社は 항공수요의 증가에 따른 시설포화에 대비하여 안정적인 시설능력을 확보하기 위해 제2여객터미널 확장, 제4활주로 신설, 계류장 확장 등을 위한 4단계 건설사업을 2023년 완공을 목표로 추진하고 있다.

[표] 4단계 건설사업 개요

· 사업기간 : 2017.11 ~ 2023.12 (6.5년)			
· 총사업비 : 약 4.2조 (인천공항공사 자체 조달)			
· 주요사업 : T2 확장(+2,800만명), 활주로(3,750m), 계류장(여객 73, 화물 13), 진입도로 확장 등 → 여객 1억명, 화물 630만톤 확보			
구 분	3단계	4단계(순증)	합계
활주로	3본	1본	4본
여객터미널	387천 m²	316천 m²	703천 m²
여객계류장	163개 소(접현111)	73개 소(접현35)	236개 소(접현146)
화물계류장	49개 소	13개 소	62개 소
B H S	141km	57km	198km
제2교통센터	434천 m²	82천 m²	516천 m²
T2 단기	3,722면	1,983면	5,705면
주차장 장기(승용)	3,743면	8,700면	12,443면

1. 공사용 자재 직접구매

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 “판로지원법”이라함) 제12조제3항과 같은법 시행령 제11조에 따라 종합공사는 40억 이상¹⁾, 전문공사, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사 등 3억 원 이상의 공사에 포함된 4천만 원 이상의 자재는 관급자재로 설계하여 발주자가 직접 구매하여야 하

1) 공사예정가격을 기준으로 함

며, 공공기관 운영에 관한 법률 제44조와 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제4조에 따라 2억1천만 원 이상 직접구매대상품목은 조달청으로 구매를 위탁하여야 한다.

건설공사의 자재는 공정 진행에 맞춰 적기에 계획한 물량이 현장에 도착하여야 공사 진행이 가능하며 관급자재의 경우 조달과 품질관리의 책임이 발주자에게 있다. 이에 따라 3단계 건설 사업은 공사용자재의 원활한 수급을 위해 직접구매대상품목 중 37개 품목을 중소기업청(現 중소벤처기업부)에 조건부 예외승인(이하 “PS자재”라 하다)을 받고 시설공사계약특수조건(공사용 자재구매)을 마련하여 시공계약에 포함하여 수급인이 구매하도록 하였다.

3단계 건설사업의 직접구매 공사용 자재는 000품목, 0,000억 원으로 公社가 직접발주하거나 조달청에 구매를 위탁한 자재는 000종, 0,000억이고 PS자재는 00품목, 000억 원 규모였으며, 4단계 건설사업 직접구매 공사용 자재는 000품목 0,000억 원 중에서 公社가 직접발주하거나 조달청에 구매를 위탁할 자재는 000종, 0,000억이고, PS자재는 0품목, 000억 원으로 3단계 건설사업 대비 公社가 직접 발주하는 품목은 000품목에서 000품목으로 8.8% 증가하였고, 사업비는 0,000억 원에서 0,000억 원으로 27.7% 증가하였다.

3단계 공사용 자재 중 고강도원심력콘크리트파일(PHC) 등 3종은 ****처(****팀)에서 통합구매로 진행하였으며, 레미콘, 아스콘 등 2종은 **처(****팀)에서 통합 구매하여 각 분야의 공사현장에 공급하였다.


그러나, 통합구매 자재를 제외한 000종, 0,000억 원은 개별 부서에서 구매 및 관리업무를 담당함에 따라 동일한 품목인 경우에도 별도 계약으로 추진함으로써 구매업체가 달라지고, 구매금액에 차이가 발생할 뿐만 아니라 구매 및 검사, 검수과정에서도 일관성이 없으며 다수 업체를 통한 계약관리, 대금지급 등의 행정절차가 비효율적인 문제점이 발견되었다.

한편, 감사원은 『공공발주 건설공사 불공정관행 점검』(2017.9.~10.) 감사를 통해 공사용 자재 직접구매대상 품목 중 예외 인정을 받은 품목을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제73조 및 「예정가격작성기준」 등과 다르게 공사원가계산서 상의 재료비 항목에서 제외하여 사후원가검토조건 계약항목(PS)으로 별도 관리하면서 원가계산 비목을 반영하지 않은 것에 대해 총공사비를 부당하게 축소한 것으로 “주의” 처분을 한 바 있다.

2. 4단계 건설사업 조직 및 인원

2018.11월 현재 4단계 건설 사업은 건설본부 4처 13개 팀으로 정원은 106(현원 80명)명이 전담하고 있으며, 기존 1~3단계 건설과 달리 종합적인 건설 사업관리지원용역(CM) 없이²⁾ 자체적으로 건설사업 관리를 진행하고 있다.

[그림] 1~4단계 건설사업의 사업비 비율³⁾

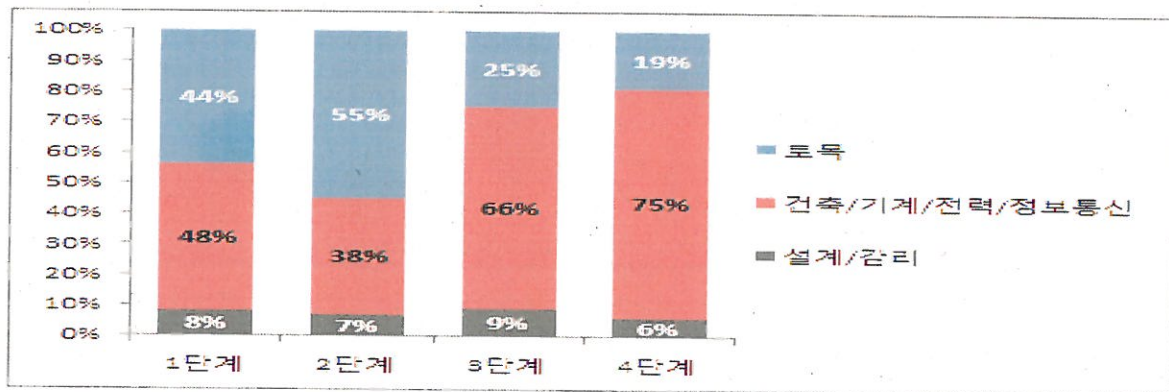

본부 **처(現 ****처)는 『인천공항 4단계 건설 사업관리기본방안』(2017.11.3.) (이하 “기본방안”이라 하다)에서 예상문제점으로 수요증가대비 4단계사업 건설공기 부족 우려, 종합사업관리지원용역의 시행곤란으로 公社 단독으로 사업관리 추진, 公社 전문분야의 기술력 취약, 인터페이스에 따른 공기지연 등을 제시하였다.

2) 2015년 감사원 감사에서 사업관리지원용역과 책임감리용역의 중복추진에 따른 부적정을 지적함

3) 3단계 건설사업은 2단계 건설사업시 제3할주로 포장 및 제4할주로의 부지조성이 완료되어 토목공사비의 비중이 1~2단계에 대비하여 낮아졌음

이에 대한 대책으로 종합사업관리인력(CM)을 공사인력으로 전환하여 인력생산성이 4단계는 3단계 대비 8% 향상되는 것으로 보고 인력을 산정하였다.

그러나, 사업단계별 건설인력의 29세 이하 비율이 2단계(2003년) 3%, 3단계 (2013년) 18%, 4단계(2018년) 16%로 높으며, 50세 이상의 비율도 2단계 6%, 3단계 13%, 4단계 18%로 높아지고 있고, 경력을 보면 4년 이하 비율이 2단계 7%, 3단계와 4단계는 24%를 차지하고 있어 인력생산성이 3단계 보다 나아졌다고 보기 어렵다.

또한, 4단계 1인당 사업비는 289억 원으로 3단계의 94.8% 수준이며, 공사용 자재 직접구매를 포함한 발주건수는 2.48건으로 3단계 사업 2.53건과 같은 수준이나, 2단계 건설사업의 0.7건과 비교 시에는 발주건수가 큰 폭으로 증가하였다.

사업패키지는 기본방안(2017.11.3.)에서는 시공패키지간 업무분장 조정 및 통합 발주 등 업무를 효율화하여 67건으로 계획 하였으나, 이후에 건설기획처에 수립한 『4단계 건설사업 계약패키지 구성(안) 보고』(2018.10.10.)에서는 105건으로 기본방안보다 56.7%가 증가하였다.

4단계 건설 사업은 제2여객터미널, 제2교통센터 등이 운영시설에 인접하여 대규모 확장공사가 진행되므로 기존 건설사업보다 난이도가 높으나 3단계 건설사업과 달리 사업관리기술지원용역(CM)을 통한 외부 전문인력의 지원 없이 내부인력으로 통합인터페이스 조정, 안전, 품질, 공정관리 등을 하여야 하며 건설공사 전반의 사업관리에 있어 발주자의 직접관리 기능(하도급 및 근로자 노임 직접지급, 건설기계임대차 계약확인, 직접시공계획 확인, 발주자의 안전 관리 책임 강화)을 강화하고 있는 단계이므로 적절한 조직 및 인력배치가 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

본부는 4단계 공사용자재 수급과 관련하여 내부의견을 수렴하여 대책방안을 검토 중에 있으며, 2019년 조직 및 인력개편시 **처에 통합관리기

능을 강화하고 3단계 건설사업 추진시 발생했던 문제점에 대한 후속대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(****처장, **처장, ****처장, ****처장)은 자재수급, 품질관리, 구매의 일관성 확보 등을 위하여 통합구매를 포함한 종합적인 4단계 건설사업 공사용 자재의 수급대책을 마련하고 사업을 추진하시기 바랍니다. 『통보』

② 사장(****실장, ****처장)은 4단계 사업 시행여건이 기존 사업과는 다른 점을 충분히 고려하고 3단계 건설사업관리에서 나타난 문제점을 보완할 수 있도록 직제개편시 건설본부의 조직 및 인력을 확보하시기 바랍니다

가. 공사용자재 수급을 위해 필요한 조직과 소요인력을 반영

나. 공사 여건 및 발주자의 직접관리 기능강화에 부응하기 위하여 조직구성 및 적정인력 반영 『권고』

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략
