

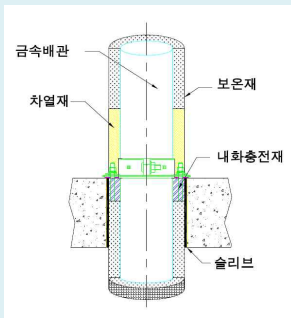
[37] [시정(회수), 통보] 사항

1. 제 목 : 방화구획 관통부위 내화충진재 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부(시정(회수)), ㉠㉠㉠㉠처(통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 2014. 6. 26. **개발(주)(대표자 김**, ♀♀도 ♀♀시) 외 1개 업체⁹⁴⁾와 계약을 맺고 2016. 9. 28. 준공으로 ‘◆◆도시 1-※ M5BL 아파트 건설공사 3공구’를 시행하였으며, 건축물의 화재안전성 강화를 위하여 방화구획을 관통하는 설비배관과 구조체 사이의 틈새에 대해 내화충진재를 설치하는 설계변경을 시행⁹⁵⁾ 하였다.

[표 102] 내화충진재 설계변경 시행 현황

(단위 : 천 원)

항 목	변경 전	변경 후	공사비 증감	비고
방화구획 관통부위 내화충진구조 적용	없음	설치  	138,191	

자료 : ○○○○본부 제출자료

94) (주)**건설(대표자 유**, ◇◇◇도 ◇◇시)

95) 1-※ M5블록 제3회 설계변경 시행결의(건축3회, 기계1회, 토목3회) : ○○○○○1부-2036(2016.9.1.)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조 및 같은 법 시행령 제65조, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따르면 설계변경으로 인하여 공사물량의 증감이 발생하였을 때에는 해당 계약금액을 조정하도록 되어 있고, 계약금액 조정 시에는 설계내용의 변경에 따른 물량증감을 면밀히 검토하여 중복계상 등의 오류가 없도록 하여야 한다.

그런데 ‘◆◆도시 1-※ M5BL 아파트 건설공사 3공구’의 방화구획 관통부위 내화충진재 설치에 따른 설계변경을 시행하면서 기존에 슬리브 설치비가 계상되어 있음에도 내화충진재용 슬리브 설치비를 이중 계상하였다.

[표 103] 중복계상된 슬리브 설치 비용

(단위 : 백만 원)

항 목	규격		금 액			비고
	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	차액	
방화구획 관통부위 내화충진구조 적용	슬리브 설치비 계상	슬리브 설치비 삭제	138	74	- 59	

자료 : ○○○○본부 제출자료

한편 국토해양부에서는 2013년 「건설공사표준품셈」을 개정하면서 기존의 슬리브 설치품은 배관설치비에 포함되어 있어 골조공사 시 슬리브설치에 대한 인건비를 받을 수 없어 전문공사와의 상생을 위해 슬리브 설치품을 배관에서 분리하였으나, 公社에서는 배관별로 상이하게 운영하고 있어 현장에서 업무혼선이 발생하고 있다.

[표 104] 배관별 슬리브 설치품 분리현황

배 관 명	시공부위	슬리브 설치품		비고
		배관에 포함	슬리브에 포함	
STS관	급수·급탕·난방		○	
PVC관	오·배수	○		
강 관	소화	○		

자료 : 公社 일위대가 재구성

그 결과 중복 계상된 슬리브 설치비의 부당한 설계변경 시행으로 59백만 원의 예산이 낭비되었고, 전문공사 상생 및 업무혼선 방지를 위해 슬리브 설치품의 정비가 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

내화충진재용 슬리브 설치비의 중복계상으로 과다 계상된 공사비 59백만 원을 「공사계약일반조건」 제20조에 따라 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

ⓈⓈⓈⓈ처장은

배관별로 상이하게 운영하고 있는 슬리브 설치비를 관련기준에 따라 정비하시기 바랍니다(통보).
