

[8] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 방음벽공사 설계변경 부적정
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 : 경남지역본부 ☆☆☆☆단 과장 토목4급 DDD(주의)
4. 내 용

관련자는 2015. 2. 3.부터 2017. 1. 31.까지 경남지역본부 ☆☆☆☆단 ●●●●●부에서 공사감독업무를 담당하였다.

경남지역본부는 「○○○○ 택지개발사업 지하차도6호 건설공사」를 [표 1]과 같이 시행하였다.

[표 1] ○○○○ 택지개발사업 지하차도*호 건설공사 현황


공사명	수급인	준공금액(천 원)	공사기간	비고
○○○○ 택지개발사업 지하차도*호 건설공사	○○○○건설(주) (주)◆◆◆◆◆◆◆◆	21,300,290	'14.04.30 ~ '16.08.31	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

「○○○○ 택지개발사업 지하차도6호 건설공사」의 설계에는 지하차도의 U-TYPE구간과 연결하여 있는 범어주공3단지 APT의 소음 저감을 위하여 아파트 경계에 설치되어 있는 기존 방음벽(H=3m, L=130m)을 철거한 후 동일한 위치에 신규 방음벽 기초 및 신규 방음벽(H=4m, L=140m)을 설치하도록 설계되어 있었다.

한편 동 신규방음벽 설치 세부내용에 따르면, 신규 방음벽 지주는 아래 [그림 1]과 같이 앵커볼트를 사용하여 신규 방음벽 기초에 연결하는 방식으로 설계 및 공사비가 반영되어 있었다.

[그림 1] (당초 설계) 방음벽 지주 시공방법 현황도

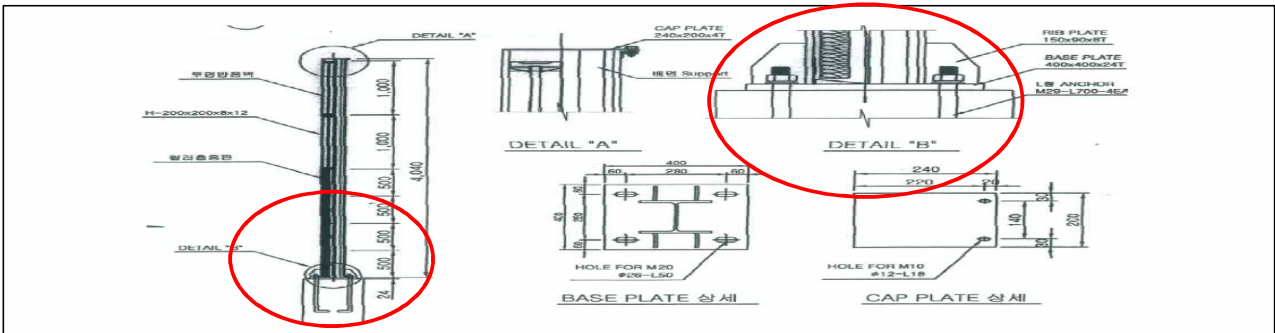


자료 : □ □ □ □ 택지개발사업 지하차도*호 건설공사 설계도면 발췌

그런데, 동 방음벽 설치 구간이 장소가 협소하여 작업공간 확보가 어려울 뿐만 아니라, 조정수목 등의 지장물로 인해 기존 방음벽 기초철거 및 신규 기초 설치 공사가 지난하였다.

이에 따라 본부에서는 아래 [그림 2]과 같이 방음벽 지주를 기존 방음벽 기초에 연결하고, 지주의 연결방식은 앵커볼트 사용이 아닌 플레이트 등을 사용하여 시공하는 것으로 설계를 변경하고 공사를 시행하였다.

[그림 2] 방음벽 지주 설계변경 현황도

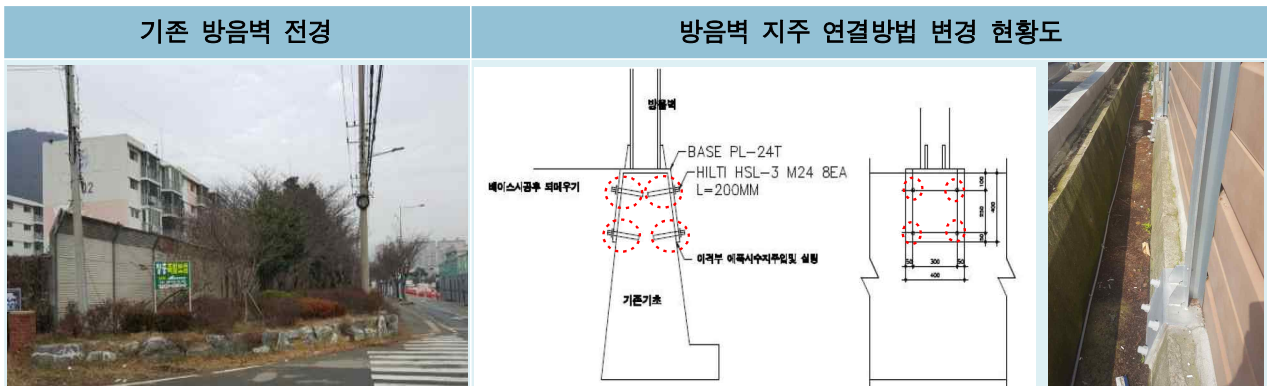

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

공사내용 변경 등에 의하여 계약금액을 조정할 때에는 실제 시행한 공사내용에 따라서 계약금액을 변경하여야 한다.

따라서, 공사를 시행하지 않은 앵커볼트 연결공사비는 계약금액에서 삭제하고 공사를 시행한 플레이트 연결공사비는 계약금액에 반영해야 함이 타당하다.

그런데, 본부에서는 상기 방음벽지주 연결방식에 대한 설계변경을 시행하면서 앵커볼트 연결공사비는 공제하지 아니하고 플레이트 연결공사비는 추가로 반영하였고, 방음벽의 설치는 아래 [표 2]와 같이 계약수량 보다 10m 적게 설치하였음에도 정산변경을 시행하지 않고 준공처리하였다.

[표 2] 방음벽 설치 현황

준공 수량(A)	시공 수량(B)	차이 수량(A-B)	비고
140m	130m	10m	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그 결과 아래 [표 3]과 같이 관련 공사비 18,090천 원이 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 3] 방음벽 공사비 조정 현황

(단위 : 천 원)

준공 금액(A)	조정 금액(B)	차이 금액(A-B)	비고
102,868	84,778	18,090	제잡비 포함

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

- ① 방음벽공사와 관련하여 설계변경 업무를 소홀히 한 토목4급 DDD에게 ‘주의’ 조치하시기 바라며 (주의),
- ② 기존 내역을 감액하지 않고 준공처리하여 과다하게 지급된 관련 공사비 약 18백만 원을 ‘회수’조치 하시기 바랍니다 (시정(회수)).
