

1. 업무개요

광주전남제주환경본부(○○○○○○○처 □□□□□부, 이하 “□□□□□부”라 함)는 目目군의 -- ---- --정비와 --/--관리시스템 구축을 통한 깨끗한 수돗물 공급과 우수율 향상으로 ----- 경영개선 및 운영관리의 현대화하고자 “目目군 ----- ---사업 -- 정비 공사”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

그리고, □□□□□부에서는 “目目군 ----- ---사업 -- 정비 공사” 현장에 종사하는 시공자가 목적물의 품질확보 또는 안전 시공을 할 수 있도록 건설공사의 진행단계별로 요구되는 시공방법과 순서, 목적물을 시공하고자 시공상세도를 작성하고 있다.


2. 관련규정 및 판단기준

「엔지니어링 사업대가의 기준」 제4장 시공상세도작성비 제24조(사후정산)에 따르면, 시공상세도면의 수량은 현장 여건에 따라 확정되므로 사전에 작성될 도면의 예정 수량을 정하고, 현장 시공 시 시공상세도면의 작성 목록에 따라 작성한 후 당초 예정 수량보다 실제 작성된 수량에 증감이 있는 경우 발주청의 승인을 받은 수량에 따라 사후에 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

건설공사 시공상세도 작성 지침에 따르면, “시공상세도(Shop Drawing)”라 함은 현장에 종사하는 시공자가 목적물의 품질확보 또는 안전 시공을 할 수 있도록

건설공사의 진행단계별로 요구되는 시공 방법과 순서, 목적물을 시공하기 위하여 임시로 필요한 조립용 자재와 그 상세 등을 설계 도면에 근거하여 작성하는 도면으로 발주청의 검토·승인이 요구되며 공사착수 15일 전까지 제출하여야 한다고 규정하고 있으며, 제출물을 발주청에 제출하지 않고서는 발주청의 승인 및 확인을 받을 수 없으며, 해당 공사를 진행할 수 없다고 규정하고 있다.

[그림 1] 시공상세도 승인 절차(건설공사 시공상세도 작성 지침 발췌)



따라서, 시공자는 설계서 및 현장 조건과의 적합성 여부를 확인하여 공사 수행상의 잘못 또는 부분 공사의 누락을 예방하기 위하여 시공상세도를 작성 할 때에는 공사착수 15일 전에 감독관실에 제출하여야 하고 감독관실에서는 7일 이내 검토하여 승인 여부를 시공사에 통보해야 하며, 시공사는 감독기관 승인 시에만 공사를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□부에서는 “**▣▣군 ----- ---사업 -- 정비 공사**” 계약내역서에 시공상세도 작성비를 [표 1]과 같이 단순 공정으로만 반영하였다.

[표 1] 계약내역서 시공상세도 작성비 현황

구분	규격	단가	수량	금액	비고
시공상세도 작성비	단순*	---,---원	000장	--,---,---원	

* 단순: 작성난이도는 복잡, 보통, 단순으로 구분되나, 사업 특성상 구조물이 없어 단순 공정으로만 반영

광주전남제주환경본부 종합감사 기간 중 시공상세도 작성비에 대한 정산 여부를 확인한 결과, “**〃〃〃〃〃〃 ---사업 -- 정비 공사**” 현장은 시공상세도 작성비가 계약 내역에 반영되어 있으나, 0 ~ 0차분까지는 정산없이 다음 차수분으로 이월하여 마지막 차순인 0차분 내역에 전체분을 반영하였다.

이에 0 ~ 0차분까지 제출한 시공상세도에 대한 승인 여부를 확인한 결과, [표 2]와 같이 시공사에서 공사 착공 전에 감독실에서 승인을 받은 시공상세도를 000장 제출하였고, 시공사에서 검측서(급수관로, 배수관로)에 포함된 시공상세도를 000장 제출하였다.

[표 2] 시공상세도 작성비 적정성 확인 현황


구분	계약 내역서	시공사 제출		감독관실 승인	비고
		사전 제출	검측서로 제출		
0~0차분	000장	000장	000장	000장	

하지만, 시공사에서 검측서(급수관로, 배수관로)에 포함하여 제출한 “급·배수관로 시공상세도”는 [그림 2]와 같이 공사 시공 중 수기로 작성된 Shop Drawing으로 시공상세도보다는 준공도면¹⁾ 작성을 위한 검측서 도면에 해당되며, 공사 착공

1) 준공도면(As-Built Drawing): 착공 후, 준공까지 모든 변경사항이 설계도면에 표기된 것으로 준공 후 공사비 정산 및 유지관리에 필요한 도면

전에 승인을 받지 않고 공사 완료 후 제출된 검측서에 포함되어 있어 시공상세도 작성비로 정산이 불가능하다.

[그림 2] 검측서에 포함하여 제출한 시공상세도

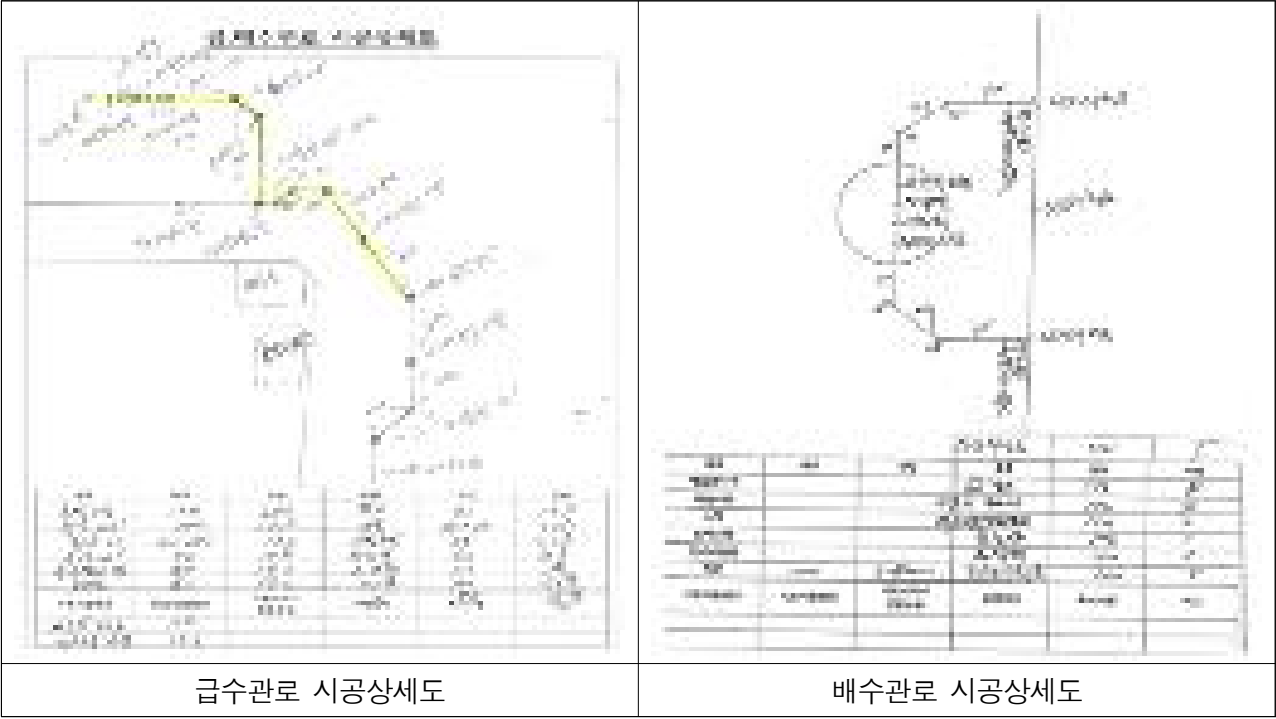

따라서, 검측서에 포함하여 제출한 급·배수관로 시공상세도는 시공상세도 작성비로 인정할 수 없으며, [표 3]과 같이 공사 착공 전에 감독관실에서 승인을 받은 시공상세도에 대해서만 시공상세도 작성비로 인정하고 불인정 수량 000장에 대해서는 정산이 필요함에 따라 조속히 시공상세도 작성비에 대하여 설계변경을 하여야 한다.

[표 3] 시공상세도 작성비 정산 내역 검토 현황

구분	계약 내역서		감독 승인		정산 검토		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
0~0차분	000장	--,---,---원	000장	--,---,---원	000장	42,614,579원	

또한, 시공상세도 작성비 잔여 물량에 대해서는 건설공사 시공상세도 작성 지침에 따라 시공상세도 목록, 서명(작성자, 검토자, 확인자), 승인등급(승인, 조건부 승인, 불허), 승인일자 등 기준 준수 여부를 확인하여 승인하고 준공 시 승인된 물량에 대해서만 정산하여야 한다.

4. 관련자(부서) 의견

□□□□□부에서는 “**○○○○군** ----- ----사업 --정비공사”와 관련하여 공사 착수 15일 전에 감독관실에 제출되지 않은 시공상세도(0~0차분)에 대하여 추후 설계변경 시 정산 예정입니다.

아울러, 시공상세도 작성비 잔여물량에 대해서는 건설공사 시공상세도 작성 지침에 따라 준수 여부를 확인하여 승인 후 정산하겠다고 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

광주전남제주환경본부장(○○○○○○○○처장)은 0~0차분까지 제출한 시공상세도 중 불인정 물량에 대해 설계변경 시 42,614,579원을 정산(감액)하시기 바랍니다.

【시정(회수)】
