

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 회 수 요 구

일련번호 2025-◆◆◆◆사업소-005
제 목 사택수선공사 계약 및 공사관리 절차 준수 미흡
관계부서 ◆◆◆◆사업소
조치부서 ◆◆◆◆사업소
내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆사업소는 직원 복리후생 향상을 위하여 총 10세대의 보유 사택을 관리하고 있으며, 이 중 2세대는 2022. 3. 17. 000사업처로부터 관리 전환 받아 운영하고 있다. 아래 [표 1] 내역에 해당하는 사택은 1997. 12. 30. 최초 취득한 노후 자산으로, 주거환경 개선 필요에 따라 보유 사택 복리후생환경 개선 목적의 사택 수선공사를 추진하였다.

[표 1] ◆◆◆◆사업소 보유 사택 내역

(단위: 천원)

순번	사택명(주소)	자산번호	취득일	관리전환일	비고
1	00주공3차아파트 305-1000	11002638, 12003587	1997. 12. 30.	2022. 3. 17.	
2	00주공3차아파트 305-1000	11002639, 12003588	1997. 12. 30.	2022. 3. 17.	
3	00주공3차아파트 305-1000	11002640, 12003589	1997. 12. 30.	-	
4	00주공3차아파트 307-1000	11002641, 12003590	1997. 12. 30.	-	
5	00주공3차아파트 310-1000	11002670, 12003676	1997. 12. 30.	-	

자료 : ERP 자산이력대장 조회자료 재구성

사업소는 사택 수선공사 추진 시 설계 및 예산 배정을 위해 상생협력처 자산운영실과 협의하고, 예산 배정 후 업체선정 및 계약, 시공·준공까지의 업무를 수행한다.

[그림 1] 사업소 사옥, 사택수선 예산 요청 및 배정 업무 절차 (건축 수선공사)



자료: 「사업소 사옥, 사택 수선공사 예산 요청 기준(상생협력처-2401(2022. 4. 6.))」 재구성

2. 판단기준

「계약관리규정」 제24조(구매계획의 수립), 같은 규정 제 112조(계약의뢰)에 따라 계약요청부서는 소요시기와 예산을 고려하여 분할계약 요청을 지양하고 일괄 계약 요청을 통해 경쟁입찰을 추진하여야 한다.

또한 회사의 행정지시인 「전자공개 수의계약 추가 확대 시행 알림(총무처-8037, 2018. 12. 31.)」에 따라 공사 5백만원 이상 계약은 수의계약 대상업체 선정 시 경쟁입찰에 준하는 전자공개 수의계약 절차를 적용하여야 한다.

그리고 「공사관리규정」 제24조(공사감독원), 같은 규정 제36조(검사자의 임명)에 따라 회사가 도급으로 실시하는 모든 공사에는 공사감독원, 준공 검사자를 선임하여야 하고 해당 공사감독원은 동일 공사의 준공검사자가 될 수 없다. 또한 같은 규정 제28조(감독일보)와 제29조(공사감독원의 임무)에 따라 공사감독원은 공사감독일보를 작성하여 보고하여야 하며, 공사 착공·준공 시에는 시공자로부터 착공계 및 준공계를 접수하고, 준공검사를

시행하여야 한다.

따라서 ◆◆◆◆사업소는 사택 수선공사 추진 시 계약 요청 단계에서는 일괄계약 가능성 검토 및 전자공개 수의계약 절차를 진행하여야 했으며, 공사관리 단계에서는 공사감독원·준공검사자 분리 지정, 감독일보 작성 및 준공 증빙 확보를 통해 공사 수행 결과를 확인할 수 있는 자료를 유지·관리하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆사업소는 보유사택 환경개선 공사를 추진하면서 아래 [표 3]과 같이 공사금액 총 22,555천 원의 공사를 5회에 걸쳐 계약 체결하였으며, 일괄 계약은 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

[표 3] ◆◆◆◆사업소 사택 수선 관련 수의계약 발주 내역

(단위 : 원)

계약일자	구분	계약 내역	거래업체	추정금액	공급가액	예산배정 근거
'22.09.29	용역	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (305-1502)	OO건축	4,750,000	4,607,500	◆◆◆◆사업소-1783('22. 8. 16.) 「☞ 보유사택 복리후생 환경개선 시행」
'22.11.09	용역	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (305-1405)	OO건축	4,750,000	4,607,500	
소 계				9,500,000	9,215,000	
'23.03.20	용역	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (305-1402)	OO건축	4,600,000	4,462,000	◆◆◆◆사업소-509('23. 3. 2.), 「☞ 보유사택 복리후생 환경개선 시행」
'23.04.04	용역	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (314-103)	OO건축	4,600,000	4,416,000	
'23.06.29	용역	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (307-1504)	OO건축	4,600,000	4,462,000	
소 계				13,800,000	13,340,000	
합 계				23,300,000	22,555,000	


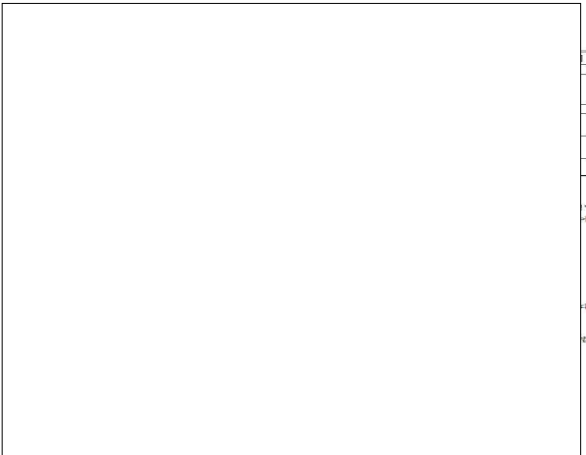
자료: 사업소 제출 자료 재구성

해당 5건의 공사는 대상 사택 5세대별로 각각 계약 요청되었으며, 모두 동일

업체(OO건축)와 일반 수의계약 방식으로 체결되었다. 공사기간은 2022. 9. 29. 부터 2023. 6. 29까지 약 9개월의 기간 내에서 순차적으로 진행되었는데, 동일 단지 내 공사로서 도면 및 견적 내용 또한 유사한 것으로 확인되었다. 각 계약금액은 4,607,500원에서 4,462,000원으로 유사한 구조이다.

해당 공사는 내부품의 단계에서 연도별 ‘보유주택 복리후생 환경개선 시행’ 2 권으로 추진되어 9,500천 원(2022년), 13,800천 원(2023년)의 예산이 각각 배정되었으나, 실제 집행은 세대 단위로 분리하여 계약을 진행한 것으로 확인되었다.

[그림 2] 보유주택 복리후생 환경개선 시행 내부 품의 문서 및 견적

보유주택 복리후생 환경개선 시행 (2022.08.16.)					보유주택 복리후생 환경개선 시행 (2023.03.02.)				
									
세대당 견적 (2022.08.16.)					세대당 견적 (2023.03.02.)				
품명	단위	수량	단가	공급가액	품명	단위	수량	단가	공급가액
벽체도배	m ²	105	13,333	1,399,965	벽체도배	m ²	105	14,000	1,470,000
천정도배	m ²	50	17,400	870,000	천정도배	m ²	50	18,000	900,000
바닥재	m ²	50	18,000	900,000	바닥재	m ²	50	20,000	1,000,000
벽체페인트	m ²	43	12,791	550,013	벽체페인트	m ²	43	13,000	559,000
천정페인트	m ²	13	12,000	156,000	천정페인트	m ²	13	12,000	156,000
목재페인트	m ²	23	15,000	345,000	목재페인트	m ²	23	15,000	345,000
폐기물처리	T	2	158,500	317,000	폐기물처리	T	1.3	300,000	400,000

자료: 사업소 제출 자료 재구성

또한 회사의 행정지시인 「전자공개 수의계약 추가 확대 시행 알림(총무처-8037, 2018. 12. 31.)」에 따라 공사 5백만원 이상 계약은 전자공개 절차를 적용하여야 함에도 불구하고, 5건의 공사는 모두 일반 수의계약 방식으로 계약을 체결하여 전자공개 절차는 적용되지 않았다. 대상기간 계약심의위원회 회의록을 검토한 결과, 해당 건과 관련된 계약방법 결정 안건은 상정되지 않은 것으로 확인되었다.

공사관리규정 준수 여부 점검 결과, 공사감독원과 준공검사자가 동일인으로 지정되어 감독·검사 분리 원칙이 적용되지 않았고, 공사감독일보 양식에 포함된 투입인력 및 공정률 기록은 기재되지 않은 것으로 확인되었다. 준공 검사보고서는 존재하였으나, 공사 실재성과 결과를 확인 할 수 있는 사진 대장 등의 보조 증빙은 확인되지 않았다.

[표 4] ◆◆◆◆사업소 사택수선 공사관리 규정 준수 현황

순번	공사명	감독원	감독일보 작성	감독일보		서류접수		사진 대장
		검사원		인력	공정률	착공 계	준공 계	
1	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (305-1502)	서OO	1건	○	×	○	×	×
		서OO						
2	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (305-1402)	서OO	1건	×	×	○	×	×
		서OO						
3	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (305-1402)	서OO	1건	×	×	○	×	×
		서OO						
4	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (314-103)	서OO	1건	×	×	○	×	×
		서OO						
5	보유사택 1세대 복리후생 환경개선 시행 (307-1504)	서OO	1건	×	×	○	×	×
		서OO						

자료: 사업소 제출 자료 재구성

관계자 진술 등을 통해 공사 시행 사실 자체는 확인하였으나, 감독일보 및 준공증빙만으로는 공사 수행 내역과 준공 결과의 실재성을 서류상으로 객관적으로 입증하기는 어려운 상태이다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆사업소는 계약방법 결정 과정에서 관련 내부 규정과 행정지시에 대한 인지 및 적용이 미흡하였음을 인정하였으며, 관리전환 2세대 우선 개선을 위하여 세대별로 분리하여 추진한 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆사업소장은

- ① 사택수선공사 시행을 소홀히 한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
◆◆◆◆사업소	팀장	서OO	총무팀장	2019. 8. 1. ~ 2025. 2. 16	사택수선공사 관리 소홀	주의
