

# △△△△△△△ 상임감사

## 회수, 통보

제 목 2023년 △△△△△ 무장애탐방로 정비공사 공사비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

### 1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△에서는 2023년 서울시 △△구 △△동 산55 일원에 위치한 무장애탐방로 노후 시설물 정비를 위하여 [표 1]과 같이 ‘2023년 △△△△△ 무장애탐방로 정비공사’를 시행하였다.

[표 1] 2023년 △△△△△ 무장애탐방로 정비공사 현황

| 공 사 명                   | 공 사 기 간                      | 주 요 공 사 내 용                                        | 발주금액(천원) | 비고 |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----|
| 2023년 △△△△△ 무장애탐방로 정비공사 | 2023. 6. 23.~<br>2023. 8. 2. | - 기존 데크·각관 철거<br>- 방부목데크·구조용 각관 설치<br>- 목재 및 각관 도장 | 32,421   |    |

### 2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따라 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비

단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서 시행한 ‘2023년 △△△△△ 무장애탐방로 정비 공사’에 대한 준공도서 및 현장 확인한 결과,

착공 및 준공서류에는 [그림 1]의 노후 데크 시설 철거 후 재설치 공정에서 철재 녹막이페인트 97.04㎡를 도색 한다고 되어 있음에도 실제 현장에서는 페인트칠 물량이 일부 누락 시공되어 있음을 확인하였다.


#### [그림 1] 무장애탐방로 정비공사 철재 도색 현황

---

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

이에 따라 실제 [그림 2]의 데크에서 일부 누락된 페인트칠 수량을 내역서와 비교 검토한 결과, 철재 중 멩에, 장선 부분 녹막이페인트칠 60.38㎡가 누락 시공되었다.

[그림 2] 무장애탐방로 데크 현황사진

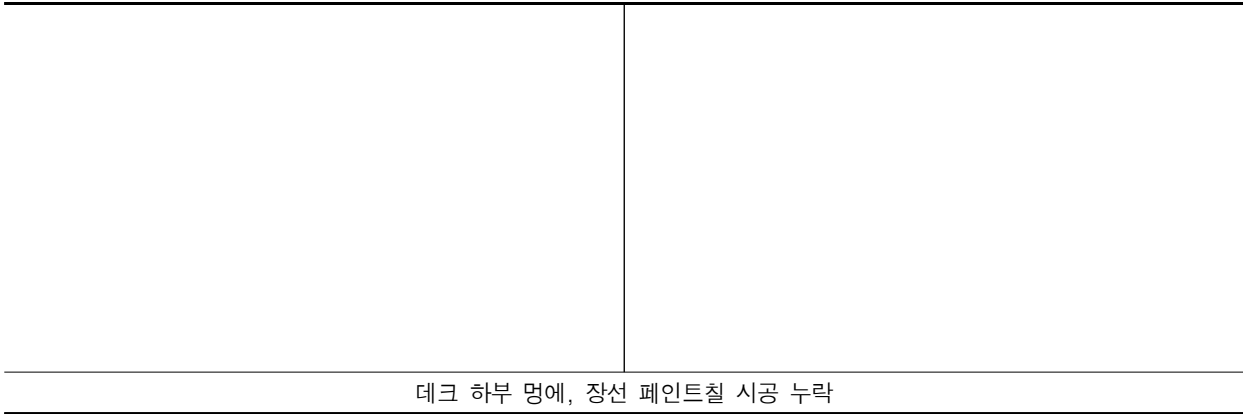

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

따라서 [표 2]와 같이 누락 시공된 페인트칠 수량에 대하여 과다 지급된 공사비 총 2,679,000원을 회수가 필요하다.

[표 2] 2023년 △△△△△ 무장애탐방로 정비공사 페인트 칠 미시공 현황

(단위: 원)

| 공 종      | 규 격    | 수 량           | 당 초    |            | 재 산 정  |            | 차액 계       | 비 고     |
|----------|--------|---------------|--------|------------|--------|------------|------------|---------|
|          |        |               | 단가     | 금액(A)      | 단가     | 금액(B)      | (B-A, 원)   |         |
| 페인트 칠 공정 |        |               |        |            |        |            | △2,679,000 |         |
| 철재 도색    | 97.04㎡ | 97.04 ▶ 36.66 | 26,263 | 2,548,471  | 26,263 | 962,711    | △1,585,760 |         |
| 제경비      |        | 1식            |        | 8,900,386  |        | 8,049,790  | △850,596   |         |
| 소계(a)    |        |               | -      | 29,545,455 | -      | 27,109,099 | △2,436,356 |         |
| 부가세(b)   |        | 1식            | -      | 2,954,545  | -      | 2,710,910  | △243,635   |         |
| 총 계(a+b) |        |               | -      | 32,500,000 | -      | 29,820,009 | △2,679,000 | 천원이하 절사 |

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 노후 데크 시설 철거 후 재설치 공정에서 일부 누락된 페인트칠 물량에 대하여 별도의 정산없이 전액 지급하여 **과다 지급된 공사비 금2,679,000원을 재정상 회수**하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)
