

“혁신하는 감사, 신뢰받는 감사, 협력하는 감사, 공정한 감사”

감사결과 처분 요구서

- ○○○본부 종합감사 -

2026. 6.

감사실시 개요

□ 감사 목적 (배경)

- ◎◎본부 및 관내 6개 지사 기관 운영의 건전성과 효율성을 확보하기 위해 감사를 실시

□ 감사 범위 (중점사항)

- 자금 부정사용 행태 점검 및 반복적 집행사업의 성과 적정성
- 중대재해예방, 도로시설물 보수 및 교통안전시설 관리실태
- 리스크 식별·평가에 따른 핵심위험 통제활동 점검
- 공사·유지보수 등 유지관리 분야 설계, 시공 및 하자관리 적정성
- 임직원 행동강령 및 청탁금지법 이행실태
- 적극행정, 모범사례 발굴 강화

□ 감사 기간

- 2026. 3. 30. ~ 4. 29. [23일간]

□ 감사 대상

- ◎◎본부 및 관내 6개 지사

처분요구사항 일람표

(단위 : 천 원, 명)

번호	소관기관	건 명	처 분 요 구			비고
			처분 종류	금액	신분상 조치인원	
	계	54건(모범 3건, 지적사항 51건)	모범 3 징계 1 고발 1 시정 24 통보 6 경고 4 주의 15	251,651	해임 1 경고 14 주의 18	
1	○○○본부	방문없이 간편 납부하는 '통행료정산기 미납요금 납부서비스' 운영	모범 1			
2	○○○본부	노면색깔 유도선 동시시공으로 작업시간 단축	모범 1			
3	○○○본부	1개 차로 완전확보가 가능한 고속도로 맞춤형 제설기 개발	모범 1			
4	○○○본부	취업규정 위반 등	징계 1		해임 1 경고 2	
5	○○○본부	사문서 번조 및 행사 등	고발 1			
6	○○○본부	복리후생규정 위반	시정 1	1,332		
7	★★처	산재보험료 산정 부적정	시정 1	202,217	경고 1	
8	■□지사	기간제 근로자 채용업무 부적정	주의 1		주의 3	
9	△▲처· ○○○지사	사육 시설관리구역 관리업무 개선 필요	통보 1 주의 6			
10	●○지사	교육훈련비 정산업무 부적정	주의 1		주의 1	
11	○○○본부	신규건축물 취득세 등 제세공과금 납부업무 부적정	시정 1	4,647		
12	○○○본부	이동식 CCTV 관리업무 부적정	시정 1			
13	○○○본부	벤치조형물 설치 예산 사용 및 자산관리 업무 부적정	시정 1		주의 1	
14	○○○본부	토양오염 복원공사 중 발생한 추가공사 설계 변경 부적정	경고 1		경고 1	

번호	소관기관	건 명	처 분 요 구			비고
			처분 종류	금액	신분상 조치인원	
15	○○본부	노후 주유시설 개선공사 부적정	시정 1			
16	○○○지사	직원 음주사고 예방업무 부적정	주의 6			
17	○●지사	기술개발제품 염수분사장치 설치 부적정	통보 1 경고 1		경고 2	
18	○●지사	교통사고 체험관 조성 자산편입 및 비용처리 부적정	시정 1		주의 1	
19	◆◆●●지사	가로등 통신요금 납부 업무처리 부적정	시정 2		주의 2	
20	□□◆◆지사	산업안전보건관리비 정산 처리 부적정	시정 2	537	주의 2	
21	●●지사	CCTV 설치공사 준공 처리 부적정	통보 1 경고 1		경고 1	
22	◆◆처·□□지사	스마트 공사관리 앱 사용자 관리 부적정	통보 1 주의 1		주의 2	
23	○○지사	터널 진입부 안전운전 유도시스템 관리 부적정	시정 1		주의 2	
24	△△처	길어깨 이정표 설치 방안 마련 필요	통보 1			
25	○●지사	시설물 연간 유지보수 공사 설계 부적정	시정 1	5,355	주의 2	
26	□●지사	포장 유지보수 공사 설계 및 공사관리 부적정	시정 1	37,563	경고 2	
27	◆◆지사	차선도색공사 하자관리 업무 부적정	경고 1		경고 1	
28	●●지사	구조물 점검업무 부적정	시정 1		경고 1	
29	□□·□□·○●지사	그라운드 앵커 비탈면 보강공사 업무 부적정	시정 3		경고 2 주의 1	
30	△△처·□□·○●· ◆◆·□□·○●지사	작업차량 후방 안전장치 관리 방안 마련 필요	시정 5 통보 1			
31	○○지사	교통사고 피해시설물 복구 부적정	시정 1		경고 1 주의 1	

모 범 사 례

【 1 】

제 목	방문없이 간편 납부하는 ‘통행료정산기 미납요금 납부서비스’ 운영
소 관 부 서	○○본부
구 분	영업관리
내 용	

○○본부는 고속도로 무인 차로 확대 추세에 발맞추어 고객 편의를 증진하고, 미납 통행료 관리에 소요되는 행정비용을 절감하고자 통행료정산기 미납요금 수납 서비스를 전국 최초로 도입하였다.

기존 미납 통행료 수납은 가상계좌, 홈페이지, 편의점 등 20여 가지 채널을 통해 이루어지고 있으나, 고령층과 화물차 운전자 등 일부 고객은 비대면 납부 방식에 익숙하지 않아, 고속도로 현장 납부를 선호하는 경우가 많았다.


하지만 ○○본부 관내는 대부분의 영업소가 무인차로(하이패스와 통행료정산기 중심)만 운영되고 있어 고객이 차로에서 직접 미납요금을 납부 할 수 없었고, 이에 따라 영업소 사무실 방문에 따른 불편과 안전사고 우려가 지속적으로 발생하였다.

이에 ○○본부는 [그림]과 같이 본사 관련 부서와 협의하여 통행료정산기에서 통행료를 결제하는 과정 중 미납요금을 함께 확인하고 납부할 수 있는 시스템을 구축하였다.

특히 고객 혼란과 차로 지정체를 최소화하기 위해 미납납부 여부를 고객이 직접 선택할 수 있도록 프로세스를 설계하고, 평균 20초 이내에 처리될 수 있도록 신속 대응체계를 마련하였다. 또한, 시범운영 과정에서 정산기에 표출되는 미납내역이

고지서 발송 단계 이후(D+60일)부터 표출되어 조기 납부가 안 되는 문제점이 있어 이를 해결하고자 미납 데이터 표출 시기를 1일(D+1)로 대폭 단축하고, 고객이 정산기에서 요금 납부 시 미납 정보를 즉시 확인하여 결제할 수 있는 시스템을 구축하였다.

[그림] 통행료정산기 미납 납부 프로세스

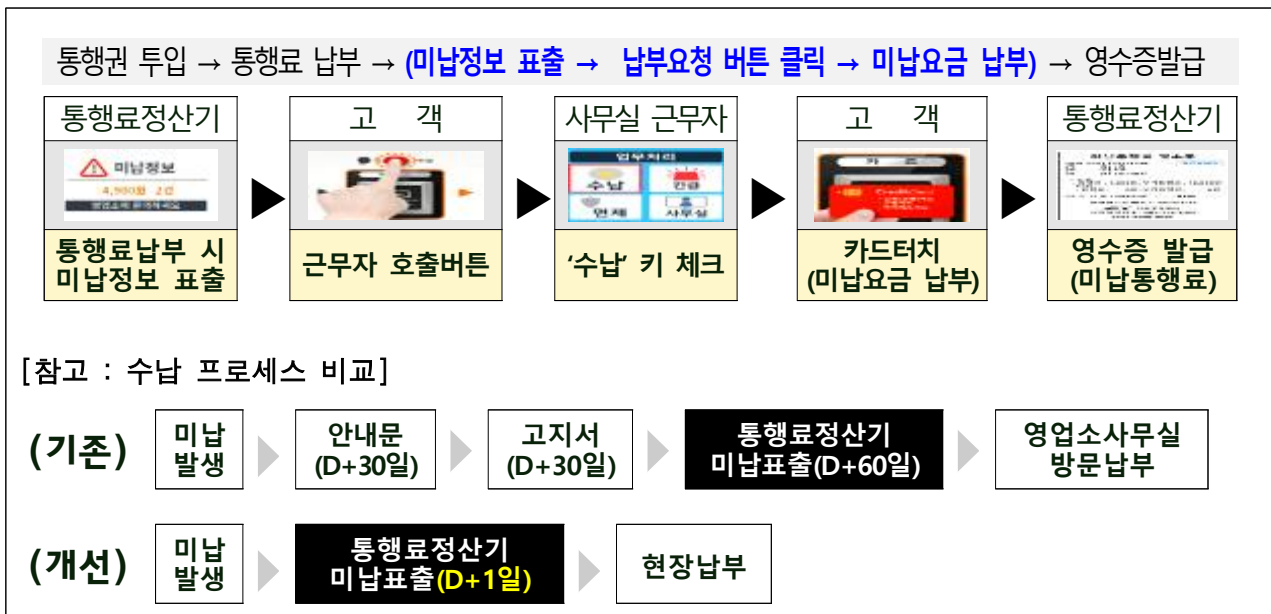

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

○○본부는 이러한 개선을 통해 도입 10개월 간('25. 6 ~ '26. 3) 총 665,889건, 19.5억 원의 미납통행료를 수납하였으며, 통행료정산기는 공사 자산으로 타 채널과 달리 수납 수수료가 발생하지 않아 행정비용 1.66억 원을 절감하는 효과를 거두었다.

이번 사례는 무인차로 확대에 따른 고객 불편을 단순히 민원으로 처리하는데 그치지 않고, 현장수납 프로세스 개선과 시스템 보완을 통해 고객 편의성 향상, 미납통행료 조기 수납, 행정비용 절감, 고객안전 확보를 동시에 달성한 업무개선 사례라 할 수 있다.

조치할 사항 전기관은 위 모범사항을 참고하여 무인차로 확대에 따른 고객 불편 사항을 적극 발굴하고, 고객 중심의 납부환경 조성 및 미납통행료 관리 효율화를 위한 업무 개선 사례를 지속적으로 추진하시기 바랍니다.

모 범 사 례



【 2 】

제 목 노면 색깔 유도선 동시시공으로 작업시간 단축
소 관 부 서 ○○본부
구 분 유지관리
내 용

○○본부는 고속도로 이용자의 안전한 주행을 유도하고 원활한 교통흐름을 위하여 노면 색깔 유도선 설치 및 유지관리 업무를 수행하고 있다.

노면 색깔 유도선은 먼저 바탕색을 시공한 후 건조 과정을 거쳐 화살표를 별도로 시공하는 방식으로 이루어져 작업 시간이 길어 교통차단 시간이 증가하고, 또한 화살표를 별도로 시공하는 과정에서 동일 구간에 대한 중복 시공이 발생하여 예산이 낭비되는 등의 문제점이 있었다.


이에 위 본부는 노면 색깔 유도선 시공 시 바탕색과 화살표를 중복·분리 시공하던 기존 방식을 개선하여 아래 [그림 1], [그림 2]와 같이 노즐 2개를 설치하여 앞의 노즐에서는 바탕색 구간에 바탕색만 시공하고 위의 노즐에서는 화살표만 시공하도록 설정하여 바탕색과 화살표를 동시에 시공하는 장비를 개발하였다.

[그림 1] 유도선 동시시공 모습



자료 : ○○본부 제출자료 재구성

[그림 2] 노면 색깔 유도선 동시시공 개선

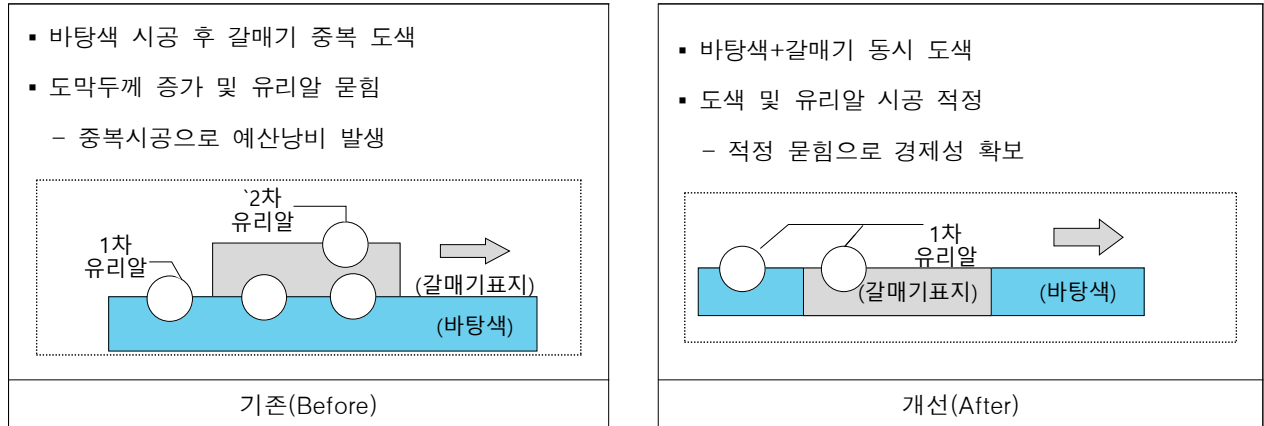

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

그 결과 화살표를 중복시공하지 않아 연간 125백만 원의 공사비 예산절감 효과를 거두었고, 조기 개방에 따른 시간적 편익 330백만 원을 확보하는 등 예산 절감 및 사회적 편익을 포함하여 연간 약 4억 5천만 원의 비용 절감 효과를 실현하였다.

또한, 공정 단순화에 따른 작업시간 단축으로 교통차단 시간이 감소하여 작업자 안전 확보 및 작업장 교통사고 예방에 기여하였다.

아울러 실시 제안 2등급 획득 및 본사 방침으로 전국 확산되어 신설 및 공용 구간 차선도색 시행 시 적용되고 있을 뿐만 아니라 관련 특허 취득을 추진하고 있어 공사의 지적재산 보호에도 앞장서고 있다.

조치할 사항 전기관은 위 모범사항을 참고하여 관련 업무개선 사례 등을 적극 발굴하여 추진하시기 바랍니다.

모 범 사 례



【 3 】

제 목 1개 차로 완전 확보가 가능한 고속도로 맞춤형 제설기 개발
소 관 부 서 ○○본부
구 분 유지관리
내 용


○○본부는 관내 고속도로 제설작업을 수행하며 동절기 교통안전 확보를 위한 제설장비(일반제설기, 광폭제설기 등) 운영 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.

일반제설기(폭 2.8m)는 작업 폭이 차로폭(3.6m)보다 좁아 제설작업 시 차량 1대로 1개 차로 제설이 불가능하고, 광폭제설기(4.1m, 주행 시 3.3m)는 단독 작업 시 차로폭을 초과하는 작업폭으로 인해 인접차로 주행차량과의 충돌 위험이 상존하는 등 작업 효율성과 교통 안전성에 어려움이 있으며, 특히 광폭제설기의 경우 영업소(3.5m) 통과 시 제설기 폭원이 넓어 시설물 충돌 발생 등 안전 주행에 어려움이 있었다.

이에 ○○본부는 고속도로 주행 시에는 양측 블레이드가 접히는(folding) 구조로 2.6m까지 축소되어 영업소 및 협소 구간에서도 안전한 통행이 가능하고, [그림]과 같이 제설작업 시 차로폭과 일치된 3.6m로 확장되어 1개 차로를 완전 제설할 수 있는 “고속도로 맞춤형 제설기¹⁾”를 개발하였다.

1) 제설기 블레이드는 5개(800mm 3개, 900mm 2개)로 되어 있으며, 중앙 3개에는 800mm의 고무삽날을 붙이고 양쪽 2개에는 1,050mm의 고무삽날을 붙여 실제 3.9m의 제설 성능을 갖추고 있음.

[그림] 고속도로 맞춤형 제설기 개발 현황

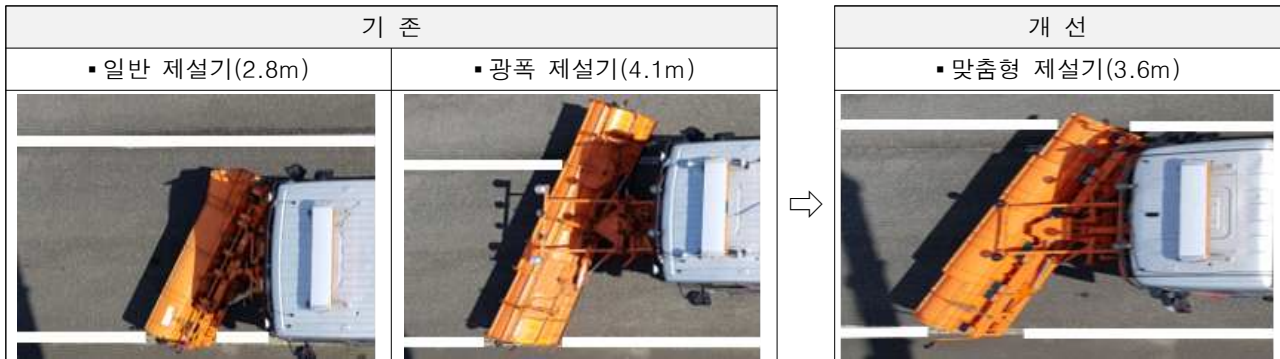

자료 : ◎◎본부 제출자료 재구성

또한 기존 광폭제설기 대비 경량화(2.5톤 → 1.6톤) 및 간단한 구조 적용²⁾을 통해 장비 고장 발생을 최소화하고, 2중 충격 흡수장치를 도입하여 외부 충격 시 장비 파손 및 차량 진동 전달을 저감하는 등 작업자 안전성도 향상시켰다.

그 결과, 위 본부는 제설작업 시 단일 장비로 1개 차로 완전 제설이 가능해짐에 따라 이용차량의 주행 안전성을 향상시켰을 뿐만 아니라 장비 경량화 및 구조 단순화 등으로 제설기 성능 향상에 크게 기여하였다.

조치할 사항 전기관은 위 모범사항을 참고하여 현장 업무의 효율을 높일 수 있는 개선 사례 등을 적극 발굴하여 추진하시기 바랍니다.

2) 독립된 5개의 삽날 및 20개 우레탄 링크로 충격흡수

징 계 요 구

【 4 】

제 목	취업규정 위반 등
소 관 부 서	○○본부
구 분	노무업무
내 용	

1. 사건개요

○○본부는 「취업규정」에 따라 소속 직원의 출·퇴근, 휴가, 외출 등 근태관리 업무를 수행하고 있으며, 직원이 공가를 사용하고자 하는 경우에는 관련 증빙자료를 제출받아 승인 여부를 판단하고 있다.

한편, 감사처는 내부통제 사각지대를 발굴하고 현장 중심의 예방감사를 구현하기 위하여 2026년 감사주제공모를 실시하였으며, 접수된 과제 중 ‘직원 헌혈공가 처리 적정성’이 우수주제로 선정됨에 따라 이 주제를 ○○본부 종합감사의 주요 착안사항에 포함하였다.

이에 따라 감사처는 ○○본부 및 관내 지사를 대상으로 헌혈공가 운영 실태, 공가 승인절차 준수 여부, 증빙자료의 적정성 및 공가 사용의 적법성 등에 대하여 감사를 실시하였고, 감사 결과 ○○본부 ▼부 A는 실제 헌혈을 실시하지 않았음에도 기존 헌혈증서의 날짜를 조작한 허위 증빙자료를 제출하여 반복적으로 공가를 사용하였고, 승인권자는 제출된 증빙자료에 대한 확인을 소홀히 하여 이를 승인한 사실이 확인되었다.

2. 공가 사용 부적정

A(0급, 안전)는 2021. 1. 27.부터 현재까지 ○○본부 ▷▷센터에서 ☆업무를 수행하고 있다.

가. 관계규정 및 판단기준

「취업규정」 제5조(성실복무의 의무)에 따르면 직원은 관계법령 및 공사의 제규정과 소속상사의 직무상의 명령을 준수하며 부여된 업무를 성실히 수행하여야 한다고 되어 있다. 또한 같은 규정 제10조(직장이탈의 금지)에 따르면 직원은 소속부서장의 승인 또는 정당한 사유 없이 직장을 이탈하여서는 아니 된다고 되어 있다.

한편, 헌혈 공가의 경우 「복리후생매뉴얼」에 따라 소속부서장의 결재를 받고 우선 공가를 사용한 후 헌혈증서 등 헌혈 사실을 증명하는 증빙자료를 제출하여 노무 담당부서의 최종 승인을 받도록 되어 있다.

따라서, 직원은 헌혈공가를 사용할 경우 사전에 결재를 받아 공가를 사용하고, 추후에 헌혈 증서를 첨부하여 사후 승인을 받아야 하며, 이 때 직원은 사실에 근거한 증빙자료를 제출해야 하고, 허위 사실이나 위·변조된 자료를 근거로 공가를 승인 받아서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

A는 [표]와 같이 2025년 총 11차례에 걸쳐 공가(헌혈)를 사용하면서 실제로 헌혈을 실시하지 않았음에도 과거 발급 받은 헌혈증서의 날짜를 임의로 조작¹⁾하여 마치 해당 일자에 헌혈을 실시한 것처럼 변조한 증빙서류를 제출하고, 이를 근거로 헌혈

1) 문답조사 내용에 따르면 지인의 도움으로 헌혈증서의 날짜를 조작하였으며, 정확한 방법은 모르고, 휴대폰 카메라로 증서를 찍어서 날짜를 바꿨다고 답변하였음.

공가를 9차례 승인 받아 「취업규정」에서 정한 관계법령 및 소속상사의 직무상 명령을 준수하여야 할 ‘성실복무의 의무’와 ‘직장이탈의 금지’ 조항을 위반하였다.

[표] 헌혈공가 사용현황

구 분	헌혈공가 사용일	헌혈증서 번호	헌혈확인증명서	비 고
1	2025. 5.13.	10-25-*****	○	-
2	2025. 6.29.	10-25-*****	○	-
3	2025. 7.18	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조
4	2025. 8. 8.	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조
5	2025. 8.21.	-	X	2025. 8.22. 실시한 헌혈증서 날짜 변조
6	2025. 9.10.	-	X	2025. 8.22. 실시한 헌혈증서 날짜 변조
7	2025. 9.30.	-	X	6번 위조 헌혈증서 중복 첨부(헌혈일 9.10.)
8	2025.10.20	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조
9	2025.11. 9.	-	X	2025.11.18. 실시한 헌혈증서 날짜 변조
10	2025.11.29.	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조
11	2025.12.19.	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

3. 공가 승인 부적정

B(0급, 행정)는 2025. 2. 3.부터 현재까지 같은 본부 ▽부에서 □□업무를 총괄하고 있고, C(0급, 사무원)는 2025. 2. 27.부터 2026. 2. 2.까지 같은 부서에서 □□업무를 수행하였으며, 2025. 7. 18.부터 2025. 12. 19.까지 9회에 걸쳐 사용한 A의 허위공가에 대해 각각 최종 승인과 중간 검토 업무를 담당하였다.

가. 관계규정 및 판단기준

「취업규정」 제5조(성실복무의 의무)에 따르면 직원은 관계법령 및 공사의 제규정과 소속상사의 직무상의 명령을 준수하며 부여된 업무를 성실히 수행하여야 한다고 되어 있다.

따라서 승인권자는 공가 승인 요청이 있는 경우 신청 사유와 증빙자료의 적정성을 확인한 후 승인하여야 하며, 단순히 첨부 여부만 확인할 것이 아니라 제출된 증빙자료가 사실에 부합하는지 여부를 검토하여 복무 질서가 적정하게 유지되도록 관리할 책임이 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 B와 C는 각각 본부 회회관리 총괄책임자, 회회관리 담당자로서 직원의 근태관리 증빙서류를 면밀히 검토하고 적정한 경우 승인하여야 하는데도 A가 제출한 헌혈증서는 과거 발급된 헌혈증서의 날짜를 임의로 조작한 것으로 [그림]과 같이 일부 증빙서류에 “AI로 생성한 콘텐츠” 문구 표시 및 날짜 부분의 폰트 및 인쇄 상태가 상이하고, 증빙서류의 헌혈일자와 공가 신청일 간의 불일치²⁾가 확인되는 등 진위 여부를 의심할 수 있는 사정이 있었는데도 공가를 승인함으로써 허위공가가 반복적으로 승인되는 결과를 초래하였다.

따라서 B와 C는 회회관리 책임자와 담당자로서 요구되는 관리·감독 주의의무를 소홀히 한 사실이 인정된다.

[그림] 헌혈증서 변조 샘플



자료 : 하이포탈 인력정보시스템 첨부자료 다운로드

관계기관 등 의견 및 검토결과

2) 2025. 9. 30. 사용한 공가의 증빙자료에 9.10. (날짜 변조) 헌혈 증서 첨부

① 관계기관 의견 및 검토결과

○○본부는 인력 감운영(현원 △1), 겸직(▽부장, ▲부장) 등에 의한 업무량 과다로 본부 전 직원의 근태 관련 증빙자료를 세심하게 확인하는데 한계가 있었고, 하이포탈 시스템 화면에서 증빙자료를 조회할 경우 확대되어 표출되기 때문에 파일의 상세 내용을 세밀하게 확인하기가 어려운 실정이라고 주장한다.

그러나 업무량 증가나 인력운영상의 어려움은 부적정한 공가 승인이 발생하게 된 경위에 대한 설명은 될 수 있으나, 승인권자의 확인 의무 소홀에 대한 책임을 면하게 하는 사유가 될 수 없고, 하이포탈 시스템상 증빙자료 확인에 일부 불편함이 있었다고 하더라도 파일 확대, 원본 다운로드 또는 제출자에 대한 추가 확인 등의 방법을 통해 증빙자료의 진위 여부를 검토할 수 있었던 점을 고려할 때, 시스템상의 제약만으로 승인권자의 관리·감독 책임이 면제된다고 보기 어렵기 때문에 위 주장은 타당하지 않다고 판단된다.

② 관련자 의견 및 검토결과

A는 헌혈증서를 조작하여 허위로 공가를 사용한 본인의 행위를 인정하면서도, 가족의 간병 문제와 본인의 정신적·신체적 질환에 따른 스트레스 및 심리적 불안감으로 인해 잘못된 판단을 하게 되었다고 주장한다.

그러나 해당 행위는 단순한 판단 착오나 순간적인 충동에 의해 발생한 행위가 아니라, 기존에 발급받은 헌혈증서의 날짜를 임의로 조작한 후 증빙자료로 제출하여 공가 승인을 받은 행위로서 의도적이고 적극적인 조작 행위에 해당한다.

특히 해당 행위는 일회성으로 발생한 것이 아니라 9회에 걸쳐 반복적으로

이루어졌으며, 공가신청, 증빙자료 변조, 승인요청 등 일련의 절차를 거쳐 지속적으로 진행되었다는 점에서 우발적 행위 또는 순간적인 판단 착오로 보기 어렵다. 따라서 우울증이나 공황장애 등의 질환이 해당 조작 행위를 직접적으로 유발하였거나 자신의 행위에 대한 인식 및 통제 능력을 현저히 저하시켰다고 볼 수 없다.

징계요구 양정 헌혈증을 변조하여 허위공가를 사용한 A의 행위는 「취업규정」 제5조 및 제10조를 위반한 것으로 「인사규정」 제34조 제1항 제1호의 징계사유에 해당한다. 헌혈증서를 변조하여 허위로 공가를 신청한 행위는 단순한 복무 위반이나 절차상 착오를 넘어, 승인권자의 직무상 판단을 왜곡시키고 허위공가를 승인받은 행위에 해당한다. 특히 동일한 수법으로 총 9회에 걸쳐 허위공가를 사용한 점을 고려할 때, 이는 일회성 비위행위가 아니라 조직의 휴가 승인 및 복무관리 체계를 지속적으로 악용한 행위로 볼 수 있다. 따라서 해당 행위는 복무질서를 저해하는 수준을 넘어 기관의 인사·복무관리에 대한 신뢰를 훼손한 것으로 비위의 도는 중(重)하다고 판단되고, 기존 헌혈증서의 날짜를 조작하는 방법으로 증빙자료를 변조한 후 이를 공가 승인자료로 제출한 행위는 단순한 부주의나 착오, 규정에 대한 오인으로 발생할 수 있는 행위가 아니며, 행위 자체가 의식적이고 적극적인 조작 행위에 해당한다. 또한 동일한 방법을 반복적으로 사용하여 공가 승인을 받은 점에서 상습성과 계획성이 인정되며, 총 9회에 걸쳐 반복적으로 이루어진 행위의 경위와 수법을 고려할 때 이는 과실에 의한 행위로 볼 수 없고 명백한 고의에 의한 행위로 판단되어, 「징계양정요구에 관한 업무처리기준」에 따라 “해임” 처분이 타당하다.

한편 B, C의 경우 근태관리 소홀에 관한 사항으로 비위행위의 도가 징계에 이르지 않아 근태 승인 업무에 대한 관리·감독업무에 주의·각성을 촉구하는 의미

에서 경고 처분하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

◎◎본부장은 「취업규정」 제5조(성실복무의 의무)를 위반한 A를 「인사규정」 제34조(징계)에 따라 징계(해임) 처분하시기 바랍니다.(징계)

★★처장은 근태승인 업무에 대한 관리·감독업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
◎◎본부	0급	B	2025. 2. 3. ~ 현재	▽부장	◎◎본부	경고
◎◎본부	0급	C	2025. 2. 27. ~ 2026. 2. 2.	▽담당	◎◎본부	경고

고 발

【 5 】

제 목 사문서 변조 및 행사 등

피 고 발 인 성 명 : A

생년월일 : 0000. 00. 00.

주 소 : ○○ ♠♣시 ♣♣로 00길 00

고 발 건 명 사문서 등의 변조 등¹⁾

고 발 사 실

1. 업무개요

○○본부는 「취업규정」에 따라 소속 직원의 출·퇴근, 휴가, 외출 등 복무관리 업무를 수행하고 있으며, 직원이 헌혈을 사유로 공가를 사용하고자 하는 경우 관련 증빙자료를 제출받아 공가 승인 및 근태처리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「형법」 제231조(사문서 등의 위조·변조)는 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실 증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자를 처벌하도록 규정하고 있고, 같은 법 제234조(위조사문서 등의 행사)는 위조 또는 변조된 문서를 행사한 자를 처벌하도록 규정하고 있다. 또한 「형법」 제314조(업무방해)는 위계로써 업무를 방해한 자를 처벌하도록 규정하고 있다.

따라서, 직원은 공가 승인과 관련하여 사실에 부합하는 증빙자료를 제출하여야 하며, 허위 또는 변조된 증빙자료를 제출하여 승인권자의 판단을 오인하게 하거나 기관의 정상적인 복무관리 업무를 왜곡하여서는 아니 된다.

1) 「형법」 제234조(위조사문서 행사), 제314조(업무방해) : 5년 이하 징역 또는 1천500만 원 이하 벌금

3. 감사결과 확인된 문제점

A(0급, 안전)는 2021. 1. 27.부터 현재까지 위 본부 교통관리센터에서 교통상황 관리 업무를 수행하고 있는 직원으로서, 관계 규정에 따라 성실히 복무하여야 할 지위에 있다.

그런데 위 사람은 [표]와 같이 2025년 총 11회의 헌혈공가를 신청·사용하는 과정에서 이 중 9회에 대하여 실제로는 해당 일자에 헌혈을 하지 않았음에도 과거에 발급 받은 헌혈증서의 날짜를 임의로 수정한 후 이를 공가 승인 증빙자료로 제출한 것으로 확인되었다. 그 결과 A은 실제 헌혈 사실이 없는 날에도 헌혈공가를 승인받아 사용하였고, 해당 시간 동안 정당한 사유 없이 근무지를 이탈한 상태가 발생하였다.


[표] 헌혈공가 사용현황

구 분	헌혈공가 사용일	헌혈증서 번호	헌혈확인증명서	비 고
1	2025. 5.13.	10-25-*****	○	-
2	2025. 6.29.	10-25-*****	○	-
3	2025. 7.18	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조
4	2025. 8. 8.	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조
5	2025. 8.21.	-	X	8.22. 실시한 헌혈증서 날짜 변조
6	2025. 9.10.	-	X	8.22. 실시한 헌혈증서 날짜 변조
7	2025. 9.30.	-	X	6번 위조 헌혈증서 중복 첨부(헌혈일 9.10.)
8	2025.10.20	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조
9	2025.11. 9.	-	X	11.18 실시한 헌혈증서 날짜 변조
10	2025.11.29.	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조
11	2025.12.19.	-	X	2번 헌혈증서 날짜 변조

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

아울러 제출된 일부 파일에는 [그림]과 같이 “AI로 생성한 콘텐츠” 문구가 그대로 표시되어 있었고, 날짜 부분의 폰트 및 인쇄 상태가 원본 문서와 현저히 상이한 것으로 나타났다. 이러한 정황에 비추어 볼 때, A가 공가를 승인 받을 목적으로 증빙자료를 의도적으로 변조하였을 가능성이 큰 것으로 판단된다.

[그림] 헌혈증서 변조 샘플



4. 위법성 검토

☐☐사에서 발급되는 헌혈증서는 특정 일자에 헌혈이 이루어졌다는 사실을 증명하는 문서이므로, 그 날짜를 임의로 수정하여 원래의 내용을 변경한 행위는 「형법」 제231조의 사문서 위조·변조에 해당할 소지가 있다. 또한 A는 위와 같이 가공된 증빙 자료를 근태관리 시스템에 업로드하여 공가 승인의 증빙자료로 제출하였으므로, 이는 변조된 사문서를 행사한 행위로서 같은 법 제234조에 해당할 소지가 있다.

더불어 A는 허위 증빙자료를 제출하는 방법으로 승인권자 및 근태관리 담당자로 하여금 실제 헌혈이 있었던 것으로 오인하게 하여 공가 승인 및 복무처리를 하도록 하였고, 그 결과 해당기관의 정상적인 복무관리 업무가 왜곡되었다. 허위 자료 제출을 통해 기관의 관리업무를 그르치게 한 경우 위계에 의한 업무방해가 문제 될 수 있다는 점에서, 해당 행위는 「형법」 제314조 위반에도 해당할 소지가 있는 것으로 판단된다.

관련자 의견 및 검토결과 A는 감사 과정에서 헌혈증서 날짜를 수정하여 제출한 사실을 인정하였고, 자신의 행위에 대하여 반성하고 있다는 취지의 의견을 제시하였다. 다만 위와 같은 인정 여부와 별개로 반복적인 허위 증빙자료 제출 및 공가 사용 행위의 위법성 여부는 수사기관의 판단을 받을 필요가 있다.

조치할 사항 ◎◎본부장은 A의 허위 헌혈증서 제출 및 공가 사용 행위에 대하여 「형법」 제231조(사문서 등의 위조·변조), 제234조(위조사문서 등의 행사) 및 제314조(업무방해) 위반 혐의로 수사기관에 고발 또는 수사의뢰 조치하시기 바랍니다.(고발)

시 정 요 구

【 6 】

제 목 복리후생규정 위반

소 관 부 서 ○○본부

구 분 급여관리

내 용

1. 업무개요

○○본부는 「취업규정」 및 「직원 보수 및 복리후생규정」에 따라 소속 직원의 출·퇴근, 휴가, 외출 등 근태관리 업무와 급여 등 보수 지급 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「직원 보수 및 복리후생규정 시행세칙」 제3조(휴가 및 공가자의 보수)에 따르면 취업규정에서 정하는 휴가(병가 포함) 및 공가기간 중에는 보수 전액을 지급한다고 되어 있고, 제5조(결근자의 보수)에 따르면 결근자에 대하여는 동 결근일수에 해당하는 보수는 지급하지 않도록 되어 있다.

따라서, 허위 증빙자료를 제출하여 공가 승인을 받은 경우 해당 공가는 적법한 공가로 인정하기 어려우며, 그 기간 동안 근무지에 출근하지 않은 행위는 결과적으로 정당한 승인 없이 근무를 하지 않은 경우에 해당하므로 그 기간에 지급된 보수는 지급 근거를 상실하게 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부 ▼부 A는 2025년 총 11회의 현월공가를 사용하면서 이 중 9회에 대하여 허위 증빙자료를 제출하여 공가를 승인받고 사용하였다.

그 결과 A는 실제로 근무하지 않은 9일에 대한 급여 1,332천 원 상당¹⁾을 부당 수령하였다.

관계기관 의견 ○○본부는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 허위공가일에 지급된 급여 1,332천 원 상당액을 관련 직원으로부터 환수 조치하시기 바랍니다.(시정)

1) 1,332,090원 = 148,010원 × 9회 (기준급 117,930원 + 직무급 11,300원 + 건설수당 6,460원 + 기술수당 1,660원 + 위험수당 4,000원 + 직무수당 6,660원)* * 출처 : ○○본부 작성자료 재구성

시 정 요 구

【 7 】

제 목 산재보험료 산정 부적정

소 관 부 서 ★★처

구 분 노무관리

내 용

1. 업무개요

★★처는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률(이하, “고용산재보험료징수법”)」 및 같은 법 시행령에 따라 ☞☞공단이 부과하는 산재보험료의 납부 및 이와 관련된 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「고용산재보험료징수법」 및 같은 법 시행령에 따라 사업주는 적정 산재보험료를 산정·신고·납부하여야 하고, 「임금채권보장법」 제9조에 따라 임금채권부담금을 납부하여야 한다. 다만, 퇴직금 사전 정산 또는 퇴직보험 가입 등 일정 요건을 충족하는 경우 ☞☞공단에 부담금 경감신청을 통해 부담 비율을 경감받을 수 있다.

따라서, ★★처는 산재보험료 산정 시 임금채권부담금 경감 대상 여부를 검토하고, 해당 하는 경우 관련 서류를 갖추어 경감신청을 하여 적정한 보험료를 납부하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★처는 2023년에 산재보험료 신고·납부 과정에서 우리 공사가 임금채권 부담금 경감 대상¹⁾에 해당하는데도, ☞☞공단에 부담금 경감신청을 하지 아니하였다.

그 결과, [표]와 같이 경감이 적용되지 않은 부담 비율이 그대로 적용되어 산재보험료(예상) 202,217천 원이 과다 납부되었다.

[표] 산재보험료 요율 및 납부현황

(단위 : 천원)

연도	구분	산출보험료 ²⁾	보수총액	적용요율	경감 적용시(최대50%)
2023년	산재보험	4,988,023	674,057,155	0.74%	-
	임금채권부담금 ³⁾	404,434		0.06%	△ 202,217(예상)
	석면피해구제 분담금	20,222		0.003%	-
	계	5,412,679	-	-	-

자료 : ★★처 제출자료 재구성

관계기관 등 의견 ★★처는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★처장은 ① ☞공단에 경감신청 하지 않은 2023년 임금채권부담금에 대해 경감신청하여 소급 환급받을 수 있도록 조치 하고(시정), ② 산재보험 관리업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
★★처	0급	D	2022. 6. 9.~2026. 2. 2.	☐담당	☐●본부	경고

1) 퇴직금을 미리 정산하여 지급하였거나 퇴직보험 등에 가입 또는 퇴직연금 제도를 설정한 사업주는 ☞공단에 「부담금경감신청서」를 작성 제출하여야 한다.

2) 보수총액 × 적용요율

3) 연도별 임금채권부담금 적용 비율

(단위 : %)

연도	고시부담비율	경감비율	적용부담비율	비 고
2021년	0.06	0.03	0.03	
2022년	0.06	0.012	0.048	
2023년	0.06	0*	0.06	* 부담금 경감 미신청
2024년	0.06	0.03	0.03	
2025년	0.06	0.03	0.03	

주 의 요 구

【 8 】

제 목 기간제근로자 채용업무 부적정

소 관 부 서 ■■지사


구 분 인사관리

내 용

1. 업무개요

■■지사는 직원 결원 발생시 기간제 근로자 채용을 위하여 본부에서 실시한 서류전형 결과를 통보받아 면접전형을 실시하고 최종 합격자를 선정하는 업무를 수행하고 있고, 이에 따라 “2025년 ■■지사 기간제 근로자(안전순찰원) 서류전형 결과 및 면접전형 계획”을 수립하여 [그림]과 같이 기간제 근로자를 선발하였다.

[그림] 2025년 기간제 근로자(안전순찰원) 채용절차



*서류합격자 통보 오류로 재면접 실시 ** 자료 : ■■지사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

인사혁신처의 「공정채용 가이드북」, 「공공기관 블라인드 채용 가이드라인」에 따르면 공공기관 채용 절차 전반에 있어 공정성과 투명성을 확보하도록 하고 있으며, 이러한 취지에 비추어 볼 때 전형 단계별 운영 및 결과 관리 과정에서 응시자에게 필요한 정보가 정확하고 명확하게 전달될 수 있도록 적정하게 관리하여야 한다.

따라서 ■■지사는 서류전형 합격자에 대하여 면접전형 응시 기회를 공정하게 부여 하여야 하며, 대상자 통보 오류 등으로 특정 응시자의 참여 기회가 제한되지 않도록 채용 절차를 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■지사는 기간제 근로자 채용 과정에서 서류전형 응시자 6명 중 4순위 합격자에게 면접대상자 통보를 누락하고, 6순위 불합격자에게 면접대상자임을 잘못 통보하였다. 그 결과 실제 서류전형 4순위 합격자는 면접에 응시하지 못하였고, 채용전형에 참여할 정당한 기회를 부여받지 못하는 불이익이 발생하였다.

이후 해당 기관은 해당 사실을 인지하고 불이익을 받은 응시자를 포함하여 재면접을 실시하는 등 보완조치를 취하였으나, 최초 면접전형이 이미 진행된 이후 사후적으로 이루어진 조치로서 채용 절차의 공정성 및 신뢰성을 저하시켰고, 채용전형 대상자 통보 등 기본적인 절차 관리에 있어 내부통제가 미흡하였다.

관계기관 의견 및 검토결과 ■■지사는 착오 사실을 인지한 이후 즉시 재면접을 실시하여 최초 면접대상 통보를 받지 못한 지원자에게 면접 기회를 제공하였으며, 결과적으로 불이익을 받은 지원자가 없고 최종합격자 변동 없이 채용절차가 정상적으로 마무리 되었다고 주장한다.

그러나 위 주장은 채용절차상 하자가 발생한 이후 이루어진 사후적 보완 조치에 불과한 것으로, 당초 면접대상자 통보가 적정하게 이루어졌다면 해당 지원자는 최초 면접일에 정상적으로 응시할 수 있었을 것이고, 기관 또한 동일 채용절차를 반복 수행하는 재면접을 실시하지 않았을 것으로 보이는 바, 본 건은 채용절차 관리 소홀로

인해 불필요한 행정력과 비용이 추가적으로 발생한 사례에 해당한다. 또한, 채용절차의 공정성은 단순히 최종 합격자의 변동 여부만으로 판단할 사항이 아니라, 전형 전 과정이 객관적이고 동일한 조건 아래 적정하게 운영되었는지 여부까지 포함하여 판단하여야 함에도, 본 건과 같이 면접대상자 통보 오류가 발생하고 이를 면접 종료 이후까지 인지하지 못한 것은 채용업무 수행 과정의 기본적인 내부통제가 미흡하였음을 보여주는 것이다. 따라서 위 주장은 본 건의 부적정성을 해소할 만한 정당한 사유로 보기 힘들다.

조치할 사항

■■지사장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 채용관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

★★처장은 기간제 근로자 채용업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
■■지사	0급	E	2023. 1.30. ~ 2025. 2. 26.	■관리	♣●처	주의
■■지사	0급	F	2024. 3.13. ~ 2025. 2. 26.	●차장	◆●본부	주의
■■지사	0급	G	2025. 2. 4. ~ 현재	◆부장	■■지사	주의

주의요구 및 통보

【 9 】

제 목 사옥 시설관리 용역 관리업무 개선 필요

소 관 부 서 △▲처, ●●·■□·●○·◆◆·■□·●○·●○지사

구 분 유지관리

내 용

1. 업무개요

△▲처는 ♣♣(주)(이하 ‘계약상대자’)와 “한국도로공사 사옥 시설관리 용역” 계약을 체결하여 각 본부 및 지사의 사옥과 부대시설에 대한 청소·미화 등 시설 유지관리 업무를 수행하고 있다.

또한, △▲처는 용역계약의 관리·감독 업무를 각 본부 및 지사에 위임하여 운영하고 있으며, 각 본부 및 지사는 용역 감독원을 지정하여 계약상대자의 과업 수행에 대해 확인하고 계약이 적정하게 이행되도록 관리·감독하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독)에 따르면 계약담당자는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요한 감독을 하여야 한다고 규정되어 있다. 또한 계약담당자는 계약상대자의 용역 이행 상황을 감독하고 계약 내용과 다르게 이행된 사항에 대하여 필요한 조치를 할 수 있으며, 이행되지 아니한 부분에 대하여 상당한 금액을 감액하는 등의 필요한 조치를 요구할 수 있다.

한편, 해당 용역 과업지시서 제4조(본부 및 지사 청소·미화관리)의 청소 세부과업 범위의 기타 사항에 따르면 계약상대자는 시설물 상황 및 일일업무일지를 작성하여 비치하여야 하며, 작성된 일일업무일지는 감독관의 확인 및 서명을 받도록 되어 있다.

따라서 계약상대자는 계약기간 동안 과업지시서에 따른 업무를 정상적으로 수행하여야 하고, 인력 운영 등을 통하여 과업 수행에 공백이 발생하지 않도록 관리할 책임이 있다. 또한 감독을 위임받은 본부 및 지사의 감독원은 일일업무일지 작성 여부, 과업 수행상황 및 인력 운영실태 등을 확인하여야 하며, 과업 미이행이나 업무공백이 발생한 경우에는 시정요구, 대체인력 투입 요구 등 필요한 조치를 실시하여야 한다.

또한 감독원이 동일한 상황에 대해 동일한 기준으로 업무를 수행할 수 있도록 감독업무의 범위와 절차, 점검항목, 보고체계 및 업무공백 발생 시 조치방법 등이 명확하게 마련되어 있어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●·■·●●·●●·◆◆·■●·●●지사는 계약상대자가 일일업무일지를 작성하지 않는데도 이에 대한 확인 또는 시정 등 필요한 조치를 취하지 않았고, [표]와 같이 최근 3년 간(총 181일) 각 지사 현장대리인이 휴가 등을 사용하여 실제 업무수행이 불가능한 기간이 발생하였음에도, 감독원은 대체근무 인력 투입 등을 계약상대자에게 요구하지 않았다.

[표] '23년~'25년 현장대리인 휴가 사용 현황

(단위 : 건)

구 분	계	●●지사	●●지사	■●지사	●●지사	◆◆지사	■■지사
휴가 횟수	181	28	33	21	38	37	24
대체근로 여부	미실시	×	×	×	×	×	×
감액실시 여부	미실시	×	×	×	×	×	×

자료 : 해당지사 제출자료 재구성

이처럼 과업지시서에 정해진 업무관리 및 감독 절차가 형식적으로 운영되고 있었으며, 일부 기간 동안 청소·미화 업무의 공백이 발생하는 등 용역관리의 적정성이 저해되고 있었다.

또한, 현행 과업지시서에는 일일업무일지 작성 의무, 현장대리인 지정 등 기본적인 사항만 규정되어 있을 뿐 현장대리인 부재 시 조치절차, 대체인력 운영기준, 업무공백 발생 시 보고체계, 과업 미이행 확인 방법 및 감액 조치 기준 등 현장에서 활용할 수 있는 세부기준은 구체적으로 마련되어 있지 않았다.

그 결과 감독원의 자의적 판단이나 지역별 상이한 업무처리가 발생할 우려가 있으며, 계약상대자의 과업 미이행에 대한 적절한 통제가 이루어지지 못하는 구조적 한계가 확인되었다.

관계기관 의견 및 검토결과 △▲처는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다. ●●지사는 사옥 시설관리용역 감독원 임명 알림 문서가 2025년에는 오지 않았고, 과거 일부 알림 문서(2022년, 2023년)에는 과업지시서가 첨부되지 않았기 때문에 인사이동 및 담당자 변경 시 해당 과업에 대해 정확히 알 수 없다고 주장하고 있다. 그러나 해당 용역의 감독원 임명은 본부에서 일방적으로 지정하는 것이 아니라 각 지사에서 직접 감독원을 임명한 후 그 결과를 본부에 보고하는 방식으로 운영되고 있었기 때문에 해당 지사는 감독업무 수행의 주체로서 감독원의 역할과 책임을 충분히 인식할 수 있는 위치에 있다. 또한, 본사는 매년 시설관리 용역 계약 체결에 앞서 각 본부·지사를 대상으로 과업지시서에 대한 수정의견을 조회하고 있으며, 별도의 의견이 없는 경우 기존 과업지시서를 그대로 적용하여 계약을 체결하고 있다. 따라서 해당 지사는 매년 과업지시서의 내용을 검토할 기회를 부여받고 있었고, 감독원 역시 과업지시서에 규정된 업무내용과 감독사항을 확인할 수 있었다. 따라서 위 주장은 본 건의 부적정성을 해소할 만한 정당한 사유로 보기 힘들다.

조치할 사항

●●·■□·●●·◆◆·■●·●●지사장은 앞으로 유사사태가 발생하지 않도록 용역 감독업무를 철저히 하시기 바랍니다.(기관주의)

△▲처장은 시설관리용역의 적정한 계약이행과 실효성 있는 관리·감독체계 확립을 위한 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

【 10 】

제 목 교육훈련비 정산업무 부적정

소 관 부 서 ○○지사

구 분 교육관리

내 용

1. 업무개요

○○지사는 명예퇴직자에 대한 맞춤형 교육을 통한 안정적인 퇴직 지원을 위해 전직지원 체험 교육과정을 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

“’22년 하반기 명예퇴직자 교육 실시(○○센터-4, 2023.01.04.)”에 따르면 ’22년 하반기 퇴직자는 ’23. 1. 1.부터 3. 1.까지 직원 본인이 사용한 금액에 한하여 200만 원 한도에서 전직 활동과 연계한 체험교육을 실시하고, 소속기관 담당자는 퇴직자가 제출한 증빙서류를 확인하여 경비를 정산 처리하도록 되어 있다.

또한, 퇴직자는 기존에 제출한 전직활동 계획과 다르게 실시할 사유가 발생할 경우 ‘변경전직활동 계획서’를 제출하고, 소속기관은 이를 검토·승인한 이후에 교육을 실시하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사는 명예퇴직자¹⁾의 전직체험교육을 실시하면서, 당초 제주도에서 베트남으로 교육장소를 변경하였음에도 불구하고 별도의 승인 절차를 거치지 않고

1) I, 2022. 12. 16. 퇴직

교육을 실시하였으며, 체험교육이 재취업, 창업, 생애설계 등 전직관련 분야의 체험과의 관련성이 있는지 판단하고 교육생이 제출한 증빙서류의 적격 여부를 심사 후 경비를 지원해야 하는데도 세부 사용내역에 대한 검토 없이 단지 여행사로부터 발급받은 지출증빙 현금영수증만을 근거로 200만 원 전액을 지원하였다.

그 결과 변경 교육에 대한 사전 검토 및 승인절차가 이루어지지 않았으며, 교육내용의 적정성 및 전직활동과의 관련성에 대한 충분한 검토 없이 교육비가 집행되어 예산집행의 적정성을 확인할 수 없게 되었다.

관계기관 등 의견 ○○지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○지사장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 교육비 지원 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

★★처장은 교육비 지원 업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○지사	0급	H	2023. 1. 20. ~ 2024. 2. 5.	△권리	■□처	주의
○○지사	0급	I	2020.12.22. ~ 2022.12.16.	◎	퇴직	-

시 정 요 구

【 11 】

제 목 신규건축물 취득세 등 제세공과금 납부업무 부적정

소 관 부 서 ○○본부

구 분 회계관리

내 용

1. 업무개요

○○본부는 2025. 12. 16. ◆●원 생태체험교육시설에 대하여 사용승인을 받고, [표 1]과 같이 교육시설 건물에 대하여 취득세 등 제세공과금 총 641,778천 원 상당액을 ●●시 △▽구청에 납부하였다.

[표 1] 취득세 등 제세공과금 납부현황

(단위 : 천 원)

납부일	과세표준액	취득세	취득세 감면 (녹색건축인증 등)	농어촌특별세	지방교육세	납부세액
2026. 1. 6.	23,840,185	667,525	-120,154	63,129	31,278	641,778

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「지방세법」 제6조(정의)에 따르면 취득세 과세 대상인 ‘취득’에는 유·무상의 모든 취득뿐만 아니라 토지의 지목을 사실상 변경¹⁾함으로써 그 가액이 증가한 경우도 포함되며, 같은 법 제11조(부동산 취득의 세율) 및 제12조(부동산 외 취득의 세율)에 따라 건축물의 원시취득²⁾의 경우 1천분의 28을, 사실상 토지지목변경은 1천분의 20의 취득세율을 적용하도록 되어 있다.

-
- 1) 지적공부(토지대장 등)상의 지목 변경뿐만 아니라, 공사 등을 통해 토지의 현황 및 용도가 변경되어 가액이 상승한 경우를 말함(예, 임야나 농지를 대지로 조성하기 위한 절토, 성토, 포장 공사 등)
- 2) 어떤 권리를 기존 권리와 관계없이 새로이 취득하는 것으로 타인의 권리에 근거하지 않고 독립하여 취득하는 경우로 건축물은 신축, 증축, 개축하는 경우가 해당

그리고 “공사명의 휴게소·사옥부지 지목변경에 따른 취득세 신고·납부방안(▶▶치-1151, 2010. 2. 16.)”에 따르면 공사 명의로 취득한 토지로서 형질변경에 따른 지목이 사실상 변경됨으로써 그 가액이 증가한 토지에 대해서는 사실상의 지목변경에 소요된 비용³⁾을 과세표준으로 하여 취득세를 신고·납부하도록 되어 있다.

따라서 ○○본부는 원시취득(건축물 신축) 부분과 사실상 토지지목변경에 해당하는 부분을 각각 구분하여 취득세를 산정하고 신고·납부하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부는 [표 2]와 같이 ◆●원 생태체험교육시설에 대한 취득세 납부 시 사실상 토지지목 변경이 수반되는 조경공사비 등 856,160천 원을 별도의 과세표준으로 산정하여야 하는데도, 건축물(원시취득) 과세표준에 포함하여 납부 세액을 산출하고 취득세 등 제세공과금을 정당세액⁴⁾ 대비 4,647천 원 상당 과다 신고·납부 하였다.

[표 2] 취득세 등 제세공과금 과오납부 현황

(단위 : 천 원)

구 분		기 납부세액(A) [원시취득]	정당세액(B)			차 액 (A-B)
			건축물 [본관동 등]	사실상 토지지목변경 [조경공사 등]	소 계	
과세표준액		23,840,185	22,984,024	856,160	23,840,185	-
제세 공과금	취 득 세	667,525	643,553	17,123	660,676	6,849
	취득세 감면 ^주	-120,154	-116,383	-	-116,383	-3,772
	지방교육세	31,278	30,155	-	30,155	1,123
	농어촌특별	63,128	60,970	1,712	62,683	446
납부세액		641,778	618,295	18,835	637,131	4,647

주 : 제로에너지 건축물(본관동)의 취득가액에 대한 감면율(18%) 적용

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○본부는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

3) 토목공사비(절·성토, 옹벽설치, 배수로공사, 포장공사), 조경공사비, 설계비, 감독비 등 형질변경과 관련된 일체의 비용
4) 사실상 토지지목변경 공사비를 구분하여 경정청구 시 추정 제세공과금으로 정당세액을 산정하였으나, 정확한 금액은 경정청구 후 과세기관(●●시 △▽구청)의 검토 절차를 거쳐 확정

조치할 사항 ◎◎본부장은 ■□처, ●◆처 등과 협의하여 신사옥 취득에 따른
취득세 등 제세공과금 신고내역을 재검토하시고, 과다납부한 세액 4,647천 원 상당액은
경정청구하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

【 12 】

제 목 이동식 CCTV 관리업무 부적정

소 관 부 서 ○○본부

구 분 자산관리

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 “유지보수 작업장 안전관리를 위한 이동식 CCTV 확대 운영 방안 (○○본부 ◆부-271, 2025. 2. 21.)”을 통해 관리구간 내 유지보수 현장 중 이동식 CCTV 의무적용 대상 공사의 설계 시 준공 후 우리공사에 반납하는 조건¹⁾으로 이동식 CCTV 구매 비용을 반영(예정가 2,200천 원/대, VAT 제외)하도록 하였으며,이에 따라 위 본부(관할 지사 포함)가 2025년 의무적용 대상 공사 설계에 이동식 CCTV 구입비를 반영한 현황은 [표]와 같다.

[표] 이동식 CCTV 공사 설계 시 반영 현황

구분	공사명	구입 방법	대수(대)	회수 여부
	합계(대)		15	12
1	2025년 ○○본부 관내 포장유지보수공사	설계 반영	2	○
2	2025년 ○○본부 관내 도로시설 개량공사	"	1	○
3	2025년 ○○본부 관내 구조물종합공사(1권역, 2권역)	"	2	○
4	2025년 ○○본부 관내 아스콘 교면재포장 등 구조물 종합공사	"	1	○
5	ㄱ선 8.7k ㄱㄱ교(대전) 본선교 전면개축공사	"	1	○
6	ㄴ선 126.03k ㄱㄴ교(천안) 본선교 전면개축공사	"	1	○
7	2025년 ○○본부 관내 콘크리트 교면재포장(조강)공사	"	1	○
8	2025~2026년 ●●지사 관내 시설물 연간유지보수공사	"	1	x(시행중)
9	2024~2025년 ■■지사 관내 시설물 연간유지보수공사	"	1	○
10	2025~2026년 ○●지사 관내 시설물 연간유지보수공사	"	1	x(시행중)
11	2025~2026년 ◆◆지사 관내 시설물 연간유지보수공사	"	1	x(시행중)
12	2024~2025년 ■●지사 관내 시설물 연간유지보수공사	"	1	○
13	2024~2025년 ●●지사 관내 시설물 연간유지보수공사	"	1	○

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

1) ●■처는 “이동식 CCTV 확대 적용 방안”(●■처-1414, 2024. 6. 26.)을 통해 이동식 CCTV가 최초 투입되는 공사의 설계 반영하고, 준공 후 회수하여 신규 공사에 배치하도록 하였음

한편 위 본부는 〇〇건설사업단으로부터 건설현장 관제용 CCTV 소요 조회
요청²⁾을 받고 회신을 통해 [그림]과 같이 2026. 4월경 이동식 CCTV 45대(거치
형 43대, 궤도형 2대)와 부속장치 2세트(모니터와 PC)를 전달받고 〇〇지사 자재창
고에 보관하고 있다.

[그림] 〇〇건설사업단으로부터 전달받은 물품 사진



자료 : 〇〇본부 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「물품관리에규」 제34조(부외자산의 분류)에 따르면 기증받은 물품이거나 도로
자산에 포함하여 취득한 물품으로서 도로시설물 또는 건물에 정착되지 아니하여
분리되는 물품이거나 그 밖에 개별 관리하는 것이 효율적이라고 인정되는 물품 중
취득가액이 50만 원 이상이고 내구성이 1년 이상인 기계, 기구, 비품은 부외자산으로
분류하여 관리³⁾하도록 있다.

따라서 〇〇본부는 손망실 방지 및 효율적 관리를 위해 공사 준공 후 계약상대
업체로부터 회수한 이동식 CCTV 12대와 〇〇건설사업단으로부터 전달받은 이동

2) “건설현장 관제용 CCTV 소요 조회(〇〇건설사업단 〇〇부-172, 2026. 3. 24.)”에 따라 〇〇건설사업단은 〇〇건설사업단
이 건설공사 준공 후 업체로부터 회수하여 보관하고 있던 이동식 CCTV 및 부속장치에 대해 소요 조회를 통해 필
요한 기관에 전달하였음

3) 「물품관리에규」 제37조(소모성 비품의 관리, 운용 등)에 따르면 소관부서의 장은 부외자산의 적정한 관리를 위
해 ‘소모성비품대장’을 작성·비치하여야 하고, 소모성비품을 취득하였을 때에는 그 자산을 취득 또는 인수한 소
관부서의 장이 소모성비품 대장에 등재한 후 운용부서에 배정조서를 송부하여야 하며, 소관부서로부터 소모성비품
을 배정받은 운용부서의 장은 소모성비품 운용대장을 비치 관리하도록 되어 있으며, 실무적으로는 업무포탈상
재무정보 내 자산관리시스템을 통해 이루어지고 있음

식 CCTV 45대(거치형 43대, 궤도형 2대) 및 부속장치 2세트(모니터와 PC)를 「물품관리예규」에 따라 ‘기증받은 물품’ 또는 ‘도로자산에 포함하여 취득한 물품으로서 도로시설물 또는 건물에 정착되지 아니하여 분리되는 물품이거나 그 밖에 개별관리하는 것이 효율적이라고 인정되는 물품’에 준하여 부외자산으로 분류하여 관리하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부는 계약상대업체와 ●●건설사업단으로부터 회수 또는 전달받은 이동식 CCTV(총 57대)와 부속장치(2세트)에 대해 부외자산으로 별도 등록하지 않아 물품 운용 부서와 보관 또는 비치(공사) 장소 현황관리, 물품 사용 및 반납통제 등이 이루어지지 않고 있었다.

그 결과 이동식 CCTV 및 부속장치 관리 부실로 물품 분실 또는 손망실이 우려되는 실정이다.

관계기관 의견 ○○본부는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 자산의 손망실 방지 및 효율적 관리를 위해 공사 준공 후 업체로부터 회수한 이동식 CCTV 12대와 ●●건설사업단으로부터 전달받은 이동식 CCTV 45대(거치형 43대, 궤도형 2대) 및 부속장치 2세트(모니터와 PC)를 부외자산으로 등록하여 관리하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

【 13 】

제 목 벤치조형물 설치 예산 사용 및 자산관리 업무 부적정

소 관 부 서 ○○본부

구 분 회계관리

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 고속도로 건설로 훼손된 자연환경 복구를 위한 수목을 생산·공급하고 식물의 보존, 증식, 보급 자생식물에 관한 연구를 수행하기 위해 ◆●원을 운영·관리하고 있으며, ◆●원 진입광장 신규 조성에 따라 2024. 12. 24. [표]와 같이 제작·구매 계약을 체결하여 2025. 1. 4. [그림]과 같이 전면 광장부에 벤치 조형물을 설치하였다.

[표] 계약 현황

(단위 : 천 원)

계약 명	계약상대자	계약금액	사용예산
◆●원 진입광장 디자인 벤치조형물 제작·구매	주식회사	18,658	도로보수비-기타조경관리

자료 : 전자조달시스템에서 해당 정보 발췌

[그림] 벤치조형물 설치 모습



자료 : 감사자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

“2024년도 예산집행지침(▽처, 2024년 2월)”의 ‘5. 수선유지비·도로보수비·교통안전비’ 및 <별첨 1> ‘자본적 지출과 수익적 지출의 구분기준’에 따르면 자본적 지출은 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 증가시키는 지출(신규 또는 추가 시설비)로서 도로개량건설, 유·무형자산 등으로 사업계획 반영 후 집행을 원칙으로 하고, 수익적 지출은 자산의 원상을 회복시키거나 능률 유지를 위한 지출(시설물 보완 또는 보수비)로서 수선유지비, 도로보수비 등 손익계산서상의 비용항목으로 집행하도록 되어 있다.

그리고 「회계관리시행세칙」 제63조(유형 및 무형자산의 범위) 및 제64조(감가상각)에 따르면 비유동자산 중 부동산 및 취득가액이 자산단위별로 100만 원을 초과하는 동산은 관리¹⁾하여야 하고, 감가상각²⁾을 통해 비용처리 하도록 되어 있다.

따라서 ○○본부는 ◆●원 전면 광장부의 벤치조형물 신설·설치비가 자본적 지출에 해당하여 사업계획에 반영 후 집행하고, 설치가 완료되면 자산으로 등록하여 관리³⁾하며, 감가상각을 통해 비용처리 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부는 벤치조형물 설치비가 유형자산 신규 취득으로 자본적 지출에 해당하는데도 도로보수비 예산으로 집행하여 지출 즉시 전액 당기 비용 처리하였으며, ‘재무정보시스템’ 내 ‘자산관리’ 메뉴에 ‘부외자산’으로도 별도 등록하지 않아 전산 시스템을 통한 체계적 자산관리가 이루어지지 않고 있다.

1) 「물품관리예규」 제11조(물품수급관리계획서의 작성)부터 제25조(처분물품의 정리)까지 물품의 취득 및 관리, 불용 관련 절차가 규정되어 있으며, 실무적으로는 ‘재무정보시스템’ 내 ‘자산관리’를 통해 자산 취득, 전환, 처분, 변경, 감가상각, 현황관리 등이 이루어지고 있음

2) 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액을 감가상각 대상 금액으로 하며, 내용연수에 따라 체계적으로 배분

3) 건물과 분리되어 부동산에 고정되어 있는 독립된 시설물로서 ‘구축물’로 보는 것이 타당하다고 판단됨

그 결과 자산으로 기록되어야 할 금액이 비용으로 빠져 공사 자산 총계가 과소 계상되고 지출 금액이 전액 비용 처리되어 당기순이익이 과소 계상되는 등 재무제표에 왜곡을 초래하였으며, 신규 설치한 벤치 조형물에 대해 별도 자산등록을 하지 않아 손망실 등 관리 부실이 우려되는 실정이다.

관계기관 등 의견 ○○본부는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 ◆●원 진입광장에 신규 설치한 벤치 조형물에 대해 부외자산으로 등록하여 관리하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 자본적 지출에 해당하는데도 도로보수비로 벤치 조형물을 신규 설치하여 재무제표에 왜곡을 초래한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○본부	0급	J	2024. 2.27. ~ 현 재	◆	○○본부	주의

경 고 요 구

【 14 】

제 목 토양오염 복원공사 중 발생한 추가공사 설계변경 부적정
소 관 부 서 ○○본부
구 분 설계관리
내 용

1. 업무개요

○○본부는 2024. 11. 21. (주)○○종합환경건설(이하 “계약상대자”)과 계약(계약 금액 1,025,290천 원)을 맺고 2026. 12. 15. 준공예정으로 “ㄱ포(서울) 주유소 토양오염 복원공사”를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「엔지니어링산업진흥법」 제2조(정의) 및 제21조(엔지니어링사업자의 신고 등)에 따르면 사업에 관한 설계 등 엔지니어링활동은 기술인력 등 일정한 요건을 갖추고 산업통상자원부장관에게 신고한 엔지니어링사업자가 하도록 되어 있다.

한편, 「취업규정」 제5조(성실복무의 의무)에 따르면 직원은 관계법령 및 공사의 제규정을 준수하며 부여된 업무를 성실히 수행하도록 되어 있다.

따라서 위 본부는 공사 시행 중 추가 설계가 필요할 때에는 엔지니어링 사업자에게 설계를 수행하도록 하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부는 위 공사를 시행하면서 2025. 5월경 추가 토양오염이 확인¹⁾

1) ○○본부는 추가 토양오염 및 오염부지 내 지하수위가 확인됨에 따라 오염확산 방지를 위한 차수벽 공사, 흙막이 가시설 공사 등이 필요하여 추가 설계가 필요하다고 판단함

되어 ‘토양정화 추가 설계’를 별도 용역으로 발주해야 하는데도 17,000천 원 상당의 설계비를 [표]와 같이 엔지니어링사업 자격이 없는 위 공사의 계약상대자에게 설계하게 하는 등 설계변경²⁾ 업무를 부적정하게 수행하였다.

[표] 설계용역 시행 현황

구분	시행방법		용역비(천 원)	비고
	정 당	시 행		
토양정화 추가 설계	공사와 분리발주	도급 내역 반영	17,000	

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○본부는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 ★★처장은 설계변경 업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○본부	0급	K	2025. 2. 27. ~ 현재	●담당	○○본부	경고

2) 실제 설계용역은 엔지니어링사업자(♠♠엔지니어링)가 수행한 것으로 확인됨

시 정 요 구

【 15 】

제 목 노후 주유시설 개선공사 부적정

소 관 부 서 ○○본부

구 분 유지관리

내 용

1. 업무개요

○○본부는 2024. 7. 11. 3개소의 노후 주유소 토양환경 개선을 위해 ▣▣건설(주)와 계약(계약금액 : 1,870,065천 원)을 맺고 “ㄱ(목포)주유소 등 3개소¹⁾ 노후 주유시설 개선공사”를 시행하여 같은 해 12. 17. 준공하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「휴게시설 업무기준」 제17조(주유소 운영관리)에 따르면 실행부서의 장은 주유소에서 차량용 편의시설(셀프장비)을 상시 이용이 가능하도록 관리되고 있는지 확인하여야 한다.

또한, 위 공사 특별시방서(공통사항)에 따르면 도급자는 본 공사로 인하여 공사장 어느 부분에도 손상을 입혀서는 안되며, 공사수행상 부득이 손상을 입혔을 때에는 감독원의 승인을 얻은 후 시공하고 손상부분은 도급자 부담으로 원상복구 하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부는 위 공사를 시행하면서 [그림]과 같이 ㄱ(서울)주유소의 고객편의시설을 철거하고 원상복구하지 않았는데도 12. 17. 그대로 준공처리하였다.

1) ㄱ(서울)주유소, ㄱ(목포)주유소, ㄱ(서울)주유소

[그림] 주유소 편의시설 사진



자료 : ○○본부 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○본부는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 계약상대자 부담으로 크츠(서울)주유소 내 차량용 편의시설(셀프장비)을 고객이 상시 사용할 수 있도록 복구하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

【 16 】

제 목 직원 음주사고 예방업무 부적정
 소 관 부 서 ●●·■□·●●·◆◆·■□·●●지사
 구 분 교통관리
 내 용

1. 업무개요

●●지사 등 6개 지사¹⁾는 보유 장비를 운행하는 직원들의 음주운전 사고 예방 등 안전사고 예방대책 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

“직원 음주사고 예방 강화방안(◆◆처-3974, 2020. 8. 31.)” 및 “제설 임차장비 및 기간제 운전원 음주예방 강화방안 알림(◆◆처-5619, 2025. 12. 5.)”에 따르면 운전원은 근무 시작 전 1회 음주측정을 해야 하는 등 [표 1]과 같이 공사 소유 차량 등을 운전하고자 하는 직원은 측정기준에 따라 의무적으로 전자식 음주 측정장비²⁾를 통해 음주측정을 하도록 되어 있다.

[표 1] 음주측정 대상자 및 측정기준

음주측정 대상자	측정시기 및 횟수	비 고
운전원	근무 시작 전 1회	-
안전순찰원	근무 시작 전·후 각 1회	평일 야간, 휴일 관리자가 없는 시간 음주관리가 취약하여 근무 후 추가 측정
제설 임차장비 운전원	근무 시작 전·후 각 1회	
제설 기간제 운전원	근무 시작 전·후 각 1회	
기타직원(운전시)	차량 시동키 수령 전 1회	-

자료 : “제설 임차장비 및 기간제 운전원 음주예방 강화방안 알림(◆◆처-5619, 2025. 12. 5.)” 내용 재구성

1) ●●지사, ■□지사, ●●지사, ◆◆지사, ■□지사, ●●지사

2) 본인인증(지문인식) 후 음주측정을 하면 측정영상 및 측정결과가 저장되어 관리자가 수시 점검이 가능한 장비

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 음주측정 실태를 조사한 결과, ○○지사는 운전원의 경우 정당 141회 보다 130회 적은 11회(8%)만 음주여부를 측정하는데도 아무런 조치를 하지 않는 등 [표 2]와 같이 6개 지사의 음주측정 대상자가 기준보다 부족하게 음주 측정을 하고 있는 등 직원 음주사고 예방 업무를 소홀히 하고 있다.

[표 2] 음주측정 실태 조사 결과(2026. 1. 1 ~ 2026. 3. 31.)

(단위 : 회, %)

대 상	음주여부 측정 현황 【측정 횟수/정당 횟수(측정률)】					
	계	운전원	안전순찰원	제설임차 운전원	제설 기간제 운전원	기타직원
계	14,590/24,303(60%)	574/1,208(48%)	10,317/12,288(84%)	2,311/5,933(39%)	1,064/2,411(44%)	324/2,463(13%)
○○	2,482/4,197(59%)	11/141(8%)	1,953/2,131(92%)	447/1,350(33%)	66/430(15%)	5/145(3%)
□□	2,109/4,848(44%)	117/171(68%)	1,243/2,174(57%)	547/1,048(52%)	202/788(26%)	0/667(0%)
●●	2,996/4,124(73%)	187/265(71%)	1,933/1,987(97%)	336/840(40%)	360/460(78%)	180/572(31%)
◆◆	1,934/2,925(66%)	66/198(33%)	1,442/1,852(78%)	185/455/(41%)	192/199(96%)	49/221(22%)
□●	1,968/4,067(48%)	67/233(29%)	1,715/2,044(84%)	162/1,064(15%)	2/106(2%)	22/620(4%)
●●	3,101/4,142(75%)	126/200(63%)	2,031/2,100(97%)	162/1,064(15%)	242/428(57%)	68/238(29%)

자료 : ○○·□□·●●·◆◆·□●·●●지사 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○·□□·●●·◆◆·□●·●●지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 ○○·□□·●●·◆◆·□●·●●지사장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 직원 음주사고 예방 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(기관주의)

경고요구 및 통보

【 17 】

제 목 기술개발제품 염수분사장치 설치 부적정

소 관 부 서 ○●지사

구 분 시공관리

내 용

1. 업무 개요

○●지사는 ○기IC부터 ○나JCT까지 ㄷ선 83.98km(ㄷ선 2.05km 포함) 구간의 고속도로 유지관리 업무를 수행하고 있으며, 결빙 취약 구간인 ㄷ선 126.5k~127.7.k(대전 방향) 구간에 제설 능력 향상과 교통사고 예방을 위하여 [표]와 같이 구매계약을 체결하고 기술개발제품(혁신제품)으로 염수분사장치인 ‘도로관리용 제설용액분사 통합시스템(이하, “통합시스템”) 2기를 설치하였다.

[표] 구매 계약 현황

(단위 : 천 원)

계약명	계약상대자	계약금액	계약기간	계약방법
○●지사 관내 염수분사장치 구매(설치 포함)	주식회사 ○○	247,910	2025. 10. 1. ~ 2025. 11. 29.	수의계약 (기술개발제품)

자료 : 전자조달시스템에서 해당 정보 발체

2. 관계 규정 및 판단기준

“○●지사 관내 염수분사장치 구매(설치 포함)” 계약의 시방서 중 ‘기술개발제품 규격’에 따르면 ‘통합시스템’은 [그림]과 같이 저장탱크, 분사장치, 적외선 CCTV, 제어판넬장치, 중앙관제시스템 등으로 구성되어 있으며, 인증 기술은 제설현장에 설치된 다수의 염수분사장치를 인터넷에 연결된 IP 카메라로 모니터링하여 원격 서버에서 통합 관리하는 기술에 관한 것으로 되어 있다.

[그림] 통합시스템 구성도 및 주요 기능

구성도	주요기능
 The diagram illustrates the system architecture. At the top, a '원격관리' (Remote Management) section shows a computer and a mobile device connected to a '통합관리시스템' (Integrated Management System). This system is linked via 'LoRa 통신망' (LoRa Network) to a '제어판넬장치' (Control Panel Device). The control panel is connected to a 'CCTV' camera and a '수동작동장치' (Manual Operation Device). The manual device is further connected to a '제어기' (Controller) and a '모터' (Motor). The motor is shown in a '살포' (Spreading) state, with a '살포상태' (Spreading Status) indicator. A '살포량' (Spreading Amount) is also indicated.	- CCTV로 전송된 현장 상황을 중앙관제시스템에서 감시 - 원격제어로 제어설비장치의 모터 기동스위치 ON - CCTV를 통해 살포 상태 모니터링 및 제어

자료 : 기술개발제품 규격서 내용 중 발췌

따라서 ○○지사는 계약상대자가 기술개발제품 규격대로 통합시스템을 설치하고 CCTV를 통한 현장 상황 감시 및 살포상태 모니터링, 원격제어 등 인증 기술이 구현되는지 관리·감독하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사는 계약상대업체가 기술개발제품 규격과는 달리 적외선 CCTV 설치 없이 제어판넬장치만 우리공사 LoRa망에 연결하여 원격제어 기능만 구현되도록 통합시스템을 설치하였는데도 그대로 준공 처리하였다.

그 결과 계약 관리 및 감독 부실로 기술개발제품 주요 인증 기술인 중앙관제시스템에서 CCTV를 통한 현장 상황 감시와 살포 상태 모니터링 등의 기능을 활용할 수 없는 결과를 초래하였다.

관계기관 의견 ○○지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

●●지사장은 규격과 다르게 설치된 해당 기술개발제품에 대한 처리 대책을 강구하시기 바랍니다.(통보)

★★처장은 기술개발제품 구매·설치 시 규격과 달리 설치되어 주요 인증 기술이 구현되지 않는데도 준공 처리하는 등 계약관리 및 감독업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
●●지사	0급	L	2025. 2. 3 ~ 현재	△부장	●●지사	경고
●●지사	0급	M	2025. 2.27. ~ 현재	☆담당	●●지사	경고

시 정 요 구

【 18 】

제 목 교통사고 체험관 조성 자산편입 및 비용처리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

구 분 자산관리

내 용

1. 업무 개요

○○지사는 고속도로 교통사고 예방을 위해 교통안전 홍보·캠페인 업무 등을 수행하고 있으며, 고속도로 이용고객의 안전 의식 향상을 위해 2025. 6. 24. 주식회사 ☐☐와 [표]와 같이 공사계약을 체결하고 ㄱ휴게소 내 환승센터를 리모델링하여 교통사고 체험관을 조성하는 사업을 시행하였다.

[표] 계약 현황

공사명	계약금액	착공년월일	준공년월일	계약방법
교통사고 체험관 설치 공사	43,667,800	2025. 6. 24.	2025. 8. 12.	수익계약(여성기업)

자료 : 전자조달시스템 내 해당 정보 발체

2. 관계 규정 및 판단기준

「법인세법」 제23조(감가상각비의 손불금산입) 및 같은 법 「시행령」 제31조(즉시상각의 의제)에 따르면 법인이 각 사업연도의 결산을 확정할 때 건물에 대한 감가상각비를 해당 사업연도의 소득금액을 산정할 때 손금에 산입하고, 해당 건물의 용도를 변경하기 위한 개조 등 자본적 지출로서 해당 건물의 내용연수를 연장시키거나 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비를 해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 감가상각비로 계상한 것으로 보아 상각범위액을 계산하도록 되어 있다.

또한, 「법인세법」 제72조(자산의 취득가액 등)에 따르면 법인이 보유하는 건물에 대해 해당 건물의 내용연수를 연장시키거나 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 수선하는 등 자본적 지출이 있는 경우 그 금액을 가산하여 취득가액을 산정하도록 되어 있다.

한편, 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제9조(재료비)에 따르면 ‘직접재료비’는 계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 주요재료비와 부분품비로 구분되고, ‘간접재료비’는 계약목적물의 실체를 형성하지 않으나 제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 소모재료비, 소모공구, 포장재료비 등으로 구분된다고 되어 있다.

따라서 ○○지사는 기존 휴게소 내 환승센터를 리모델링하여 교통사고 체험관을 설치한 경우 자본적 지출에 해당하여 공사비 등 비용을 건물의 취득원가에 합산하고 해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 감가상각비로 계상한 것으로 보아 상각 범위액을 계산하며, 체험관 내 비치하는 교통사고 VR체험기와 벽걸이 TV 등 기계 장비 또는 비품 등은 리모델링 공사의 재료비에 계상하지 않고 기계장치(또는 공구와 기구/비품)로 별도 예산을 배정받아 구매 및 자산 편입 후 감가상각을 통해 자산의 가치 감소분을 비용으로 처리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사는 2025. 6. 23. 교통사고 체험관 설치공사 소요 예산 49,766천 원 상당을 건물 계정이 아닌 구축물 계정으로 예산 합의¹⁾한 후 리모델링 사업을 추진 하였고, 공사 설계 시 VR체험기 1대(8,200천 원)와 TV 3대(3,280천 원)를 기타 공사에 주요 재료비로 계상하여 공사비에 포함하였으며, 공사 완료 후에는 공사비를 기준

1) 교통사고 체험관 설치 공사 시행(○○지사 ▷부-646, 2025. 6. 23.)

건물의 취득가액에 합산하지 않고 구축물로 별도 자산 편입하여 구축물 내용연수에 따라 감가상각을 통해 비용처리 하고 있었다.

그 결과 하나의 건물본체와 리모델링(구축물)을 별도 자산 등록하고 VR체험기와 TV 구매 비용을 리모델링 공사비에 포함하여 구축물로 함께 자산 편입하는 등 자산 분류 오류로 인해 내용연수 적용의 왜곡과 자산관리의 복잡성을 초래하였고, VR 체험기와 TV의 경우 물품 관리 부실로 인한 손망실 등이 우려되는 실정이다.

관계기관 의견 ○○지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○지사는 교통사고 체험관 내 비치되어 있는 VR체험기와 TV(3대)에 대해 손망실 방지 및 효율적 관리를 위해 부외자산으로 등록하여 관리하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 자산분류 오류로 인해 내용연수 적용의 왜곡과 자산관리의 복잡성을 초래한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○지사	0급	N	2023. 4. 10. ~ 2025. 2. 2.	◇	○○지사	주의

시 정 요 구

【 19 】

제 목 가로등 통신요금 납부 업무처리 부적정

소 관 부 서 ◆◆·●●지사

구 분 유지관리

내 용

1. 업무개요

◆◆지사 등 2개 지사는 관내 LED 가로등의 운영·관리를 위해 [표 1]과 같이 계약을 맺고 “가로등 제어기 프로그램 변경작업 용역”을 시행하였다.

[표 1] 가로등 제어기 프로그램 변경작업 용역 계약 현황

(단위 : 천 원)

지사	계 약 건 명	계약금액	계약일자	준공일	계약상대자	비 고
◆◆	◆◆지사 가로등 제어기 프로그램 변경작업 용역	13,915	'24. 8. 9.	'24. 10. 7.	(주)☒○	수의
●●	가로등 디밍제어기 통신프로그램 변경 용역	13,086	'24. 8. 26.	'24. 10. 24.	(주)☒☿	수의

자료 : ◆◆·●●지사 제출자료 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

“IoT 기술기반 스마트 가로등 구축 계획(●◆처-1299, 2023. 4. 17.)”에 따르면 스마트 가로등 운영플랫폼을 구축하여 기존 외부망(♠♠ 등)에서 자체 통신망으로 전환하여 가로등 원격관리시스템을 외부망인 이동통신망에서 자체 통신망인 LoRA망¹⁾으로 전환하고 IoT 기술을 활용하여 기후환경 및 교통상황을 반영한 스마트 가로등 표준화 및 확대 방안을 마련하였다.

또한, ○○본부는 “IoT 기술기반 스마트 가로등 구축사업 위임시행 지시”(○○○

1) 사물간 실시간 통신이 가능한 저전력 장거리 통신방식

본부 ♣팀-653, 2024. 4. 5.)를 통해 프로그램(LoRA망) 변경 및 가로등별 위치정보화(GPS) 작업을 관내 지사에 위임하였다.

따라서 위 지사들은 위 용역을 시행하여 스마트 가로등을 LoRA망으로 전환 완료하고 사용하지 않는 기존 이동통신망은 해지하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆지사 등 2개 지사는 위 용역을 준공하여 가로등 원격관리시스템을 LoRA망으로 전환 완료하였으나, 기존 이동통신망(♠♠텔레콤)을 해지하지 않아 납부하지 않아도 되는 통신료를 [표 2]와 같이 2024. 11월부터 감사일 현재까지 납부하고 있었다.

[표 2] 가로등 통신비 납부내역

(단위 : 천 원)

지사	매월 납부금액	누적 납부금액	비고
◆◆	89	1,515	'24. 11. ~ '26. 3.
●●	107	1,814	'24. 11. ~ '26. 3.

자료 : ◆◆●●지사 제출자료 재구성

관계기관 의견 ◆◆·●●지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆◆·●●지사장은 현재 사용하지 않고 있는 가로등 원격관리 이동통신망을 즉시 해지하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 유지관리 업무를 소홀히 한 다음 관련자에게 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
◆◆지사	0급	O	2023. 1. 30. ~ 2026. 2. 2.	☯	▣●지사	주의
●●지사	0급	P	2021. 1. 27. ~ 현재	☯	●●지사	주의

시 정 요 구

【 20 】

제 목 산업안전보건관리비 정산 부적정

소 관 부 서 ■■■·◆◆지사

구 분 계약관리

내 용

1. 업무개요

■■■지사 등 2개 지사는 관내 가로등의 효율적인 운영·관리를 위해 [표 1]과 같이 계약을 맺고 “가로등 위치정보화 작업용역”을 시행하였다.

[표 1] 가로등 위치정보화 작업 용역 계약 현황

(단위 : 천 원)

지사	계 약 건 명	계약금액	계약일자	준공일	계약상대자	비 고
■■■	가로등 위치정보화 작업 용역	13,261	'24. 6. 20.	'24. 8. 14.	(주)◎★	수의계약
◆◆	가로등 위치정보화 작업 용역	12,739	'24. 6. 12.	'24. 9. 6.	(주)■■◆	수의계약

자료 : ■■■·◆◆지사 제출자료 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등), 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시, 2022. 6.) 제3조(적용범위) 및 제8조(사용금액의 감액·반환 등)에 따르면 건설공사 발주자가 도급계약을 체결할 때는 총 공사금액 2천만 원 이상의 공사에 대하여 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상하여야 하고, 발주자는 수급인의 산업안전보건관리비의 사용내역을 확인하고 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다고 되어 있다.

그리고 “도급사업 안전보건 관리비용 적용기준 수립(●■처-288, 2023. 2. 9.)”에 따르면 안전보건 관리비용 계상기준이 없는 공사·용역·구매 사업에 대해서도 안전보건 관리비용을 산정하고 실비 정산하도록 되어 있다.

따라서 위 지사들은 산업안전보건관리비가 포함된 견적을 통해 소액 수의계약을 체결한 경우와 같이 총 공사금액 2천만 원 미만인 공사 등에 대해서도 산업안전보건관리비를 정산하여야 하며, 정산 시 사용내역과 증빙서류 등을 면밀히 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사들은 위 계약과 관련하여 [표 2]와 같이 산업안전보건관리비를 포함하여 설계하였고, 준공 시 계약상대자가 계약체결 이전에 발행한 세금계산서를 산업안전보건관리비 집행의 증빙서류로 제출하였으나 확인·정산 처리하지 않고 계약 당시 금액을 그대로 지급하였다.

[표 2] 산업안전보건관리비 정산내역

(단위 : 원)

지사	계약시 산업안전보건 관리비 금액	작성일	품목	공급자 (사업자번호)	세금계산서 금액	국세청 발급일 ¹⁾
■□	273,769	2024. 5. 1.	안전화 외	★♠종합공구 (317-05-*****)	184,800	2024. 5. 31.
		2024. 5. 11.	안전화 외	★♠종합공구 (317-05-*****)	184,800	2024. 5. 31.
		2024. 5. 21.	안전화 외	★♠종합공구 (317-05-*****)	203,280	2024. 5. 31.
		2024. 5. 31.	안전화 외	★♠종합공구 (317-05-*****)	178,200	2024. 5. 31.
◆◆	263,024	2024. 5. 31.	안전화 외	★♠종합공구 (317-05-*****)	396,000	2024. 5. 31.

자료 : ■□·◆◆지사 제출자료 재구성

관계기관 의견 ■□·◆◆지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

1) 국세청 홈택스(<http://hometax.go.kr>)에서 제3자 발급사실 조회 및 수정 발급사실 일괄조회 하였음.

조치할 사항

▣▣・◆◆지사장은 정산하지 않고 지급된 산업안전보건관리비 각 273,769원, 263,024원을 환수 조치하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 계약업무를 소홀히 한 다음 관련자에게 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
▣▣지사	0급	Q	2024. 2. 6. ~ 현재	☯	▣▣지사	주의
◆◆지사	0급	R	2023. 1. 30. ~ 2026. 2. 2.	☯	▣●지사	주의

경고요구 및 통보

【 21 】

제 목 CCTV 설치공사 준공 처리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

구 분 계약관리

내 용

1. 업무개요

○○지사는 2025. 9. 17. 지사 내 방범을 위해 (주)★☒과 계약(계약금액 : 18,620천 원)을 맺고 “지사 내 방범용 CCTV 설치공사”를 시행하여 같은 해 10. 6. 준공하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「공사계약 일반조건」 제2조(정의)에 따르면 설계서는 공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 물량내역서를 말하고 있고, 계약업무 담당자는 계약체결 의뢰 시 설계설명서(공사시방서)와 물량내역서(공내역서 등)로 구성하여 작성하고, 준공검사 시에는 공사시방서대로 완료되었는지를 확인해야 한다.

따라서 위 지사는 위 공사 추진 시에는 해당 설계설명서와 물량내역서에 따라 공사를 수행하고 준공검사 후 준공처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사는 위 공사에 중소기업자간 경쟁제품인 감시용카메라 CCTV를 4대 설치하면서 [표]의 사양비교와 같이 위 계약상대자가 직접생산하는 CCTV

(모델명 : BRMN-B52805X-BN)가 있음에도 불구하고 기존 영상 저장장치와의 호환성의 사유로 (주)♠♣의 CCTV(모델명 : DC-T3642HRXT)를 설치하였다.

또한, 이 CCTV 규격은 공사시방서에 누락되어 있고 설계서에 최소한의 규격¹⁾만 정의되어 있으나, 설계서 상 요구 규격인 광학 4배율 이상을 만족하지 않은 제품이 설치되었음에도 별도의 확인 없이 그대로 준공처리 하였다.

[표] 제조사별 CCTV 사양비교

구 분	(주)★☒ BRMN-B52805X-BN	(주)♠♣ DC-T3642HRXT
이미지		
화소수	500만	200만
배 율	5배율	12배 디지털줌 ²⁾
공공기관 보안 성능품질 인증	O	O
가 격	81만원(조달청 단가)	약 43만원

자료 : ○○지사 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○지사장은 규격과 다르게 설치된 해당 제품에 대한 처리 대책을 강구하시기 바랍니다.(통보)

1) 설계서 요구사항 : 고정형, 200만 화소, 4배율 이상 / 설계가격 80만원/대(부가세 제외)

2) 이미지의 일부분을 강제로 늘려서 크게 보여주는 방식

★★처장은 계약업무를 소홀히 한 다음 관련자에게 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
●●지사	0급	S	2025. 2. 27. ~ 2026. 2. 2.	☞	■●지사	경고

주의요구 및 통보

【 22 】

제 목 스마트 공사관리 앱 사용자 관리 부적정

소 관 부 서 ◆◆처, □□지사

구 분 유지관리

내 용

1. 업무개요

◆◆처는 2019년부터 작업장 실시간 관리를 위해 [그림]과 같이 모바일 기반 작업장 정보관리시스템인 스마트 공사관리 앱¹⁾을 총괄하고 있고, □□지사는 이 앱을 통해 관내 공사 현장의 교통차단 업무를 수행하고 있다.

[그림] 스마트 공사관리 앱



자료 : ◆◆처 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치) 및 동법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치 기준 등)에 따르면 건설기술인(현장대리인)은 1인 1현장 배치이며, 특정 요건을 충족하고 발주자의 승낙을 얻은 경우에 한해 예외적으로 중복 배치가 허용된다.

1) ◆◆처는 “작업장 위험정보 실시간 관리시스템 구축”(◆♣처-1155, 2019. 3. 18.)을 시행하여 One-Stop 공사관리를 위해 모바일 앱 기반 작업장 공사관리시스템을 구축하여 5개 기관을 대상으로 시범운영하였고, ◆◆처는 “실시간 작업장 관리등을 위한 스마트 공사관리시스템 확대 시행”(◆◆처-11, 2020. 1. 2.)하여 전기관으로 확대 운영하였음.

또한, 「개인정보 보호법」 제3조(개인정보 보호원칙)에 따르면 개인정보처리자는 개인정보를 정확하고 최신의 상태로 유지·관리하여야 하며, 처리 목적에 필요한 범위에서 적정하게 관리하여야 한다.

특히, 행정정보 및 정보시스템은 그 신뢰성과 정확성을 확보할 수 있도록 일관성 있게 관리되어야 하고, 정보시스템에서 사용하는 계정은 대상과 명확히 대응되도록 유일성이 확보되어야 하며, 이를 통해 업무처리의 정확성 및 책임소재의 명확성을 담보하여야 한다.


한편, 위 처는 “실시간 작업장 관리²⁾를 위한 「스마트 공사관리시스템」 확대 시행(◆◆처-11, 2020. 1. 2.)”을 통해 현장대리인 등이 위 앱을 설치해 활용토록 하였으며, 원클릭 시스템을 통해 현장대리인의 전화번호, 업체명, 담당자명을 등록 후 앱에 로그인하여 사용토록 하였다.

따라서 건설기술인은 1인 1현장 배치하고 현장이 중복되지 않도록 관리하여야 하며, 개인정보 접근권한 관리 및 하나의 아이디에 복수의 업체 정보가 혼재되어 관리되지 않도록 하여 내부통제 및 책임추적이 가능하도록 정보시스템을 운영해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 ■■지사에서 시행한 “2023년 ■■지사 나들목 교통안전시설 개선공사³⁾”의 스마트 공사관리 앱을 통해 입력된 교통차단 내역을 조사한 결과

2) 작업장 차단정보 등록 및 정보제공 흐름도



3) 계약기간 : 2023. 10. 6. ~ 11. 2., 계약금액 : 40,460천 원, 계약상대자 : ■■■글로벌㈜

[표 1]과 같이 010-2615-xxxx 휴대전화 번호 사용자⁴⁾가 3건의 교통차단 내역을 등록하여 ■■지사의 승인을 받았으나 계약상대자인 ■■■글로벌(주) 1건과 위 공사와 계약관계가 없는 (주)■■■■디자인이 2건을 등록하였어도 확인 없이 승인한 것으로 확인되었다.

[표 1] 2023년 ■■지사 나들목 교통안전시설 개선공사 교통차단 내역

등록일시	공사기간	방향	공사구간	연장	차단차로	인원및장비	업체(연락처)	서비스 구분
2023/10/17 10:29	2023/10/18 09:00 ~2023/10/18 18:00	양방향	93km ~ 139km ○IC-○IC~ 지사경계-○IC	46.0	2차로중 갓길	(주공중) 인원 3명, 사인카 2대, 작업차 2대 (다공중)인원4 명,작업차1대	■■■글로벌 주식회사 (010-2615-xxxx) ⁵⁾	모바일
2023/10/24 09:43	2023/10/25 09:00 ~2023/10/25 18:00	양방향	93km ~ 139km ○IC-○IC~ 지사경계-○IC	46.0	2차로중 이동차단 , 갓길	인원 3명, 사 인카 2대, 작 업차 2대	주식회사 ■■■■디자인 (010-2615-xxxx)	모바일
2023/10/25 10:48	2023/10/26 09:00 ~2023/10/26 18:00	양방향	93km ~ 139km ○IC-○IC~ 지사경계-○IC	46.0	2차로중 이동차단 , 갓길	인원 3명, 사 인카 2대, 작 업차 2대	주식회사 ■■■■디자인 (010-2615-xxxx)	모바일

자료 : ■■지사 제출자료 재구성

그리고 위 휴대전화 번호로 등록된 스마트 정보관리 앱 외부 사용자를 조회한 결과 [별표 1] “스마트 공사관리 앱 사용자 등록현황”과 같이 하나의 휴대전화에 다수의 타 업체로 등록되는 등 지사별로 상이하게 관리하고 있음이 확인되었다.

또한 위 앱에 등록된 전체 외부 사용자 현황을 조사해 본 결과 [표 2]와 같이 8,401건 중 2,976건(35.4%)이 한 대의 휴대전화 번호에 다수 업체로 중복되어 있고, [별표 2] “스마트 공사관리 앱 외부 사용자 오류 등록현황 예시”와 같이 업체명에 소속기관, 직위, 공백 등이 등록되는 등 전체 등록번호의 25.6%가 등록 오류가 있는 것으로 확인되었다.

- 4) 스마트 공사관리 앱의 외부 사용자 아이디는 휴대전화 번호이고, 지사 담당자가 원클릭 교통관리를 통해 등록·수정하고 있음.
- 5) 휴대전화 요금 청구서, 재직증명서, 법인등기부등본을 확인해 본 결과 휴대전화 소유자는 ■■■글로벌(주) 소속 직원으로 확인됨.

[표 2] 스마트 공사관리 앱 외부 사용자 등록 현황

구분	전체 휴대전화 번호 등록	등록오류	1개사 등록	2개사 등록	3개사 등록	4개사 이상 등록
건수	8,401	2,227	3,198	976	500	1,500

자료 : ◆■처 제출자료 재구성

관계기관 의견 ◆◆처와 ■■지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆◆처장은 ◆■처와 협의하여 현재 등록된 스마트 공사관리 앱 외부 사용자 휴대전화 번호가 중복되지 않도록 정리하고 외부 사용자 신규 등록 시 오류 및 중복이 발생하지 않도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.(통보)

■■지사장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 교통차단 내역 승인업무를 철저히 하시기 바랍니다.

★★처장은 교통차단 내역 승인업무를 소홀히 한 다음 관련자에게 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
■■지사	0급	T	2023. 3. 27. ~ 2025. 2. 25.	△	○○본부	주의
■■지사	0급	U	2023. 1. 30. ~ 2025. 2. 22.	●	○○본부	주의

[별표 1] 스마트 공사관리 앱 사용자(010-2615-XXXX) 등록현황

그룹	본부명	지사명	소속	이름	직급	사용 여부
행복나눔 사회적협동조합	◆■본부	○◆지사	행복나눔 사회적협동조합	AL	팀장	N
글로벌	◆■본부	○◆지사	글로벌	AL	팀장	N
♣♣	◆■본부	○◆지사	♣♣	AL	이사	N
행복나눔 사회적협동조합	◆■본부	○◆지사	행복나눔 사회적협동조합	AL	팀장	N
♣♣	◆■본부	○◆지사	♣♣	AL	이사	Y
글로벌(주)	◆○본부	◆■지사	글로벌(주)	AL	소장	Y
글로벌(주)	◆■본부	◆○지사	글로벌(주)	AL	이사	Y
(주)♣♣	■◆본부	○■지사	(주)♣♣	AM	대표	Y
글로벌	○○본부	■○지사	글로벌	AM	실장	Y
	○■본부	○■지사		AM	-	Y
(주)글로벌	◆■본부	○◆지사	(주)글로벌	AM	실장	Y
	■◆본부	▼○지사		AM	실장	Y
글로벌주식회사	■○본부	▽◆지사	글로벌주식회사	AM	부장	Y
☆	○○본부	●○지사	☆	AM	실장	Y
(주)	○■본부	▲◆지사	(주)	AM	실장	Y
글로벌(주)	○●본부	△□지사	글로벌(주)	AM	실장	Y
주식회사 (주)	○○본부	■■지사	주식회사 디자인	AM	실장	Y
글로벌(주)	■○본부	■▲지사	글로벌(주)	AM	실장	Y
보호작업장	■○본부	□▽지사	보호작업장	AM	소장	Y
글로벌 주식회사	■○본부	◆▼지사	글로벌 주식회사	AM	실장	Y
글로벌	○■본부	◇◁지사	글로벌	AM	대리	Y
글로벌	◆○본부	○◁지사	글로벌	AM	실장	Y
조합 나눔공동체	■◆본부	●▷지사	조합 나눔공동체	AM	실장	N
행복나눔 사회적협동조합	◆■본부	◆○지사	행복나눔 사회적협동조합	AM	실장	Y
글로벌(주)	◆●본부	○▶지사	글로벌(주)	AM	실장	Y
글로벌	○■본부	★♠지사	-	AM	대표	Y
(주)	○■본부	★♡지사	(주)	AM	대표	N
(주)디자인	○●본부	☆♡지사	(주)디자인	AM	실장	Y
글로벌	■◆본부	♣♣지사	글로벌	AM	실장	Y
글로벌	◆■본부	♣♣지사	글로벌	AM	실장	Y
(주)디자인	■◆본부	♣♣지사	(주)디자인	AM	실장	Y
글로벌주식회사	◆■본부	♣♣지사	글로벌 주식회사	AN	차장	Y
글로벌(주)	◆●본부	■■지사	글로벌(주)	AN	차장	Y
글로벌	◆●본부	■○지사	글로벌	AN	차장	Y
디자인	◆■본부	○◆지사	디자인	AN	차장	Y
	◆■본부	○◆지사		AM	상장	Y

자료 : ◆■처 제출자료 재구성

[별표 2] 스마트 공사관리 앱 외부 사용자 오류 등록현황 예시

휴대폰번호	업체명	직원명
010-9856-AAAA	대리	AO
010-2449-BBBB	-	AP
010-2954-CCCC	●◎지사 △부	AQ
010-6230-DDDD	-	(주)◎♠
010-4720-EEEE	0	AR
010-8538-FFFF	1	AS
010-4344-GGGG	4	AT
010-8556-HHHH	대리 현장대리인	AU
010-3647-IIII	현장대리인	AW
010-5235-JJJJ	차장(현장대리인)	AX
010-6414-KKKK	대리	♠△엔지니어링
010-9354-LLLL	사원	AY
010-3652-MMMM		AZ 실장
010-5273-NNNN		
010-5485-OOOO	(주)◎♠	-
010-2211-PPPP	▣★건설	010-2211-****
010-2437-QQQQ	.	.
010-7270-RRRR	과장	BA ☒♣테크
010-4034-SSSS	♣♠이엔씨	
010-8855-TTTT	▣●본부	BB

자료 : ◆■처 제출자료 재구성

시 정 요 구

【 23 】

제 목 터널 진입부 안전운전 유도시스템 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

구 분 유지관리

내 용

1. 업무 개요

○○지사는 ㄴ선 49.31km 구간(○ㄹIC~○ㅂIC)과 ◆■선 41.5km 구간(○ㅅIC~○○IC)의 고속도로 및 시설물 유지관리 업무를 수행하고 있으며, 사고위험 구간을 개선하고자 [표]와 같이 제조·구매(설치포함) 계약을 체결하여 2023. 12. 29. [그림 1]과 같은 규격과 성능을 가진 안전운전 유도시스템(LED 20세트)을 ㅂㅂ터널 진입부(순천 방향)에 설치하였다.


[표] 계약 현황

(단위 : 천 원)

계약 명	계약상대자	계약체결일	준공일	계약금액
ㅂㅂ터널 진입부 안전운전 유도시스템 제조·구매(설치 포함)	주식회사 ■■■■	2023.12.11.	2023.12.29.	174,790

자료 : 전자조달시스템에서 해당 정보 발체

[그림 1] 안전운전 유도시스템 구성도 및 주요 기능

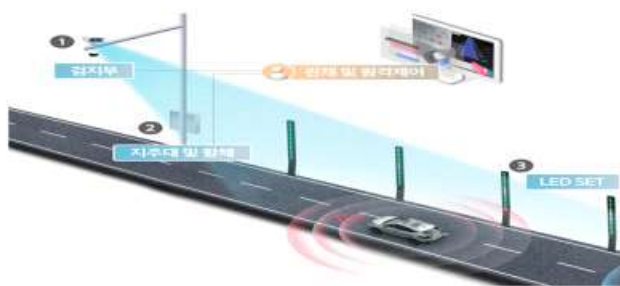구성도	주요 기능
	- 검지부에서 운행중인 차량들 속도를 검지하여 함체로 전송 - 수신된 데이터로 교통흐름을 분석하여 교통상황(원활/서행/정체)을 파악 - 상황에 맞는 패턴(안전/경고/경고 강화)을 LED 디스플레이에 표출 - 후속 차량에 정보전달 및 교통사고 예방

자료 : 스마트도로플랫폼 기술마켓에 계약 상대 업체가 등록한 신기술설명서 중 해당 부분 발체

한편, 위 지사는 2025. 10. 29. ●■지사에서 ◆■선 준공에 따른 관리 구간 조정으로 기존 관리 구간인 ㅇㅈIC~ㅇㅊIC까지 9.42km 구간을 ●■지사로 이관하기 위해 이관구간 현황, 영업소 현황, 토지현황, 시설물 현황이 포함된 사무인계인수서를 작성¹⁾하고 인수인계의 효력이 같은 해 11. 3.부터 발생하는 것으로 약정하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「사무인계인수 업무기준(2022. 10. 1. 개정)」 제3조(작성방법)에 따르면 사무인계인수서 작성 시 주요 물품, 예산 및 비밀문서 목록 등 인계인수 사항(단, 계약, 공사, 토지보상, 설계 등의 경우 주요 문서 목록 포함), 기타 인계인수에 필요한 사항 등을 포함하여 작성하도록 되어 있다.

그리고 「도로관리규정」 제42조(유지관리 및 관리자의 지정)에 따르면 지역책임자 및 구간책임자는 정보통신설비의 점검 및 관리계획을 수립·시행하여 정보통신설비의 성능이 정상적으로 유지될 수 있도록 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 ●●지사는 ㅇㅋIC~ㅇㅌIC까지 9.42km 구간을 ●■지사로 이관하기 위한 사무인계인수서 작성 시 안전운전 유도시스템을 포함하고 해당 설비의 성능이 정상 작동될 수 있도록 유지관리에 필요한 서류를 이관하는 등 조치하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●지사는 사무인계인수서 작성 시 정보통신 시설 현황에 안전운전 유도시스템을 누락하고 해당 설비의 유지관리에 필요한 서류도 이관하지 않아 ●■지사의 정보통신업무 담당자가 ㅂㅂ터널 진입부(순천 방향)에 안전운전 유도시스템이

1) 관리구간 조정에 따른 인수인계서 작성 알림(●●본부 ◀부-2179, 2025. 10. 27.)

설치가 되어 있다는 사실조차 인지하지 못하는 등 해당 설비의 유지관리가 업무 이관 후 전혀 이루어지고 있지 않은 실정이었다.

실제로 이번 감사 기간 중인 2026. 4. 16. ㅂㅂ터널 진입부에 설치되어 있는 안전운전 유도시스템 현장을 점검한 결과 해당 시스템의 핵심 기능인 ‘상황에 맞는 패턴(안전, 경고, 경고 강화) LED 디스플레이 표출’이 [그림 2]와 같이 작동하지 않는 등 유지관리 공백으로 인해 위 시스템이 고장 난 채로 방치²⁾되어 있었다.

[그림 2] 안전 상황 시 LED 정당 표출 모습과 현재 표출 상황



관계기관 등 의견 ●●지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●●지사장은 ㅂㅂ터널 진입부에 설치된 안전운전 유도시스템이 정상 작동될 수 있도록 유지관리에 필요한 서류를 ●▣지사에 이관하는 등 업무인계 조치하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 사무인계 업무 소홀로 안전운전 유도시스템 유지관리에 공백을 초래한 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

2) ●●지사는 2026. 4. 17. 설치업체에게 정비를 의뢰하여 같은 해 5. 21. 완료하였음

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
●●지사	0급	V	2023. 1.30. ~ 현재	▼	●●지사	주의
●●지사	0급	W	2025. 2. 3.~2026. 1. 18.	▼부 총괄	■●지사	주의

통 보

【 24 】

제 목 길어깨 이정표 설치 방안 마련 필요

소 관 부 서 △△처

구 분 유지관리

내 용


1. 업무개요

△△처는 고속도로 길어깨 이정표에 대한 계획수립 및 유지관리 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

“길어깨 이정표 확대시행 방안(△△처-3741, 2017. 11. 2.)”에 따르면 신속한 위치 파악 및 거리정보 제공 편리성 향상을 위하여 [표 1]과 같이 유지관리 중인 노선의 길어깨 이정표 설치간격을 200m에서 100m로 기준을 변경하면서 다차로구간(편도3·4·5차로) 및 사고다발구간에는 2018년에 시행하고, 편도 2차로구간에는 2019년 이후에 시행하도록 하였다.

[표 1] 길어깨 이정표 설치 기준

구분	이전 기준	변경 기준
이정표	 (40cm×40cm)	 (40cm×40cm)
설치간격	200m 간격	100m 간격
최종 설치간격		

자료 : “길어깨 이정표 확대시행 방안(△△처-3741, 2017. 11. 2.)” 내용 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△처는 2017년 길어깨 이정표 설치간격을 200m에서 100m로 기준을 수립하였으나 금번 2026년 ○○본부 종합감사 중 ●●지사 등 6개 지사 길어깨 이정표 설치 현황을 조사한 결과, ●●지사의 경우 총 관리연장 91km 중 2025년에 개통한 ㅇ표IC~ㅇㅎIC구간(42km)을 제외한 ㄱㄱIC~ㄱㄴIC 구간(49km, 편도 2차로)에는 길어깨 이정표를 100m 간격으로 조정하지 않는 등 [표 2]와 같이 6개 지사 425km 구간(편도 2차로 구간) 길어깨 이정표를 기존 200m 간격 그대로 두고 있어 설치 방안 마련이 필요한 실정이다.

[표 2] 길어깨 이정표 설치 현황

기관명	관리연장	이정표 설치 현황		비 고
		100m간격(정당)	200m간격(기존)	
계	501km	76km	425km	
●●지사	91km	42km (ㄱㄷIC~ㄱㄹIC, 신설노선)	49km (ㄱㅋIC~ㄱㅌIC, 2차로구간)	
■■지사	86km	-	86km (ㄱ표IC~ㄱㅎIC, 2차로구간)	
○●지사	82km	2km (ㄱㅍIC~ㄱㅊJCT, 2차로구간)	80km (ㄱㄱIC~ㄱㄴIC, 2차로구간)	
◆◆지사	68km	18km (ㄱㅅIC~ㄱㅇJCT, 3·4차로구간)	50km (ㄱㄷIC~ㄱㄹIC, 2차로구간) (ㄱㅍJCT~ㄱㅊJCT, 2차로구간) (ㄱㅅJCT~ㄱㅇJCT, 2차로구간)	
■○지사	95km	14km (ㄱㅈIC~ㄱㅊJCT, 신설노선)	81km (ㄱㅈIC~ㄱㅊJCT, 2차로구간) (ㄱㅋIC~ㄱㅌJCT, 2차로구간)	
●○지사	79km	-	79km (ㄱㅌIC~ㄱㅎIC, 2차로구간)	

자료 : ●●·■·○●·◆·■·○●지사 제출자료 재구성

관계기관 의견 △△처는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 △△처장은 편도 2차로구간 길어깨 이정표 설치 방안을 수립하여 추진하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

【 25 】

제 목	시설물 연간유지보수공사 설계 부적정
소 관 부 서	●●지사
구 분	설계관리
내 용	

1. 업무개요

●●지사는 2024. 12. 23. ☒■중합건설(주)(이하, “계약상대자”)와 계약(계약금액 2, 690,686천 원)을 맺고 2026. 12. 준공예정으로 “2025~2026년 ●●지사 관내 시설물 연간 유지보수공사”를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제19조(설계도서의 작성)에 따르면 설계시행부서의 장은 표준 품셈 또는 실적공사비, 지방서(표준, 전문) 및 제반기준에 의하여 설계도서를 작성 하도록 되어 있다.

그리고 “건설공사 표준품셈” 1-8-10(가드레일 설치)에 따르면 지주 및 판 설치 품셈에 2.5ton 트럭이 반영되어 있고, 해당 트럭은 자재와 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용하도록 되어 있다.

따라서 위 지사는 시설물 유지보수공사 설계를 시행할 때 불필요한 항목이 중복 반영되지 않도록 하여 예산낭비 요인을 최소화하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사는 ‘ㄷ선 188.6k 등 3개소 중분대 가드레일 개량공사’의 경우 지주 및 판 설치 품셈에 2.5ton 트럭이 반영되어 있는데도 작업차량(2.5톤) 비용 3,780천 원(작업일수 6일)을 내역에 추가 계상¹⁾하는 등 [표]와 같이 2개의 공사건에 대한 공사비 5,355천 원 상당액을 중복 계상하고 과다 지급하였다.

[표] 작업차량 중복 반영에 따른 공사비 과다계상 및 지급 현황

(단위 : 일, 천 원)

공 종	항목	단가	설 계[A]		정 당[B]		증·감[B-A]	지급일자
			수량	금액	수량	금액		
계							△5,355	
188.6k 등 3개소 중분대 가드레일 개량	작업차량	630	6.0	3,780	-	-	△3,780	2025.09.09.
177.5k(대전) 등 6개소 사고복구	작업차량	630	2.5	1,575	-	-	△1,575	2025.09.09. 2025.11.11.

자료 : ○○지사 제출자료 재구성

관계기관 등 의견 ○○지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○지사장은 과다하게 지급된 공사비 5,355천 원 상당액을 계약상대자로부터 환수하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 설계 및 기성 업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○지사	0급	Y	2025. 3. 16. ~ 현재	♠	○○지사	주의
○○지사	0급	Z	2024. 2. 6. ~ 2025. 3. 15.	♠	◆◆지사	주의

1) 현장여건상 별도의 작업차량이 필요하거나 투입되지 않은 것으로 확인

시 정 요 구

【 26 】

제 목 포장 유지보수공사 설계 및 공사관리 부적정

소 관 부 서 ■○지사

구 분 유지관리

내 용

1. 업무개요

■○지사는 2023. 2. 6. (유)♠건설회사(이하, “계약상대자”)과 계약(계약금액 2,470,300 천 원)을 맺고 “2023년 ■○지사 관내 포장 연간 유지보수공사”를 시행하여 같은 해 12. 31. 준공하는 등 [표 1]과 같이 2건의 포장 연간유지보수공사를 시행·준공하였다.

[표 1] ■○지사 포장연간유지보수 공사 현황

(단위 : 천 원)

계약건명	계약상대자	계약기간	계약금액	비 고
2023년 ■○지사 관내 포장 연간유지보수공사	유한회사 ♠건설회사	2023. 2. 6.~2023.12.31.	2,470,300	
2024년 ■○지사 관내 포장 연간유지보수공사	유한회사 ♠건설회사	2024. 1. 4.~2024.12.31.	2,412,780	

자료 : ■○지사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 및 「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 예정가격 작성 시 표준품셈에 정해진 물량 등을 과잉 계상하지 않도록 해야하며, 시공방법의 변경 등 설계변경으로 공사량 증감이 발생하는 경우에는 계약 금액을 조정하도록 되어 있다.

그리고 「유지보수공사 수량산출기준(△△처, 2022년)」에 따르면 노면절삭면 시·종점 모따기¹⁾는 아스팔트 포장을 절단하기 위해 시종점 컷팅하는 수량을 연장 또는 개소로 산출하도록 되어 있다.

따라서 위 지사는 노면절삭면 모따기를 시행할 때는 설계 수량이 과잉 계상되지 않도록 해야하며, 정산할 때는 실제 공사 시행 여부를 확인 후 정산하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■●지사는 2024년 ㄱ~ㄴ선 21.5k 등 8개소 아스팔트 포장 절삭덧씌우기의 경우 설계시 시·종점부 모따기 수량을 정당 81m보다 2,034m가 더 많은 2,115m로 잘못 적용하여 공사비 10,569천 원 상당액을 과다 계상하였을 뿐만 아니라, 준공시 정산하지 않고 계약상대자에게 과다 지급하는 등 [표 2]와 같이 총 5개 공사의 시·종점부 모따기 공정에 대한 공사비 37,563천 원 상당액을 과다 지급하였다.

[표 2] 포장 유지보수 공사 시종점부 모따기 공사비 현황

(단위 : m, 천 원)

구 분	공 종	단가	수 량		공사비		증·감[B-A]	지급일자
			정당	설계	정당[B]	설계[A]		
	계						△37,563	
2024	ㄱ~ㄴ선 21.5k 등 8개소 아스팔트 포장 절삭 덧씌우기	5,196	81	2,115	421	10,990	△10,569	2024.06.11. 2024.12.31.
	ㄴ~ㅇ선 23.4k 절삭 덧씌우기	5,196	21	445	107	2,310	△2,203	2024.12.31.
	표표 IC교 접속부 아스팔트 포장	5,196	70	265	361	1,376	△1,014	2024.06.11.
2023	ㄴ~ㅇ선 41.6k 등 5개소 중분대 열화부 정비	5,023	28	4,258	143	21,389	△21,246	2024.12.29.
	ㄱIC교 등 3개소 접속부 아스팔트 포장	5,023	90	594	450	2,981	△2,531	2023.06.27.

자료 : ■●지사 제출자료 재구성

1) 포장 유지보수공사 시 필요한 절삭 경계면의 단부를 비스듬하게 깎아 단차 발생을 줄이고, 포장 내구성과 주행 안전성을 높이는 작업

관계기관 등 의견 ■●지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■●지사장은 과다 지급한 공사비 37,563천 원 상당액을 환수²⁾ 조치하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 설계 및 준공(기성) 업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
■●지사	0급	AA	2023. 1. 30. ~ 2025. 2. 26.	▶차장	●●지사	경고
■●지사	0급	AB	2023. 1. 30. ~ 2025. 2. 26.	◇담당	■●지사	경고

2) “2023년 ■●지사 관내 포장 연간유지보수공사” 등 2개 공사의 계약상대자는 2026. 4. 9. 과다 지급된 공사대금 환수에 관한 확약서를 ■●지사로 제출하였고, 2026. 4. 30. 환수완료

경 고 요 구

【 27 】

제 목 차선도색공사 하자관리 업무 부적정

소 관 부 서 ◆◆지사

구 분 유지관리

내 용

1. 업무개요

◆◆지사는 2023. 8. 3. (유)♣기업(이하, “계약상대자”)과 계약(계약금액 895,340 천 원)을 맺고 “2023년 ◆◆지사 관내 차선도색공사”를 시행¹⁾하여 같은 해 12. 15. 준공하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

“차선도색 시행(개선) 방안(◆◆처-1351, 2023. 4. 5.)”에 따르면 5종 우천형 도로 휘도 측정값은 건조노면 상태의 경우 설치 시 500mcd/(m²·lux) 이상을 확보하여야 하는 등 [표 1]과 같이 설치 및 준공 후 경과 시점에 따라 일정 휘도 기준을 만족하여야 한다고 되어 있다.

[표 1] 5종 우천형 도로(백색) 휘도 기준

(단위 : mcd/(m²·lux))

건조노면 상태			젖은노면 상태	
설치시	준공 후 1년	준공 후 2년	설치시	준공 후 2년
500 이상	300 이상	150 이상	175 이상	100 이상

자료 : “차선도색 시행(개선) 방안(◆◆처-1351, 2023. 4. 5.)” 내용 재구성

1) ◆◆지사 관리구간 67.98km 중 32.03km를 시행

그리고 “도로관리규정” 제68조(하자검사 및 보고) 및 공사 시방서 4.(품질 및 하자관리)에 따르면 하자검사 시 차선도색 휘도 측정²⁾은 IC(JCT)구간 단위로 시행하며, 해당구간 전체 측정개소의 90% 이상이 휘도 기준을 만족하여야 하며, 그렇지 않을 경우 계약상대자에게 통보³⁾하여 하자의 보수가 시행될 수 있도록 조치하여야 한다고 되어 있다.

따라서 위 지사는 차선도색공사 준공 후 경과 시점에 따라 차선도색 휘도를 측정하여, 휘도 기준을 만족하지 않는 구간에 대해서는 계약상대자에게 통보하여 하자 보수가 시행될 수 있도록 조치하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 금번 감사기간 중 ◆◆지사가 2025. 4월 실시한 정기 하자검사 확인 결과, ◆◆지사는 ㄱ지선 ㄱㄱIC~ㄱㄱJCT 구간(◆◆방향)의 경우 구분선 휘도 기준 만족률이 76%로 하자 대상으로 분류⁴⁾되는데도 하자처리를 하지 않는⁵⁾ 등 [별표] “5종 우천형 도로 휘도측정 결과”와 같이 총 30개 구간 중 7개 구간의 휘도 기준이 만족하지 않는데도 하자처리를 하지 않고 있다.

그리고 하자담보책임기간⁶⁾(하자만료일 2025. 12. 20.) 중인 2025. 5. 27. “2025년 ◆◆지사 관내 차선도색 공사⁷⁾”에 휘도 기준을 만족하지 않는 7개 구간을 포함해 신규 발주⁸⁾하였다.

2) 우리공사에서 보유한 ‘이동식 차선반사도 측정기’를 이용하여 차선의 휘도 측정

3) 계약상대자가 이의 제기시는 계약상대자 부담으로 ‘포터블 휘도측정기’로 측정할 수 있음.

4) 준공 후 1년이 되는 시점은 '24. 12월 이나 '24년 하반기 하자검사를 1년이 경과되지 않은 시점('24. 10월)에 시행하여 '25. 4월 시행한 하자검사 자료를 대상으로 준공 후 2년 휘도기준(150mcd/(m²·lux))으로 하자 대상 분류

5) 공사시방서에는 전체 측정개소 중 90% 이상이 휘도 기준을 만족하여야 한다고 되어 있으나, 이를 측정값이 휘도 기준의 90%인 값을 만족하면 된다고 오인하여 하자처리를 하지 않았다고 진술함 (2025. 4. 3. 구두 통화)

6) 2023년 차선도색공사 하자담보책임기간 : 2023. 12. 21. ~ 2025. 12. 20.(실 공사기간 : '23. 9. 5. ~ '23. 12. 8.)

7) 2025년 차선도색공사 공사기간 : 2025. 5. 27. ~ 2025. 9. 24.(실 공사기간 : 2025. 6. 26. ~ 2025. 9. 12.)

8) 제설기간 이전에 차선도색을 완료하기 위하여 차선도색 공사기간을 고려, 5월에 발주 (2025. 4. 3. 구두 통화)

관계기관 의견 ◆◆지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 ★★처장은 차선도색공사 하자관리 등 업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
◆◆지사	0급	AC	2025. 2. 27. ~ 2026. 2. 2.	◇담당	●●지사	경고

[별표] 5종 우천형 도로 휘도측정 결과9)

구간	이정	방향	차선종류	측정개소	만족개소	만족률(%)	비고
코디IC~코리JCT (ㄱ지선)	0.0~5.5k (5.5km)	논산	중앙선	55	51	92	양호
			구분선	55	42	76	하자
			갓길선	55	47	85	하자
		대전	중앙선	55	52	95	양호
			구분선	55	48	87	하자
			갓길선	55	50	91	양호
코로JCT~코비IC (ㄴ선)	183.8~194.2k (10.4km)	천안	중앙선	104	104	100	양호
			구분선	104	93	90	양호
			갓길선	104	95	91	양호
		순천	중앙선	104	104	100	양호
			구분선	104	99	95	양호
			갓길선	104	85	82	하자
코시IC~코오JCT (ㄴ선)	177.2~183.8k (6.6km)	천안	중앙선	66	66	100	양호
			구분선	66	65	98	양호
			갓길선	66	62	94	양호
		순천	중앙선	66	65	98	양호
			구분선	66	57	86	하자
			갓길선	66	60	91	양호
코조JCT~코치IC (ㄹ지선)	0.0~7.6k (7.6km)	장수	중앙선	76	74	97	양호
			구분선	76	65	86	하자
			갓길선	76	69	91	양호
		익산	중앙선	76	75	99	양호
			구분선	76	70	92	양호
			갓길선	76	69	91	양호
코치IC~코표JCT (ㄹ지선)	7.6~9.53k (1.93km)	장수	중앙선	19	18	95	양호
			구분선	19	15	79	하자
			갓길선	19	19	100	양호
		익산	중앙선	19	19	100	양호
			구분선	19	18	95	양호
			갓길선	19	18	95	양호

자료 : ◆◆지사 제출자료 재구성

9) 차선도색 휘도 측정일자 - 중앙선·구분선('25. 4. 15.), 갓길선('25. 4. 17.)

시 정 요 구

【 28 】

제 목 구조물 점검업무 부적정

소 관 부 서 ●●지사

구 분 유지관리

내 용

1. 업무개요

●●지사는 시고속도로 트기나들목~트나들목 구간 1교(목포방향) 등 173개소의 교량 관리 및 점검 업무를 담당하고 있다.

2. 구조물 부재별 상태등급 산정 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부, 2025)」 제9조(정기 안전점검 수행방법)에 따르면 정기 안전점검¹⁾은 세심한 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하도록 되어 있다.

한편, 「제3종 시설물 안전등급 평가 매뉴얼(국토교통부, 2024.)」 제4장(정기안전점검 항목 평가방법)에 따르면 교량 거더의 경우 균열이 없거나 미세균열(균열폭 <0.1mm) 발생시 a(우수)등급을 부여하는 등 [표 1]과 같이 부재의 결함도에 따라 다른 상태등급(a~e등급)을 부여하도록 되어 있다.

1) 모든 교량을 대상으로 상태등급에 따라 다른 점검주기로 지사에서 시행(1,2,3종 교량의 A,B,C급 : 1회/반기, 1,2,3종 교량의 D,E급 : 3회/1년, 기타 교량 : 1회/1년)

[표 1] 부재의 결함도에 따른 상태등급 부여 기준

구분	a (우수)	b (양호)	c (보통)	d (미흡)	e (불량)
거더/바닥판	- 균열 없음 - 미세균열 발생 (폭 < 0.1mm)	- 균열 발생 (폭 : 0.1~0.3mm) - 표면손상면적 (2% 미만)	- 균열 발생 (폭 : 0.3~0.5mm) - 표면손상면적 (2~10% 미만)	- 균열 발생 (폭 : 0.5~1.0mm) - 표면손상면적 (10% 이상)	- 균열 발생 (폭 > 1.0mm) - 균열 면적률 (20% 이상)
교각/교대	- 균열 발생 (폭 < 0.1mm) - 변형, 부식 없음	- 균열 발생 (폭 : 0.1~0.3mm) - 표면손상면적 (2% 미만)	- 균열 발생 (폭 : 0.3~0.5mm) - 표면손상면적 (2~10% 미만)	- 균열 발생 (폭 : 0.5~1.0mm) - 표면손상면적 (10% 이상)	- 균열 발생 (폭 > 1.0mm) - 부등침하 발생
난간/연석	손상 없음	균열 발생 (폭 < 0.3mm)	- 균열 발생 (폭 ≥ 0.3mm) - 파손 및 탈락 (10% 미만)	전반적인 파손 (즉시 보수 필요)	-
기타시설 (방음벽)	손상 없음	- 손상 발생 - 사용성 문제 없음	- 사용성 문제 있음 - 보수 필요	- 긴급보수 필요 - 전도 위험 발생	- 비규격 설치 - 훼손 심함

자료 : 「제3종 시설물 안전등급 평가 매뉴얼(국토교통부, 2024.)」 내용 재구성

따라서 위 지사는 시설물의 정기 안전점검 시 세심한 외관조사를 실시하여 부재의 결함도에 따른 상태등급을 적절하게 산정하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 금번 감사기간 중 ○○지사가 실시한 2025년 하반기 3종 교량 정기 안전점검 보고서 확인 결과²⁾, ○○지사는 [표 2]와 같이 ㄱ口1교(서울방향) 교대 (A1)의 경우 점검기록과 다르게 상태등급³⁾이 정당 c(보통)가 아닌 b(양호)로 평가하는⁴⁾ 등 [별표] “2025년 하반기 3종 교량 정기 안전점검 보고서 적정성 검토 결과”와 같이 13개 교량 27개 부재의 상태 등급을 잘못 평가하였다.

2) 2025년 하반기 정기 안전점검 보고서와 점검 당시 점검사진, 점검 기록 등을 비교하여 시설물 상태에 따라 적절하게 상태등급 및 안전등급을 부여하였는지 확인 함

3) 부재의 균열 폭, 표면 손상면적, 파손 및 탈락 등에 따라 부재별로 산정되는 등급(a~e등급)

4) 점검 기록 및 사진에는 균열(폭 0.3mm 이상) 발생, 박리 등이 명기되어 있어 c등급에 해당 되나 부재 상태등급 산정시에는 b등급으로 반영함

[표 2] 2025년 하반기 ㄱ로1교(서울) 정기 안전점검보고서 적정성 검토 결과

교량명	부 재	상태등급		전체 결함도 지수		
		정당	평가	정당 [A]	평가 [B]	증,(△)감 [B-A]
ㄱ로1교(서울)	교대 (A1)	c	b	7.63	8.11	0.48
	중앙분리대(S1)	c	b			

자료 : 적정성 검토 결과 재구성

3. 구조물 안전등급 산정 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

「제3종 시설물 안전등급 평가 매뉴얼(국토교통부, 2024.)」 제1장(일반사항)에 따르면 안전등급⁵⁾은 부재별로 산정된 상태등급에 가중치를 적용하여 종합적으로 산출하며, A등급의 경우 문제점이 없는 최상의 상태로 별도의 조치가 필요 없는 시설로 규정하는 등 [표 3]과 같이 안전등급에 따라 시설물의 상태 및 조치 기준을 정하여 이행하도록 하고 있다.

[표 3] 시설물 안전등급 상태 및 조치기준

안전등급	상 태	조치기준
A등급	▪ 문제점이 없는 최상의 상태	▪ 이상이 없는 시설
B등급	▪ 보조 부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장 없으나, 내구성 증진을 위해 보수가 필요한 상태	▪ 지속적 관찰이 필요한 시설
C등급	▪ 주요 부재에 경미한 결함 또는 보조 부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 보수·보강이 필요한 상태	▪ 보수·보강이 이행 되어야 할 시설로서 현재 결함 상태가 지속될 경우 주요부재의 결함을 유발할 우려가 있는 시설
D등급	▪ 주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용 제한 여부를 결정해야 하는 상태	▪ 조속히 보수·보강시 기능 회복 가능한 시설 ▪ 보수·보강 이행 시까지 결함의 진행상태를 수치적 계측관리가 필요한 시설 ▪ 결함사항 진전 우려시 안전조치 검토가 필요한 시설
E등급	▪ 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위험이 있어 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	▪ 적기 유지보수를 하지 못하는 경우 철거, 재설치 하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설 ▪ 붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급조치와 사용제한·금지조치가 필요한 시설

자료 : 「제3종 시설물 안전등급 평가 매뉴얼(국토교통부, 2024.)」 내용 재구성

5) A등급 : 9점 이상, B등급 : 7점 이상~9점 미만, C등급 : 5점 이상~7점 미만, D등급 : 3점 이상~5점 미만, E등급 : 3점 미만

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사는 “2”항에서 확인된 부재별 상태등급을 잘못 산정한 것으로 인하여, ㄱㄷ1교(목포방향)의 경우 안전등급이 보수·보강이 필요한 C등급이 아닌 지속적 관찰이 요구되는 B등급으로 산정하는 등 [표 3]과 같이 4개교의 결함도 지수가 높게 나타나 안전등급을 잘못 산정함으로써 보수·보강이 필요한 시설물이 적절한 보수·보강이 이루어지지 못하고 있다.

[표 3] 부재의 결함도에 따른 상태등급 부여 기준

교량명	결함도 지수			안전등급	
	정 당 [A]	산 정 [B]	증,(△)감 [B-A]	정 당	산 정
ㄱㄷ1교(목포)	6.86	7.76	0.90	C	B
ㄱㄷ교(목포)	6.49	7.39	0.90	C	B
ㄱㄷ2교(서울)	6.82	7.84	1.02	C	B
ㄱㅇ교(서울)	6.91	8.26	1.35	C	B

자료 : ○○지사 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○지사장은 “2”항과 관련하여 13개 교량 27개 부재의 상태등급을 적정하게 산정 하시고, “3”항과 관련하여 4개 교량의 안전등급을 기준에 부합되도록 변경하시고, 적절한 보수·보강이 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 구조물 점검업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○지사	0급	AD	2023. 1. 30. ~ 현재	◆차장	○○지사	경고

[별표] 2025년 하반기 3종 교량 정기 안전점검보고서 적정성 검토 결과

교량명	부 재	상태등급		전체 결함도 지수		
		정당	평가	정당 [A]	평가 [B]	증,(△)감 [B-A]
13개교	27개 부재					
ㄱㄴ1교(서울)	교대(A1)	c	b	7.63	8.11	0.48
	중앙분리대(S1)	c	b			
ㄱㄷ(서울)	거더(S1)	c	b	7.44	8.34	0.90
	교대(A2)	c	b			
ㄱㄹ교(서울)	바닥판(A1)	c	b	7.82	8.72	0.90
	교대(A1)	c	b			
ㄱㅁ교(서울)	바닥판(A1)	c	b	7.86	8.76	0.90
	교대(A2)	c	b			
ㄱㅂ1교(목포)	바닥판(A2)	c	b	6.86	7.76	0.90
	교대(A2)	c	b			
ㄱㅅ교(서울)	교대(A2)	c	b	7.39	7.84	0.45
ㄱㅆ교(목포)	바닥판(A2)	c	b	6.49	7.39	0.90
	교대(A2)	c	b			
ㄱㅇ2교(서울)	바닥판(A1)	c	b	6.82	7.84	1.02
	거더(A2)	c	b			
	중앙분리대(S1)	c	b			
ㄱㅇ2교(목포)	거더(A2)	c	b	7.35	7.80	0.45
ㄱㅈ교(서울)	거더(A2)	b	a	7.40	7.82	0.42
	중앙분리대(S1)	d	b			
ㄱㅊ교(목포)	거더(A1)	c	b	7.20	8.42	1.22
	바닥판(A1)	c	b			
	교대(A1)	c	b			
	중분대(S1)	c	b			
	방음판(S1)	d	b			
ㄱㅇ교(목포)	중앙분리대(S1)	c	b	7.51	7.66	0.15
ㄱㅇ교(서울)	바닥판(A1)	c	b	6.91	8.26	1.35
	교대(A1)	c	b			

자료 : 적정성 검토 결과 재구성

시 정 요 구

【 29 】

제 목 그라운드 앵커 비탈면 보강공사 업무 부적정

소 관 부 서 ■■·■●·●●지사

구 분 유지관리

내 용

1. 업무개요

■■지사는 2024. 3. 11. ○▣건설(주)와 계약(계약금액 6,519,600천 원)을 맺고 “2024년~2025년 ■■지사 관내 시설물 연간 유지보수공사”를 시행하여 2025. 12. 31. 준공하는 등 3개 지사¹⁾는 [표 1]과 같이 3건의 공사를 시행·준공하였다.

[표 1] 시설물 연간 유지보수공사 계약 현황

기관명	공사명	계약일자	준공금액(천 원)	계약상대자	준공일
■■지사	2024년~2025년 ■■지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	2024. 3. 11.	6,519,600	○▣건설(주)	2025. 12. 31.
■●지사	2024년~2025년 ■●지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	2024. 3. 11.	7,004,880	(주)▣◆건설	2025. 12. 31.
●●지사	2022년~2023년 ●●지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	2022. 1. 1.	7,990,400	(주)☆◆건설	2023. 12. 31.

자료 : ■■·■●·●●지사 제출자료 재구성

한편, ■■지사는 스선 126.7k(목포방향) 비탈면 안정을 위해 옹벽 설치 공사를 시설물 연간 유지보수공사에 포함하여 시행하는 등 3개 지사는 [표 2]와 같이 6개소 3개 공사건에 대해 각각 시설물 연간 유지보수공사에 포함하여 시행하였다.

1) ■■지사, ■●지사, ●●지사

[표 2] 비탈면 옹벽 설치 공사 시행 현황

기관명	위 치	공 종	공사명	비 고
■■지사	스선 126.7k(목포방향)	비탈면 옹벽 설치 공사	2024~2025년 ■■지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	
■●지사	르선 23.46k(익산방향)	비탈면 옹벽 설치 공사	2024~2025년 ■●지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	
	르선 21.64k(익산방향)			
●●지사	스선 164.0k(서울방향)	비탈면 옹벽 설치 공사	2022~2023년 ●●지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	
	스선 167.2k(목포방향)			
	스선 192.8k(서울방향)			

자료 : ■■·■●·●●지사 제출자료 재구성

2. 그라운드 앵커 보강공사 계측 시행 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제8조(급경사지의 계측관리 등) 및 제22조(계측업의 등록)에 따르면 관리기관은 급경사지 지반의 침하·활동·전도 및 붕괴 등으로 위치변화를 사전에 감지하기 위하여 계측이 필요한 경우에는 관리기관이 직접 시행하거나 시·도지사에게 등록한 계측업자가 하도록 되어 있다.

한편 「공사계약일반조건」 제27조(검사) 및 제40조(준공대가의 지급)에 따르면 공사를 완성한 후 그 이행을 확인하기 위한 검사에 합격한 때에 계약상대자에게 대가를 지급하여야 한다고 되어 있다.

따라서 위 지사들은 그라운드 앵커 계측을 시행할 때에는 직접 시행하거나 계측업자가 수행하도록 하여야 하며, 계측 대가는 실제 이행 여부를 확인 후 지급하는 것이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■지사는 스선 126.7k(목포방향) 비탈면 옹벽 시공시 설치한 그라운드 앵커 계측을 계측업자가 아닌 위 공사 계약상대자의 도급내역에 반영하여

계측이 완료되지 않았는데도 계측 비용 21,000천 원 상당액을 계약상대자에게 지급하는 등 [표 3]과 같이 3개 지사 5건의 그라운드 앵커 계측을 위 공사 계약 상대자의 도급내역에 반영하여 계측²⁾이 완료되지 않았는데도 계측 비용을 지급 하였다.

[표 3] 그라운드 앵커 계측 시행 현황

(단위 : 천 원)

기관명	위 치	계측 시행방안		계측비용		비 고 (계측기간)
		정당	적용	금액	지급일자	
■■지사	스선 126.7k(목포)	별도발주	도급 포함 시행	21,000	2025. 12. 31.	'25. 8 ~ '27. 8.
■●지사	르선 23.46k(익산)	별도발주	도급 포함 시행	16,200	2024. 12. 30.	'24. 9 ~ '25. 7.
●●지사	스선 164.0k(서울)	별도발주	도급 포함 시행	7,550	2022. 12. 29.	'22. 11 ~ '24. 11.
	스선 167.2k(목포)	별도발주	도급 포함 시행	12,250	2022. 12. 29.	'22. 12 ~ '24. 12.
	스선 192.8k(서울)	별도발주	도급 포함 시행	7,200	2023. 12. 26.	'23. 11 ~ '25. 11.

자료 : ■■·■●·●●지사 제출자료 재구성

3. 그라운드 앵커 보강공사 하자담보책임기간 설정 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

“그라운드 앵커 보강 비탈면 안정성 강화 방안(◆●처, 2018. 11. 27)”에 따르면 공용중인 앵커의 성능저하, 시공결합 등을 감안하여 앵커가 시공되는 비탈면 공사의 하자담보책임기간을 준공 후 5년³⁾으로 하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■지사는 계약서상에 별도로 하자기간을 명시하지 않아 스선 126.7k(목포방향) 비탈면 옹벽 설치 공사의 경우 하자담보책임기간이 정당 5년보다 3년 부족한 2년으로 설정하는 등 [표 4]와 같이 3개 지사 6개소 비탈면 옹벽 설치 공사의 하자담보책임기간이 정당 5년보다 3년 부족한 2년으로 잘못 설정되었다.

2) 실제 그라운드 앵커 계측은 계측업자가 수행하였거나 수행하고 있는 것으로 확인됨

3) 건설산업기본법 시행령 제30조 제2항에 따라 도급계약서상에 별도로 하자기간을 정한 경우 하자기간 연장 가능

[표 4] 비탈면 옹벽 설치 공사 하자담보책임기간 현황

기관명	공사위치	공종	공사비 (백만원)	하자담보책임기간	
				정당	적용
■■지사	스선 126.7k(목포방향)	비탈면 옹벽 설치 공사	6,519	5년	2년(△3년)
■●지사	르선 23.46k(익산방향)	비탈면 옹벽 설치 공사	7,005	5년	2년(△3년)
	르선 21.64k(익산방향)			5년	2년(△3년)
●●지사	스선 164.0k(서울방향)	비탈면 옹벽 설치 공사	7,990	5년	2년(△3년)
	스선 167.2k(목포방향)			5년	2년(△3년)
	스선 192.8k(서울방향)			5년	2년(△3년)

자료 : ■●·●●지사 제출자료 재구성

그 결과, 하자담보책임기간이 부족하게 설정된 비탈면 보강공사에서 발생하는
하자에 대하여 우리 공사의 예산이 낭비될 우려가 있다.

관계기관 의견 ■■·■●·●●지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■■·■●·●●지사장은 “2”항과 관련하여 그라운드 앵커 계측 비용이 기지급 된 점을
감안하여 잔여 계측이 계획대로 이행되는지 철저히 확인·관리하시기 바라며, “3”항과
관련하여 그라운드 앵커 보강공사의 하자담보책임기간을 기준에 부합되도록 변경
(준공 후 2년 → 준공 후 5년) 하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 비탈면 보강공사 업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한
일이 발생하지 않도록 경고 또는 주의 조치하시기 바랍니다.(경고 또는 주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
■■지사	0급	AE	2024. 3. 13. ~ 2026. 4. 6.	▶차장	◆●본부	경고
■●지사	0급	AF	2023. 1. 30. ~ 2025. 2. 26.	▶차장	●●지사	경고
■●지사	0급	AG	2025. 2. 13. ~ 현재	▶차장	■●지사	주의
●●지사	0급	AH	2022. 1. 3. ~ 2024. 3. 12.	▶차장	-	퇴직

시정요구 및 통보

【 30 】

제 목 작업차량 후방 안전장치 관리방안 마련 필요

소 관 부 서 △△처, ■■·●●·◆◆·□○·●●지사

구 분 유지관리

내 용

1. 업무개요

△△처는 고속도로 안전관리체계 확립, 작업환경 개선 및 현장 안전 강화 등 유지관리현장 안전사고 예방업무를 총괄하고 있다.

한편 ■■지사는 2025. 12. 3. (유)■■■■건설과 계약(계약금액 3,993,957천 원)을 맺고 2027. 12. 31. 준공예정으로 “2026~2027년 ■■지사 관내 시설물 연간 유지보수 공사”를 시행하는 등 5개 지사는 [표]와 같이 6건의 공사를 시행하고 있다.

[표] 공사 계약 현황

기관명	공사명	계약일자	계약상대자	계약금액(천 원)	준공예정일
■■지사	2026~2027년 ■■지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	2025. 12. 3.	(유)■■■■건설	3,993,957	2027. 12. 31.
●●지사	2025~2026년 ●●지사 관내 시설물 연간 유지보수공사(1차)	2026. 12. 31.	■■■■종합건설(주)	2,690,686	2026. 12. 31.
	2026년 ●●지사 관내 포장 연간 유지보수공사	2026. 1. 2.	○△토건(주)	504,215	2026. 12. 31.
◆◆지사	2026년 ◆◆지사 관내 포장 연간 유지보수공사	2026. 1. 2.	(유)■■■가스이엔지	497,612	2026. 12. 31.
□○지사	2026~2027년 □○지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	2025. 12. 3.	(주)▲■건설	3,308,278	2027. 12. 31.
●●지사	2026년 ●●지사 관내 포장 연간 유지보수공사	2026. 1. 13.	△■■■건설(주)	352,880	2026. 12. 31.

자료 : ■■·●●·◆◆·□○·●●지사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙(이하, “규칙”)」 제53조의2 (후방보행자 안전장치)에 따르면 자동차에는 ‘후방영상장치’, 운전자에게 보행자의 접근상황을 알리는 ‘접근경고음 발생장치’, 보행자에게 자동차가 후진 중임을 알리는 ‘후진경고음 발생장치’ 중 1개 이상을 설치하도록 되어 있다.

한편 “유지관리현장 안전관리 종합대책(△△처-1773, 2020. 5. 13)”에 따르면 위 처는 유지관리 작업장 안전사고 예방을 위해 위 규칙보다 강화된 기준을 적용하여 3개 안전장치 중 2개 이상을 설치¹⁾하도록 하였다.

따라서 위 처는 작업차량의 후방 안전장치 설치 의무가 현장에서 실질적으로 이행될 수 있도록 관리방안을 마련하여야 하고, 각 지사는 유지보수 작업에 투입되는 차량의 안전장치 설치 및 작동 여부를 철저히 감독하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△처는 2020. 5월 위 방침을 수립·시행한 이후 감사일 현재까지 이행 여부에 대한 별도의 확인·점검이나 재강조 문서를 발송한 사실이 없는 것으로 확인되었다.

실제 금번 감사기간 중 위 지사들의 유지보수 공사 투입 차량을 점검한 결과, ■■지사는 시설물 연간 유지보수공사 차량(805주****)의 경우 후방영상장치가 설치되어 있지 않는 등 [별표] “후방 안전장치 미흡(미설치·고장)차량 현황”과 같이 총 5개 지사 23대 작업차량의 후방 안전장치가 관련 기준에 맞게 설치되어 있지 않거나, 고장난 상태인데도 현장에 투입하고 있는 사실이 확인되었다.

1) 현장소음으로 인한 경음장치의 한계를 보완하기 위해 ‘후방영상장치’는 필수로 설치하고, ‘접근경고음 발생장치’ 및 ‘후진경고음 발생장치’ 중 1개 이상을 설치

관계기관 의견 △△처 및 □□·●●·◆◆·□○·●●지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□·●●·◆◆·□○·●●지사장은 유지보수 작업 현장에서 후방 안전장치가 설치되지 않았거나 고장 난 상태로 확인된 작업차량 23대에 대하여 관련 기준에 부합되도록 즉시 보완 조치하시기 바랍니다.(시정)

△△처장은 유지보수 작업차량의 후방 안전장치 설치 및 관리가 실효성있게 이행될 수 있도록 관리방안을 조속히 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표] 후방 안전장치 미흡(미설치·고장)차량 현황

기관명	차량번호	차량규격	후방 안전장치			비고
			후방영상장치	접근경보음	후진경고음	
■지사 (2대)	805주****	1.0톤	×	×	○	시설물 연간 유지보수공사
	844부****	"	×	×	○	
●지사 (12대)	92더****	2.5톤	×	×	고장	시설물 연간 유지보수공사
	92더****	"	×	×	고장	
	87도****	"	×	×	×	
	86도****	"	×	×	○	
	93고****	2.5톤	○	×	×	포장 연간 유지보수공사
	81가****	"	○	×	×	
	84루****	"	○	×	×	
	87오****	"	○	×	×	
	81러****	1.0톤	○	×	×	
	802거****	"	○	×	×	
	83라****	"	고장	×	×	
	84소****	"	고장	×	×	
◆지사 (3대)	86우****	1.0톤	○	×	고장	포장 연간 유지보수공사
	87거****	2.5톤	○	×	고장	
	844거****	3.5톤	○	×	고장	
■지사 (2대)	90너****	2.5톤	고장	×	고장	시설물 연간 유지보수공사
	84러****	"	○	×	고장	
●지사 (4대)	96라****	2.5톤	고장	×	○	포장 연간 유지보수공사
	87부****	"	고장	×	고장	
	96라****	"	고장	×	고장	
	99우****	5.0톤	×	×	○	

자료 : ■·●·◆·■·●·●지사 제출자료 및 점검결과 재구성

시 정 요 구

【 31 】

제 목 교통사고 피해시설물 복구 부적정

소 관 부 서 ●●지사

구 분 교통관리

내 용

1. 업무개요

●●지사는 교통사고로 파손된 시설물에 대하여 그 원인자에게 피해를 원상복구 하도록 하는 등 2025년도 교통사고로 인한 도로시설물 파손에 대해 원인자에게 [표 1]과 같이 총 63건의 원인자부담금 576,787천 원을 부과하였다.

[표 1] 2025년 ●●지사 원인자부담금 부과 현황(2025.12.31.기준)

(단위 : 건, 원)

부 과		원인자 직접복구		정 수		미정수	
건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
63	576,787,148	28	319,796,963	12	50,269,373	23	206,720,812

자료 : ●●지사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「교통안전관리 업무기준」 제78조(부과원칙)에 따르면 이용고객의 행위로 인해 도로시설물 등이 파손된 경우 그 원인자에게 피해를 원상복구하게 하거나, 도로 관리에 지장을 초래하는 경우에는 직접 공사를 시행하고 그 비용을 원인자에게 부과할 수 있게 되어 있다.

따라서 원인자가 교통사고 피해시설물을 원상복구 하지 않는 등 복구가 지연될 경우에는 직접 공사를 시행하고 그 비용을 원인자에게 부과하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●지사는 2025. 4. 7. 흥영업소 광장부에서 발생한 교통사고의 경우 피해시설물(회차로 차단기) 복구비용(880천 원)을 원인자에게 징수(2025. 8. 1.)하였으나 8개월이 지난 현재까지 복구하지 않아 영업소 회차로를 통해 고속도로로 무단진입이 가능하여 교통안전을 저해하고 있는데도 그대로 두고 있다.

또한, 위 지사는 2025. 6. 28. ㄴ고속도로 166.3k(순천방향)에서 발생한 교통사고의 경우 원인자가 원상복구를 하지 않아 도로관리에 지장을 초래하여 직접 공사를 시행하고 그 비용을 원인자에게 부과하여야 하는데도 현재까지 복구하지 않는 등 [표 2]와 같이 총 5건의 교통사고 피해시설물을 복구하지 않아 이용고객 안전에 우려가 있는데도 아무런 조치를 하지 않고 있다.

[표 2] 교통사고 피해시설물 미 복구 현황

(단위 : 원)

구 분	사고일자	장 소	피해시설물	피해금액	비 고
1	2025. 4. 7.(월)	흥영업소 광장부	회차로 차단기	880,000	징수완료(2025. 8. 1.)
2	2025. 6. 28.(토)	ㄴ 선 166.3k(순천)	가드레일2, 지주6	4,914,712	미징수(소송중)
3	2025. 7. 1.(화)	표영업소 광장부	회차로 차단기, 아일랜드	2,200,000	미징수(소송중)
4	2025. 7. 16.(수)	ㄴ 선 157.2k(천안)	LED경광등, 가드레일4, 지주4	7,940,000	미징수(소송중)
5	2025. 7. 18.(금)	ㄴ 선 128.0k(순천)	배수턱(다이크)	4,008,000	미징수(소송중)



#1 회차로 차단기



#2 가드레일



#3 회차로 차단기



#4 경광등, 가드레일



#5 배수턱(다이크)

자료 : ●●지사 제출자료 재구성

관계기관 등 의견 ●●지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●지사장은 현재까지 복구하지 않은 5건의 교통사고 피해시설물을 신속히 복구 하시기 바랍니다.(시정)

★★처장은 교통사고 피해시설물 복구업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 또는 주의 조치하시기 바랍니다.(경고 또는 주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
●●지사	0급	AI	2025. 2. 3. ~ 2026. 1. 18.	▷부장	■●지사	주의
●●지사	0급	AK	2025. 2. 27. ~ 2025. 9. 22.	▷담당	●●지사	경고
