

[처분요구서 : 20]

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목 2022년 무장애△△△ 정비공사(추가공사) 누락분 공사비 회수 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 교통약자 배려 및 자연과 조화되고 쾌적한 공간으로 개선하여 △△△△ 품격향상 및 이미지 제고를 위하여 '2022년 △△△ 무장애△△△ 정비공사'를 추진하였다.

[표 1] 2022년 △△△△△△△ 무장애△△△ 추가 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	△△금액(천원)	계 약 업 체
2022년 △△△△△△△ 무장애△△△ 추가 정비공사	2022. 11. 23. ~ 2022. 12. 6.	데크로드 1개소(B=1.5m, L=39m) 보행매트 설치(L=210m) 평상 4개소 설치	**,***	(주)**

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독원은 △△상대자가 △△된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로

이행케 하여야 하며, △△ 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.


또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 [표1]과 같이 「2022년 무장애△△△ 정비공사」 사업을 추진하면서 목재데크로드를 설치하였으며 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 목재데크로드에 대하여 목재 하부에 오일스테인칠을 누락한 사실이 있음을 확인하였다. [표2]에서처럼 준공내역서에서 오일스테인의 칠공사 일위대가 단가를 고려하였을 때 과다 집행한 누락분 공사비(금***,***원)를 회수할 필요가 있다.

[표 2] 2022년 △△△△△△△ 무장애△△△ 추가 정비공사 누락분 공사비 현황

공 종	규 격	단 가	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			수량	금액(A)	수량	금액(B)	(B-A, 원)	
데크로드								
오일스테인칠	목재면-2회칠	** , ***	66.3㎡	*** , ***	37.05㎡	*** , ***	△*** , ***	
소 계				*** , ***		*** , ***	△*** , ***	
제경비				*** , ***		*** , ***	△*** , ***	
총 계				* , *** , ***		*** , ***	△*** , ***	천원이하 절사

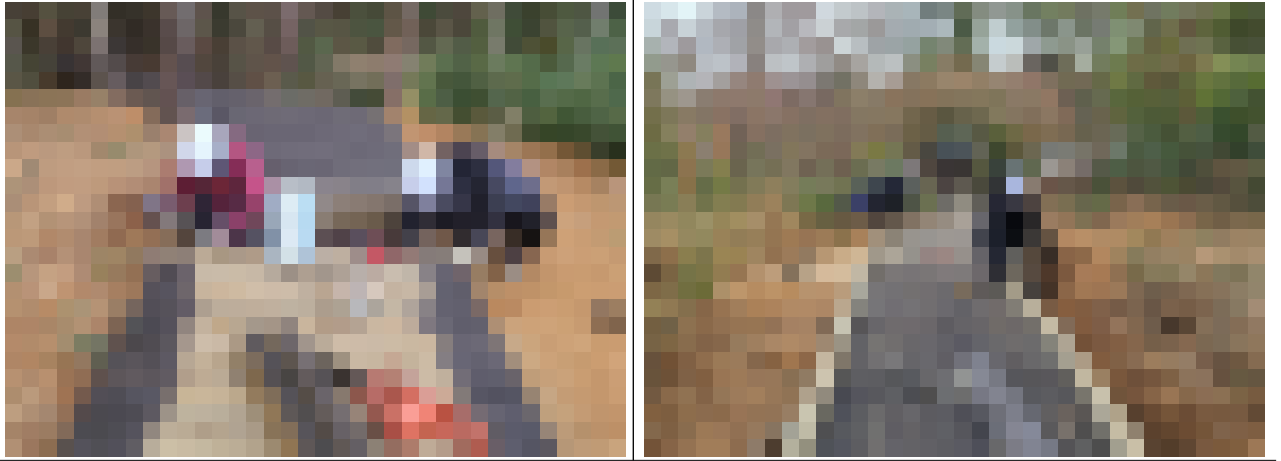

2022년 △△△△△△△ 무장애△△△ 추가 정비공사

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 미시공 공사비로 과다 집행한 공사비
,원에 대하여 재정상 회수 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)
