

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	2022년 안내표지판 정비공사 도안비 중복 등 내역 과다 계상
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 노후화된 안내표지판 정비 및 신설, 탐방로 시설물 정비를 통해 시설 경관성 제고 목적으로 ‘2022년 △△△ 안내표지판 정비공사’ 등을 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등

공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점


[표1] 2022년 △△△ 안내표지판 정비공사 현황

공 사 명	납 품 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 △△△ 안내표지판 정비공사	2022. 5. 18. ~ 2022. 6. 11.	- 안내표지판 제작설치 - 종합2, C형1, E형7, I형2, K형3, 랜드 마크2, 비규격2, 다목적4	**,***	(주)△△

[표2] 2022년 △△△ 안내표지판 정비공사 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2022년 △△△△△△△ 안내표지판 정비								
안내표지판	E	*	*** **	* ** *	*** **	*** **	△ * ** *	
화판교체	E	*			*** **	* ** *	* ** *	
소 계							△ ***	
부가세							△ **	
총 계							△ ***	

○ 현황사진

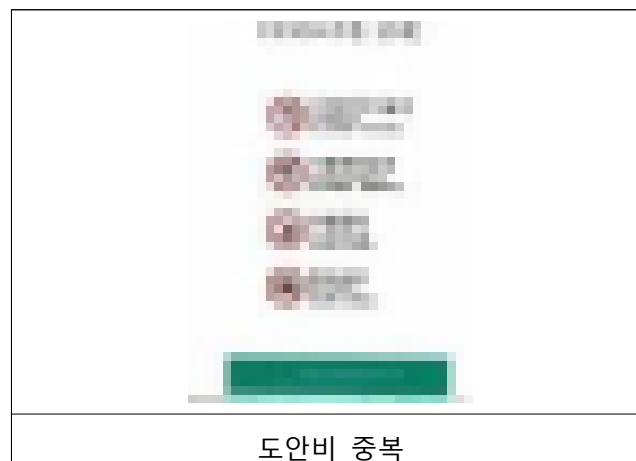

[표3] 2022년 △△△ △△마을지구 랜드마크 제작설치 현황

공 사 명	납 품 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 △△△ △△마을지구 랜드마크 제작설치	2022. 6. 02. ~ 2022. 6. 22.	- 랜드마크 제작설치(1000×5000)	***,***	주식회사 건설미공

[표4] 2022년 △△△ △△마을지구 랜드마크 제작설치

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2022년 △△△ △△마을지구 랜드마크 제작설치								
오일스테인 및 도장	*회	1	***,***	***,***	***,***	***,***	△***,***	
소 계							△***,***	
부가세							△**,***	
총 계							△***,***	

○ 현황사진



△△△△△△△△△△에서는 ‘2022년 △△△ 안내표지판 정비공사’를 추진하면서 같은 안내표지판(E형) 3개 설치 시 도안비를 1회만 적용하여야 함에도 3개 모두 적용하였으며, 또한 ‘2022년 △△△ △△마을지구 랜드마크 제작설치’를 추진하면서 랜드마크 내부 오일스테인 및 도장이 누락된 사실을 준공도서를

통하여 확인하였다.

이에 따라 사업 추진 시 변경 또는 공사준공 시 감액, 정산 등을 이행하지 않은 채 사업을 준공하여 [표2], [표4]에서 처럼 준공금(금***,***원_총합)을 과다 집행한 사실이 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 과다 집행된 준공금을 회수하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△)은 안내표지판 도안비 중복 및 오일스테인 도장 누락으로 과다 집행된 준공금 *****,***원**을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)
