

감사결과처분(요구)서

일련번호	30	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	3,107,130원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	채()요()알()부터 각 2개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 재난취약지구 정비공사 미시공 공종 정산 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독원의 임무)

① 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에서 정하는 바에 따른다.

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경)

- ① 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다.
- 1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
 - 2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
 - 3. 새로운 기술공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우
 - 4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

2. 현황 및 지적내용

○ 재난취약지구 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액	계 약 업 체
2022년 재난취약지구 정비공사	‘22. 5. 6. ~ 8. 3.	재난취약지구 정비 1식	49,272,643	△△△△ △△


○ 돌쌓기 공종 미시공 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
돌쌓기(변경 전)								
무근콘크리트	인력 비빔타설	61m	6,150	375,150	-	-		삭제 필요
콘크리트타설 (인력운반타설)	무근 구조물	61m	29,278	1,786,019	-	-		
부직포(필터매트)	2t/m (3000g/m²)	61m	2,328	142,008	-	-		
돌쌓기(변경 후)								
무근콘크리트	인력 비빔타설	0	6,150	0	-	-		
콘크리트타설 (인력운반타설)	무근 구조물	0	29,278	0	-	-		
부직포(필터매트)	2t/m (3000g/m²)	0	2,328	0	-	-		
소 계				2,303,177		0	△2,303,177	
제경비				803,953		0	△803,953	
총 계				3,107,130		0	△3,107,130	

○ △△△△△△△△△△△△에서는 2022년 재난취약지구 정비공사를 시행(2022. 5. 6. ~ 8. 3.)하면서, 설계도서 확인결과 돌쌓기 공종에서 기초부분 콘크리트 타설 및 부직포 설치가 설계에 반영되어 있었으나,

○ 돌쌓기를 실시하는 과정에서 현장 여건으로 인해 기초부분 콘크리트 타설 및 부직포 설치가 제한되어 현장 실정에 맞게 설계변경이 필요한 실정이었으나, 해당 공종에 대하여 설계변경을 하지 않고 준공하여 미시공된 부분의 준공금 정산(3,107,130원)을 소홀히 한 사실이 있음.

○ 현장 시공사진(준공사진 참고)

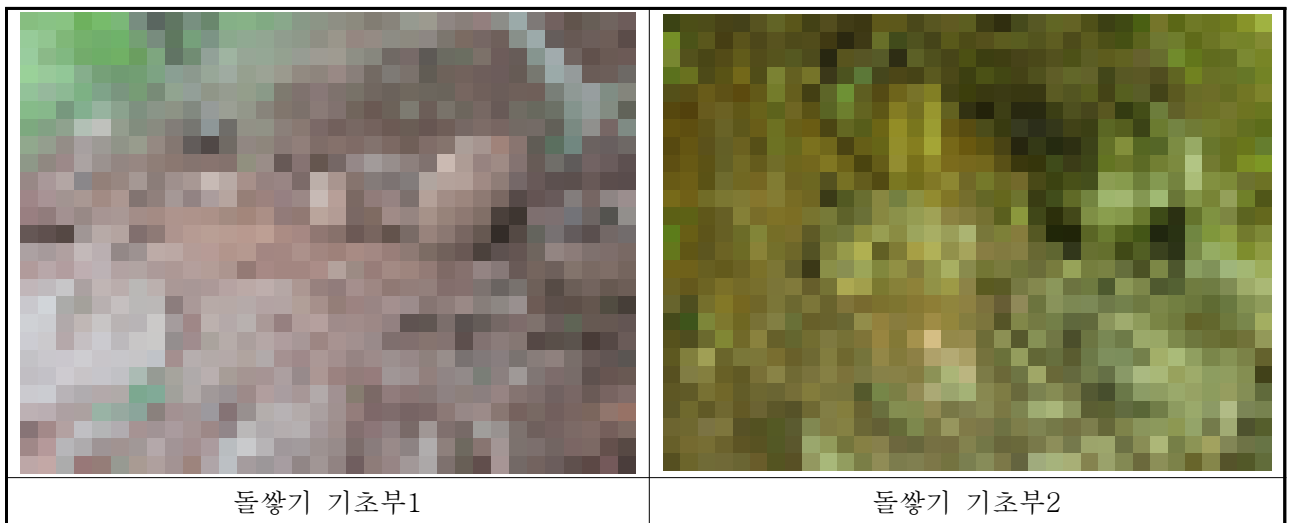

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 기초부분 콘크리트 타설 및 부직포 설치 미시공 공중에 따른 과다 집행된 공사비 금3,107,130원 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련
