

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [4] △★◁ 출고 일반자재 운반비 착오 지급

관 계 부 서 : 상생조달처, 스마트미터링실, 남서울본부 등 4개 지역본부

조 치 부 서 : 상생조달처, 스마트미터링실, 남서울본부 등 4개 지역본부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 첨단 기술 기반 물류 인프라 선진화로 저비용·고효율 물류체계를 실현하기 위해 ‘△★◁’를 건립하고 2023년 2월부터 순차적으로 남서울본부를 포함한 4개 지역본부(%☆♣, ▣♣⊗, ■▮◁, ♣⊗\$)의 자재센터를 통합·이전하여 운영하고 있다.

2023년 2월 이후 상기 4개 지역본부의 공사 진행 건수는 47,789건([표 1] 참조)이며, 사업소 공사 담당자들은 전선류, 애자류 등 일반자재에 대하여 운반비를 산정하여 배전 전문회사에 지급하고 있다.

[표 1] 4개 지역본부별 공사 진행 건수

구 분	%☆♣	▣♣⊗	■▮◁	♣⊗\$
공사 진행 건수(건)	6,217	6,296	13,503	21,773
기 준 일*	2023. 3. 13.(월) 이후		2023. 2. 13.(월) 이후	

※ 기준일 : 각 본부별 △★◁ 업무개시일

2. 관계 규정 및 판단기준

2023년 2월 7일 자재처 △★㉮에서 ■㉮◁와 ☼㉮\$를 대상으로 발송한 「■㉮㉮◁, ☼㉮\$ 자재 이전 및 △★◁ 업무 개시 안내」(자재(㉮㉮㉮)-000) 따르면, △★◁의 업무개시일인 2월 13일 이후 출고되는 일반자재에 대해서는 별도 하역 용역을 운영하고 있으므로 배전 전문회사에 운반비 지급 시 상차작업 비용(이하 ‘적상임(積上賃)’)은 제외하여야 한다.

%☆☼와 ㉮☼㉮도 2023년 3월 9일에 자재처에서 발송한 공문¹⁾에 따라 2023년 3월 13일 이후 배전 전문회사에 운반비를 지급할 때 출고 자재에 대한 적상임은 제외하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:00:45

그런데 업무개시일인 2023년 3월 13일 이후 남서울본부에서 시행 중인 6,296건의 공사에 대한 운반비 산정 또는 지급 내용을 점검한 결과, 2,688건이 운반비에서 적상임을 제외하지 않은 것으로 확인되었고 금액은 67,325,343원이었다.


이에 착오 지급 사유에 대해 검토한 결과 아래와 같은 문제점이 있었다.

가. 담당 직원의 업무 변경사항 ‘미인지’

1) 「%☆☼, ㉮☼㉮ 자재 이전 및 △★◁ 업무개시 안내」(자재(㉮㉮㉮)-000)

2023년 3월 자재처에서 공문을 발송할 때 ‘업무 변경사항’ 중 ‘운반비 산정 시 적상임 제외’가 있었고 영업배전정보시스템(이하 ‘시스템’) 입력 시 예시 사항으로 [그림 1]을 제시하였다.

[그림 1] 시스템상 운반비 사항 입력 예시

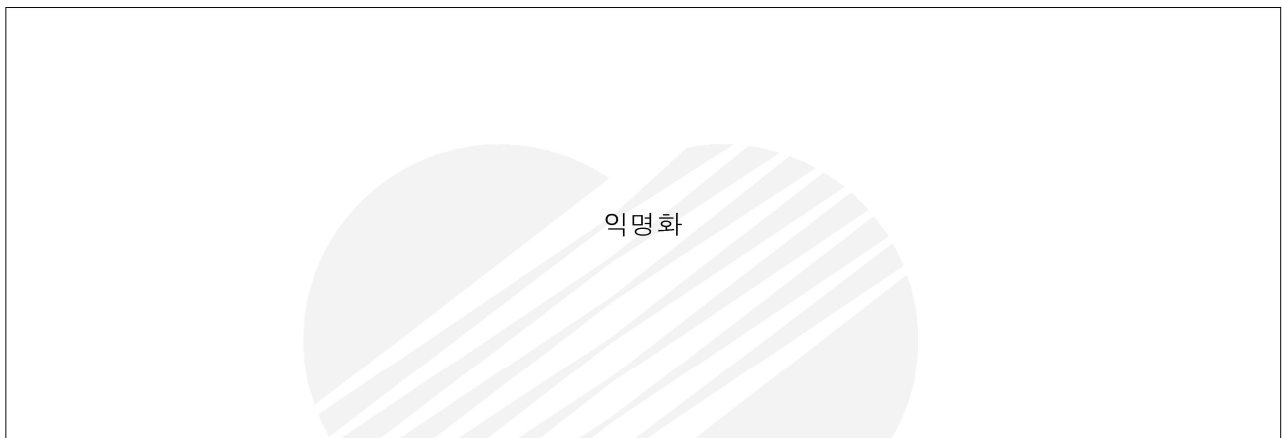

그러나 남서울본부 담당 직원 일부를 대상으로 면담을 시행한 결과 상기 사항에 대해 잘 몰랐다고 답변하였다.

나. 시스템(내선 공사 부분)상 적상임 제외 기능 ‘미구현’

일반적인 신규 공사의 경우 상기 예시와 같이 시스템상 운반비 산정 시 적상임을 제외(‘Y’에서 ‘N’으로 변경)할 수 있게 되어 있지만 적상임을 제외하지 않은 경우 중 적지 않은 비중(2,688건 중 861건으로 약 32%)을 차지하는 내선 공사의 경우에는 상기 [그림 1]과 같이 적상임을 제외할 수 있는 시스템이 구현되어 있지 않았다. [그림 2]

[그림 2] 영업배전정보시스템상 내선 공사 시 운반비 입력화면

설계운반비내역

부설		철거		확공(위탁)	
*운반거리	0 km	*운반거리	0 km	*운반거리	0 km
*주행속도 직재	0 km/h	*주행속도 직재	0 km/h	*주행속도 직재	0 km/h
*주행속도 공차	0 km/h	*주행속도 공차	0 km/h	*주행속도 공차	0 km/h

추가로 남서울본부를 포함한 △★◁에서 자재를 출고하는 4개 지역본부(%☆♠, ▣♣⊗, ■▮◁, ♣⊗\$)의 적상임 지급 내역을 점검한 결과, [표 2]처럼 총 19,002건에 대하여 적상임을 제외하지 않았고 금액은 약 545백만 원이었다.

[표 2] 전사 공정별 적상임 부과 내역

구 분	미 준 공 (착공 예정 포함)		준 공		합 계	
	건수(건)	금액(원)	건수(건)	금액(원)	건수(건)	금액(원)
%☆♠	익명화					
▣♣⊗						
■▮◁						
♣⊗\$						
합 계					19,002	545,685,461

물론 운반비 산정 시 관련 공문이 나갔음에도 적상임을 제외하지 못한 부분에 대해서는 잘못을 물어야 하나, ① 4개 본부 공사 담당자 대부분(%☆♠ 000명, ▣♣⊗ 000명, ■▮◁ 000명, ♣⊗\$ 000명)이 적상임을 제외하지 않고 있었다는 점,

② 개인별 적상임 부과 금액이 소액(1인당 평균 약 00만 원)이었다는 점, ③ 내선 공사의 경우에는 시스템상 적상임 제외가 불가능했다는 점에서 업무 담당자에게 책임을 부과하는 것은 적절하지 않다고 판단된다.

관계부서 의견

2023년 2월과 3월 사업소에 △★◁ 업무 개시 관련 공문을 발송한 자재처(現 상생조달처) 담당 차장은 운반비 산정 시 적상임 제외를 기본값으로 설정하려고 했으나, 당시 영업배전시스템실(TF) 담당자가 영업배전정보시스템 4.0은 전(全) 본부가 하나의 통합 서버로 운영되므로 4개 본부에만 별도 기본값을 설정하게 되면 시스템상 또 다른 오류가 발생할 수 있어 어렵다고 하여 부득이 시스템상 적상임을 제외('Y'에서 'N'으로 변경)하도록 사업소에 안내만 하였다고 진술하였다.

이와 관련하여 현재 영업배전시스템실(TF) 담당 차장 문의 결과, 상기 사유와 동일한 사유로 일부 본부에만 기본값을 달리 설정하는 것은 어렵고, 시스템을 개선 한다면 관련 내용을 Pop-up으로 안내하는 것은 가능하다고 답변하였다.

스마트미터링실 담당자는 내선 공사의 경우 시스템상 적상임을 제외할 수 있는 기능이 구현되어 있지 않다는 점을 인정하였고, 이에 대한 개선이 필요함에 동의하였다.

조치할 사항

상생조달처장은 운반비 착오 산정 또는 지급이 발생하지 않도록 영업배전시스템실(TF)과 협조하여 시스템 개선 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

스마트미터링실장은 내선 공사 설계 시 운반비 착오 산정 또는 지급이 발생하지 않도록 영업배전시스템실(TF)과 협조하여 시스템 개선 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

남서울본부 등 4개 지역본부의 장은

- ① 착오 지급된 운반비(적상임)를 회수 또는 감액하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 관련 내용에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 1 개 선 2 통 보 1	회 수 [127,048,483원] 감 액 [418,636,978원]	-	상생조달처 스마트미터링실 남서울본부 등 4개 본부	상생조달처 스마트미터링실 남서울본부 등 4개 본부
