

접속설비설치공사 정산내역 불합리사항 검토를 통한 건설원가 절감

종 류	모 범 사 례				
관련부서	태안건설본부 #9,10건설처 전기팀				
모범사례	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
유 형	○ (5.14억원)				

I. 현황 및 문제점

○ 현황

- 태안 9,10호기 증설에 따른 송전용량 확보를 위해 송배전용전기설비 이용규정에 의거하여 한국전력과 태안 9,10호기 송전용전기설비 이용계약체결을 체결하였음
- 이용계약상 송전용 접속설비 증설공사는 사용자(서부)가 부담하고 한전이 시공하며 이에 대한 하위계약으로 고객부담 접속설비설치공사 시행계약 2건을 '14년 02월에 체결하여 '16년 06월 공사를 준공함

< 접속설비설치공사 계약명 >

계약 1. 345kv 신당진-태안화력T/L 용량증대 선종교체 공사 및 관련 부대공사

계약 2. 345kv 신당진개폐소 건설공사

○ 문제점


- 접속설비설치공사의 공사비용은 송·배전용전기설비 이용규정에 의거 서부발전이 전적으로 부담하는 것으로 되어 있으며
- 공사비 산정은 접속설비설치공사 시행계약내용에 따라 한전의 설계기준과 공사 및 회계관련 규정(송전용 접속설비 고객부담공사 업무처리기준)에 의해 정산하도록 되어있어 한전 입장으로 해석된 정산내역에 이의를 제기하기 어려움
- 또한 이용계약 제14조 (접속비용 및 납부방법) 『기타 용량증대 사업을 수행하는데 불가피하게 추가 도출되는 직간접 비용』에 근거하여 한전은 자재비 및 시공비 외 기타 비용에 대한 확대해석이 가능하여 공사비 정산 요청사항에 대한 정확한 검토가 필요함



II. 대 책

1. 한전의 정산요청내역의 상위규정 및 계약내용과의 상충사항 검토

사례1) 신당진개폐소 차단기용 공용설비 자재비 100% 서부부담

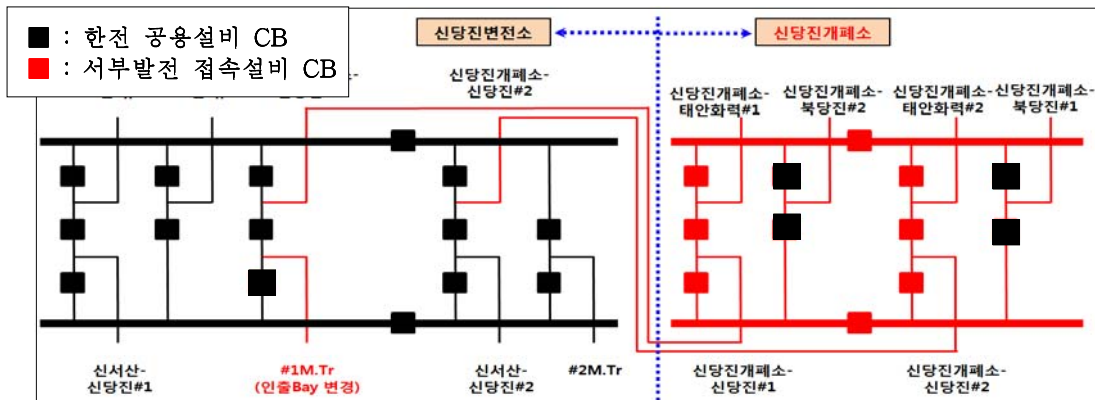

< 신당진 개폐소 차단기(CB) 공사내용 >

- 문제점

신당진개폐소의 신설 CB(차단기) 총 12대중 4대는 한전용 설비로 시공비와 자재비를 한전이 부담하나 설비보호반 및 전원공급장치 등은 서부설비와 공동활용이 가능하여 전체 서부부담으로 계약됨

(최초 계약당시 서부 접속설비추가공사 CB 8대가 선행 결정된 과정에 한전 공용설비공사 CB 4대가 추가된 사항임)

- 검토내용

송배전용전기설비 이용규정 제57조 1항에 의하면 접속설비 외 한전 사용분은 한전이 공사비를 부담하도록 되어 있어 접속설비설치공사 시행계약 내용에도 불구하고 상위 이용규정을 위반한 것으로 판단하여 정산시 이의제가 하였으며 설치차단기 대수 비율로(8:4)상호 부담 합의하에 정산금을 삭감함

※검토적용 우선순위 : 1. 송배전용전기설비 이용규정→ 2. 송배전용전기설비 이용계약→

3. 접속설비설치공사 시행계약→ 4. 한전 업무처리기준

- 정산결과

구분	기존	개선	대상설비
부담비율	서부발전100% 부담	서부발전66%, 한전34% 부담	소내배전반, 고장기록장치, 각종 보호반, 제어조작반
서부 부담금액	598백만원	388백만원 (210백만원 삭감)	



사례2) 정산금 검토기간 지연이자 지급요청

- 문제점

한전 내부 송전용 접속설비 고객부담공사 업무처리기준에 따라 공사 최종정산을 요청한 날로부터 정산금이 입금되는 날까지의 기간동안을 '16년 한전 평균차입금 이자율을 적용하여 이자금액을 합산한 금액으로 정산지급 할 것을 요청함

- 검토내용

공사시행계약상 30일내 정산차액을 지급하는 것으로 되어 있어 '16.06.22일 청구된 정산금을 '16.07.20일 지급처리 완료함. 지연이자 관련 상위규정 검토결과 세부규정을 한전간 상호계약에 따르기로 되어있어 계약서상 명시된 내용 외 이자비용은 지급 할 수 없음을 통보함

※검토적용 우선순위 : 1. 송배전용전기설비 이용규정→ 2. 송배전용전기설비 이용계약→
3. 접속설비설치공사 시행계약→ 4. 한전 업무처리기준

< 관련규정 >

『송배전용전기설비 이용규정』제58조 1.건설비

가. 2001.7.12 이후 한전이 착공한(건설공사계약 체결일 기준) 접속설비(이하 “신설접속설비”라 합니다)는 공사기간 내 공사 진척에 따른 분납을 원칙으로 하되, 접속비용부과시기 확정 이전에 착공한 신설접속설비의 경우는 전체공사에 소요된 기간 동안 분납하며 세부적인 납부방법은 고객과 한전 간 상호계약에 따릅니다.

『송전용전기설비 이용계약서』제14조

② 접속설비 건설비 납부

접속설비 건설비는 '송·배전용전기설비이용규정' 제58조 및 제60조에 의거 “갑”이 공사기간 내 공사 진척에 따라 분납하며, 상세 건설비 및 건설비 납부방법은 이용계약과 별도로 “갑”과 “을” 간 접속설비 고객부담공사의 시행에 관한 계약(공사시행계약)을 체결하여 그에 따릅니다.

『공사시행계약서』

7. 송전용 접속설비 고객부담공사비 부담

다. 공사비 정산

(1) “을”은 공사 준공 후 세부공사비 집행내역을 “갑”에게 제공하여 송전용 접속설비 고객부담공사비를 최종 정산하여야 합니다.

(2) 정산에 따라 추가입금이 필요한 경우 “갑”은 특별한 사유가 없는 한 정산요청 30일 이내에 정산차액을 입금하여야 합니다.

- 정산결과

지연이자산출 = 추가정산금 × 지연일 × '16년 한전차입금 이자율

= 1,405,468,000원 × 29일 × 4.04%/365일 = 4,511,359원 전액 삭감



2. 한전 자재비,공사비 및 경비 항목에 대한 증빙자료 전체 타당성 검토

- 문제점

자재 및 경비지출 내역에 대한 증빙자료 검토를 통해 한전 입장의 청구내역 중
접속설비 설치공사 무관항목 삭감 필요

- 검토내용

타사(당진#9,10,신보령) 및 선행호기 (평택2복합, IGCC) 정산항목을 참고하여
증빙자료에 확인 및 회계자문(본사 회계담당) 등 세부 검토 시행

구분	착안사항	결과
사급자재비	서부 접속설비 공사자재 확인 (※ 한전 담당팀 송·변전공사 동시다수 진행 중)	타사업자재 분류오류건 제외
도급공사비	준공정산서 확인 (※ 한전 준공검사 및 감사필 확인)	이상없음
경비	용역비, 출장비, 기타경비 등 사용내역(설계적정성) 및 목적 점검	접속설비공사 무관 건 제외
금융자본화비용	계약 불포함 및 공사비근거 불충분 내용으로 청구 적정성 검토 (회계담당자 자문의뢰)	한전내부 금융비용으로 공사무관 제외

- 정산결과

사급자재비 4건, 경비 30건, 금융자본화비용 전액 총 304백만원 삭감

☐ 기대효과

○ 유형효과 : 518백만원

○ 무형효과

- 향후 접속설비 설치공사 시행시 정산 참고기준으로 사용 정산금 과지급 예방

[증빙자료]

- 붙임 1. 최초 한전 정산요청 공문
2. 정산의견 회신공문(서부)
3. 이견합의 회신공문(한전)
4. 최종 정산금 지급공문





한국전력공사

수신자 수신자 참조
(경유)

제 목 공사준공 알림 및 공사비 입금요청(345kV 신당진태안화력T/L
선종교체공사)

접수	번호	태건-20333
처리	일시	2016.06.21
	부서	전기팀
공람	팀장	강광주
	차장	권오복
	사원	김정혁



한국전력공사

수신자 한국서부발전(주) 사장 [참조 : 태안 9.10건설처 전기팀장]
(경유)

제 목 공사준공 알림 및 정산요청(345kV 신당진개폐소 건설공사)

- 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 345kV 신당진-태안화력T/L 선종교체공사와 관련하여 아래와 같이 공사를 준공함을 알려드리며, 고객부담공사비 정산분 추가입금을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사준공 개요

- ? 공 사 명 : 345kV 신당진-태안화력T/L 선종교체공사
- ? 공사기간 : '14.3.27 - '16.5.20.
- ? 공사내용 : 전선교체 및 철탑 설치·철거
 - 전선교체(43km) ACSR/AW ⇒ HTACSR/AW 480mm²(R) × 4B × 2C 단, No.2-27호 구간은 HSTACIR/AW 410mm² × 4B × 2C
 - 철탑 신설 6기, 철거 7기
- ? 공사관계자
 - 시행사 : 한전 중부건설처 ☎ 042-717-4354
 - 시공사 : (주)한백 ☎ 062-954-1122
 - 감리단 : 벽산파워(주) ☎ 02-767-5580

나. 고객부담공사비 정산내역

- ? 정산금액 : ₩ 46,912,020,000- (VAT별도)
- ? 기 납입금액 : ₩ 45,220,445,000- (VAT별도)
- ? 추가입금 요청금액 : ₩ 1,691,575,000- (VAT별도)
- ? 입금 요청일 : 2016년 6월 22일
- ? 입금처 : 한국전력공사 / 농협 018-01-229310
- ? 기타 : 송배전용전기설비 이용규정 제58조 및 송전용접속설비 업무처리기준 제11조에 의거 추가입금 요청일 다음날부터 해당금액 납부일까지의 이자를 추가로

- 귀사의 무궁한 발전을 진심으로 기원합니다.

- 태건910(전)-13838(2014. 3.27)관련으로 체결된 345kV 신당진개폐소 건설공사에 대하여 아래와 같이 공사가 준공됨을 알려드리며, 아울러 본 고객부담 공사비에 대해 정산요청 합니다.

가. 준공개요

- 공사기간 : 2014.08 - 2015.12(최종가압'16.04)
- 사업규모
 - 345kV GIS(63kA 6300A) × 12CB설치(접속8, 공용4)
 - 345kV GIB(63kA 6300A) × 1식 설치 및 (50kA 4000A) × 1식 철거
 - 345kV GIS(50kA 4000A) × 1CB설치
 - 345kV BUS PT(2대) × 1식 이설

나. 고객부담금 정산내역(부가세 별도)

구 분		금 액	비 고	
고객부담 공사비 기 입금액		18,522,480,000	1-4차분	
공사비 정산내역	공사비	사급분	15,696,760,734	자재/일관비/감리비
		도급분	3,011,128,524	
		소 계	18,707,889,258	
	기타	경 비	632,727,931	준공시험비 포함
		철거자재	-80,128,227	환입처리
		소 계	552,599,704	
	합 계		19,260,488,962	
	단수처리		962	
정 산 금 액		738,008,000		

- 추가 요청금액 : ₩738,008,000-(부가세 제외)
- 입금 요청일 : 2016년 6월 30일
- 입금계좌 : 농협 018-01-229310(한국전력공사)



나눔의 에너지, 감사함을 전합니다.



한국서부발전주식회사

수신자 한국전력공사(중부건설처 송전건설부 2파트)
(경유)

제 목 신당진-태안화력T/L 선종교체공사 공사비용 정산요청 관련 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 『공사준공 알림 및 공사비 입금요청』 [중부건(송건)-755 (2016.06.22)]의 관련입니다.
3. 『신당진-태안화력T/L 선종교체공사』에 대한 준공정산과 관련하여 당사의 의견을 회신하오니 준공정산 업무에 참조하시기 바랍니다.

=== 의 견 ===

- ☐ 송·변전설비 주변지역 보상 및 지원에 관한 법률(이하 “송주법”) 개정관련 「주변지역지원금」 등 비용정산 지급보류
 - 사유 : 이용계약서 상 관련내용 계약변경 미완료
- ☐ 송주법 개정관련 「주변지역지원금」 비용 준공정산시 감액조치 요구
 - 금액 : ₩ 2,348,294,090-
 - 항목 : 사급분/경비/재산적보상
- ☐ 일부 공사비용 청구사유 추가 증빙(근거) 요청
 - 금융자본화비용
 - 기타경비 중 1개 항목(별도송부)
- ☐ 이차청구에 대한 회신
 - 근거 : 『송배전용전기설비 이용규정』 제58조 가항, 『송전용전기설비 이용계약서』 제14조 2항 및 『공사시행계약서』 7.다항 [※붙임 참조]
 - 의견 : 위 근거에 따라 정산관련 세부사항은 공사시행계약서가 정한바에 따르며 이차청구는 본계약에 포함된 사항이 아님
- ☐ 기타 : 이견사항에 대하여 협의 필요.

붙임 : 관련규정 정리. 끝.

나눔의 에너지, 감사함을 전합니다.



한국서부발전주식회사

수신자 한국전력공사(중부건설처 변전건설부)
(경유)

제 목 345kV 신당진개폐소 건설공사 정산요청 관련 검토결과 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문서 『공사준공 알림 및 정산요청(345kV 신당진개폐소 건설공사)』 [중부건(변전)-795 (2016.06.30)] 관련입니다.
3. 『345kV 신당진개폐소 건설공사』에 대한 준공정산과 관련하여 당사의 의견을 회신하오니 준공정산 업무에 참조하시기 바랍니다.

=== 의 견 ===

- ☐ 신설 설비 중 한전과 공용 하는 설비에 대한 기자재 부담비용 재산정
 - 사유 : 현재 서부발전 전체 부담으로 청구됨
- ☐ 증빙자료 추가요청
 - 기타경비 집행내역 중 비품구매 증빙자료. 끝.

태안건설본부장



수신자

사원	김정혁	차장	권오복	팀장	강광주
시행	태건910(전)-36571 (2016.07.11)				접수
주소	32105 충남 태안군 원북면 발전로 457 (방갈리 831)				홈페이지 http://www.iwest.co.kr
전화	041-670-4395		FAX		이메일 Mi6@iwest.co.kr
사내접근	열람자제한		알리오공시 비대상		원문공개 비공개





한국전력공사

수신자 수신자 참조
(경유)

제 목 준공정산문 검토조정 의견 송부(345kV 신당진태안화력T/L
선종교체공사)

접수	번호	태건-24048
처리	일시	2016. 07. 18
처리	부서	전기팀
공람	팀장	강광주
	차장	권오복
	사원	김정혁

- 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 문서번호 중부건(송건)-755(2016. 6.21)로 입금요청한 고객부담공사비 정산금액에 대하여 그동안 귀사와의 협의 및 회의를 통하여 아래와 같이 조정하였음을 알려드립니다.

? 정산내역

순번	구분	당초청구금액	검토조정금액	변경금액	변경내용
1	송전자재	20,044,880,601	20,029,730,430	-15,150,171	전용매자 처리착오
2	토목자재	407,745,047	400,989,046	-6,756,001	타사업 자재 분류오류
3	경비	13,179,523,311	12,902,073,626	-277,449,685	> 금용비용 제외 > 집행예비금액 정산
4	도급분	11,671,360,000	11,671,360,000	0	
5	잡이익	1,608,512,000	1,621,760,581	13,248,581	OPGW 이설공사 자체 비용 누락분 반영
6	단수정리	-959	-683		
공사비 합계		46,912,020,000	46,625,913,000	-286,107,000	
입금액 누계		45,220,445,000	45,220,445,000	0	
정산입금 요청금액		1,691,575,000	1,405,468,000	-286,107,000	감액

3. 아울러 고객부담공사비 최종 정산결과 추가 입금이 필요한 경우의 이차발생에 대하여 아래와 같이 안내해 드립니다.



한국전력공사

수신자 한국서부발전(주) 사장 [참조 : 태안9.10건설처 전기팀장]
(경유)

제 목 정산요청 검토결과 회신에 대한 의견 송부(345kV 신당진개폐소
건설공사)

중부건(변전)-795(2016. 6.30) 및 태건910(전)-36571(2016. 7.11), 태건910(전)-37106(2016. 7.12) 관련으로 345kV 신당진개폐소 건설공사 정산요청 검토결과 회신에 대하여 아래와 같이 우리처 의견을 알려드립니다.

- 접속설비 공사명 : 345kV 신당진개폐소 건설공사
- 의견사항

구분	서부발전	중부건설처
공용 사급자재	-자부담 100%건 재산정 -비품구매 증빙자료요청	- 서부 66%, 한전 34% - 기 제출 완료
사급자재 일반관리비	정산보류요청	판례에 따라 재요청
경비	무관한 일부 삽입 제외	일부항목 삭제 및 조정
	-	주자재 운반비 일부추가
공사비 분담비율	-	서부 66%, 한전 34% (시행계약 내역서 반영)

3. 금액변동

구분		변경전	변경후	증감
고객부담 공사비 기 입금액		18,522,480,000	18,522,480,000	-
공사비 정산내역	사급분	15,696,760,734	15,492,968,348	-203,792,386
		3,011,128,524	2,984,001,240	-27,127,284
		18,707,889,258	18,476,969,588	-230,919,670
	경비	632,727,931	634,936,460	2,208,529
		-80,128,227	-79,406,351	721,876
		552,599,704	555,530,109	2,930,405
	합계	19,260,488,962	19,032,499,697	-227,989,265
	단수처리	962	697	265



나눔의 에너지, 감사함을 전합니다.



한국서부발전주식회사

수신자 내부결재
(경유)

제 목 접속설비 설치공사 정산금 지급

1. 『태안9,10호기 접속설비 설치공사 준공정산 검토』 [태건910(전)-36911 (2016.07.12)]의 관련입니다.
2. 접속설비 설치공사에 대한 한전의 정산요청에 따라 아래와 같이 정산 금액을 지급하고자 합니다.

*관련문서 1. 『준공정산분 검토조정 의견 송부(345kV 신당진태안화력T/L 선종교체공사)』 [중부건(송건)-854 (2016.07.18.)]
2. 『정산요청 검토결과 회신에 대한 의견 송부(345kV 신당진 개폐소 건설공사)』 [중부건(변전)-868 (2016.07.19.)]

가. 정산 요청내역

구 분		금 액	비 고
정산 요청금액	당초	66,172,509,000원	한전 최초정산요청
	변경	65,658,413,000원	서부 조정요청반영
삭감금액		-514,096,000원	사급자재비, 금융비용, 경비 삭감 반영

나. 기 납부금액 : 63,742,925,000원

다. 최종 정산지급액 : 1,915,487,000원

라. 기타사항

- 1) 사급자재 일반관리비 지급보류는 판결사례에 따라 지급 시행
○사례1 : 중부발전 대법원 파기환송으로 판결대기중(대법원 2015도1246339)
→ 파기환송건의 지방법원 최종판결 결과에 따라 추후 환수조치 예정
○사례2 : 다우기술 판례(대법원 2012다57736)
- 2) 최초 정산요청일부터 이자비용 별도청구건은 계약내용에 의거 불지급 처리
*근거문서 [태건910(전)-33366 (2016.06.24)]

일상 감사	접 수	2016.07.20 09:30:06
	처 리	2016.07.20 13:23:19
	등록번호	299

- 붙임 1. 345kV 신당진-태안화력T/L 선종교체공사 정산 집계표 1부
2. 345kV 신당진개폐소 건설공사 정산 집계표 1부
3. 산출내역 및 첨부증빙(별첨) 1부. 끝.

팀장	김광주	실장	임선빈	처장	송경서	본부장	김용학
시행	태건910(전)-39210 (2016.07.21)					접수	
주소	32105 충남 태안군 원북면 발전로 457 (방갈리 831)					홈페이지	http://www.iwest.co.kr
전화	0650-4395 FAX					이메일	Mi6@iwest.co.kr
사내접근	부서제한 알리오공시 비대상					원문공개	비공개

일상 감사	접 수	2016.07.20 09:30:06
	처 리	2016.07.20 13:23:19
	등록번호	299

