

4

증기세척 시공분야 선제적 관리로 Key Milestone 준수

종 류	모 범 사 례				
관련부서	태안건설본부 #9,10건설처 터빈팀				
모범사례 유형	예산절감 ○ (24.0억원)	업무개선	성실근무	민원해소	기 타 ○

I. 현황 및 문제점

○ 9호기 증기세척 결과 분석

번호	항목	예상	실적	차이	비 고
1	증기세척 기간	45일	76일	31일 증가	
2	증기세척 횟수	240회	518회	278회 증가	

※ 예상 기준 : 타프로젝트 실적에 단축 목표 반영한 수치임


- 9호기 증기세척시 시공분야 미비에 의한 공정지연은 없었으나, 특히 3단계 (Main Step) 세척기간 증가로 인해 총 소요기간이 예상대비 31일 증가됨
- 시공분야 미비에 의한 공정지연 요인을 사전에 도출하고 종합대책 수립을 통해 10호기 Key Milestone을 준수

II. 대 책

○ 9호기 증기세척에 사용한 주요 자재에 대해 정밀 점검 시행 및 정비계획 수립

번호	품목	단위	수량	자재비	점검결과	비고
1	Pipe / Fitting	Ton	592.3	16.1억	양호	
2	Spring Hanger	Ton	2.8	0.4억	양호	
3	MOV Gate Valve 26"	대	2	6.1억	정비필요	
4	MOV Globe Valve 2"	대	2	0.2억	정비필요	
5	Silencer	대	2	3.0억	양호	



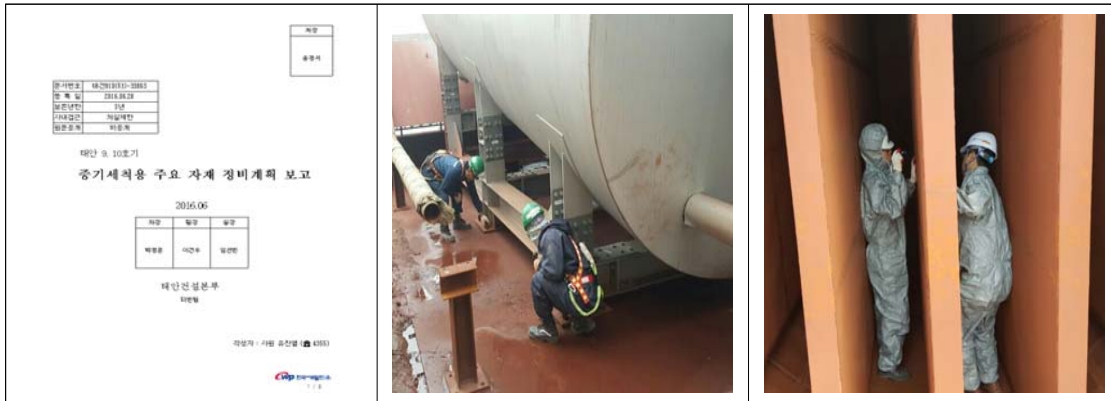

○ 주요자재 반출 정비시행

: 가배관 Main MOV 2대 및 Bypass MOV 2대 반출 정비 후 재설치 완료
- 분해 점검




- 정비 완료 및 재설치



○ 9호기 비계획손실 방지를 위한 가배관 경로 변경

- 당초 BFPT 구동용 증기 배관 세척을 위한 가배관경로가 9호기 설비 지역을 관통하도록 설계
⇒ 9호기 설비지역을 우회하는 경로로 가배관 재설계

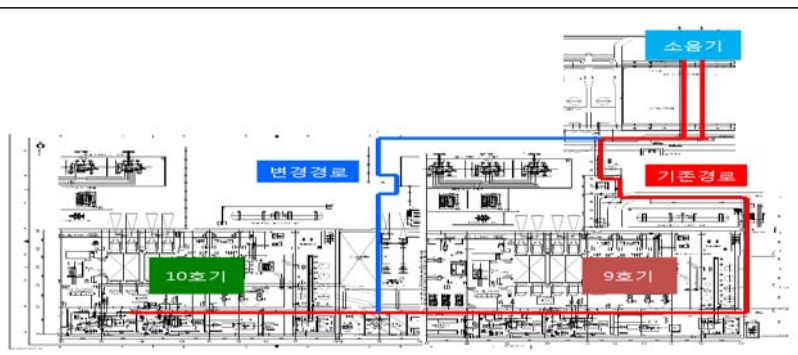

○ 증기세척시 배출증기로 인한 재해 예방 및 운전설비 손상 방지

- 소음기 주변 안전시설 설치
: 증기확산방지 펜스(가설비계) 설치 및 배출구 정면 안전벽(컨테이너) 설치
- IGCC 및 9호기 CWP 보호 시설 설치
- 염소주입설비 배관 보호장치 설치
- 응축수 배출배관 소음방지 장치 설치
- 9,10호기 발전기술원 출퇴근 안전통로 설치



Ⅲ. 기대효과

유형효과	[시공분야 미비로 인한 10호기 증기세척 공정 지연 예방: 3일] ⇒ 절감액 약 24억원 (호기별 발전판매 수익 약 8억원 기준)
무형효과	○ 상업운전 설비 손상 예방 ○ 향후 신규건설사업시 증기세척 표준자료로 활용 ○ 시운전공정 중 재해위험 사전제거로 무사고 무재해 사업장 달성에 기여

