

주의요구 및 통보

1. 제 목 : ●●보훈병원 주차장 증축공사 사업 진행 부적정

2. 관계기관 : ●●보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

●●보훈병원에서는 주차공간 부족에 따른 주변도로 불법 주정차 해소 및 양질의 주차 편의서비스 제공으로 고객만족도를 제고하기 위해 세출예산을 재원으로 B동 주차장 증축공사를 진행하고 있습니다.

가. 주차장 증축공사 이사회 부의에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「한국보훈복지의료공단 정관」 제7조(이사회 설치와 기능)와 「이사회운영규정」 제10조(부의사항)에서는 중요한 재산의 취득과 처분에 관한 사항은 이사회에서 심의 의결한다고 정하고 있으며, 중요 재산의 정의를 부동산의 경우 10억 원 이상(증·개축 포함)으로 명시하고 있습니다.

따라서 이사회 의결사항에 해당하는 사업을 추진하기 위해서는 사전에 이사회 안건을 부의하여 업무추진의 타당성을 검토받고 승인을 얻은 뒤 진행하도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●보훈병원에서는 B동 철골 주차장 #개 층을 증축하기 위해 총사업비 ##억 원의 주차장 증축사업 계획서를 제출하였고 본사 ▲▲▲▲부의 공문(●●보훈병원 주차장 증축 관련 세출예산 편성 내역 통보, ▲▲▲▲-####, ‘###.###.##)을 통해 사업비 ##억 원 중 설계비 ##백만 원이 ##년 세출예산으로 배정됨을 통보 받았음에도 이사회 의결사항임을 인지하지 못하고 [표]와 같이 설계용역 계약을 체결하였으며

[표] 주차장 증축공사 설계용역 계약 현황

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약업체	비 고
●●보훈병원 B동 주차장 증축공사 설계용역				

이후 이사회 의결사항임을 인지하고 ##년 #월 [redacted]부로 이사회 부의안건을 제출하였으나 이미 설계용역 진행 중인 시점이었으며, 결과적으로 설계용역 완료 이후인 ##년 #월 ##일 이사회 의결을 득하여 이사회 기능이 실효성 있게 운영되지 못하였습니다.

한편 **실 「○○보훈병원 주차장 증축(안) 비상임이사 경영제언 후**
속조치 보고」에 따르면 ○○보훈병원에서는 '##년도에 총 사업비 중 설계비에
 해당하는 ##백만 원만 반영되었고 차년도 예산편성은 별도 진행 중이었기 때문
 에 이사회 부의 대상이 아닌 것으로 착오하였다고 소명하였습니다.

그러나 '##년 ㉠㉡재활센터 건립공사(총사업비 171억 원)와 '##년 장례식장 시설개선 공사(총사업비 ##억 원)의 경우 사전에 ■■■■실로 부의안건을 제출하고 이사회 의결을 거쳐 사업을 추진했음을 고려할 때, 설계용역의 조기 실시 사유가 있었다라도 사업추진에 앞서 기존사업과 비교하여 절차상 문제점을 점검하는 과정이 필요했다고 판단됩니다.

나. 주차장 증축공사 설계용역비 집행에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단에서는 국고보조금(세출예산) 사업을 「보조금 관리에 관한 법률」 및 기획재정부 「총사업비 관리지침」을 준용하여 관리하고 있으며, 「보조금 관리에 관한 법률」

제34조(별도 계정의 설정 등)와 「국가보훈처 국고보조금 관리지침」 제21조(별도 계정 등)에서 보조사업자 등은 교부받은 보조금 또는 간접보조금에 대하여 별도의 계정을 설정하고 자체의 수입 및 지출을 명백히 구분하여 회계처리하여야 한다고 명시하였습니다.


또한 「국가보훈처 국고보조금 관리지침」 제12조(보조사업자의 교부신청서 제출 등)에서 보조금을 받으려는 보조사업자 등은 보조금법에 따른 교부신청서 및 사업계획서를 지정한 기일 내에 보조사업부서의 장 또는 상위보조사업자에게 제출하도록 하고 있고 제18조(보조금 교부방법)에서는 보조금을 2회 이상 나누어 교부하여 기 교부된 보조금이 목적대로 사용되고 있는 여부를 점검하도록 하고 있습니다.

따라서 국가보조금을 재원으로 하는 사업의 경우 자체예산과 구분하여 집행하고 관리하여야 하며 사업비 지출이 예상되는 경우 관련 법령에 따라 적시에 보조금 교부신청서를 제출하여 해당 국고보조금 재원으로 집행될 수 있도록 주의를 기울여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○보훈병원 주차장 증축공사 추진 내역을 확인한 결과, [그림]과 같이 '###.##.## 설계 용역계약을 체결하고 '###.##.## 설계용역이 완료되어 용역비 ###천 원을 집행해야함에도 이사회 미승인으로 국고보조금 교부신청 및 수령일정이 지연되자 ■■■와 사전 협의 없이 '###.##.## 자체예산으로 용역비를 우선 집행하였습니다.

[그림] 주차장 증축공사 진행사항

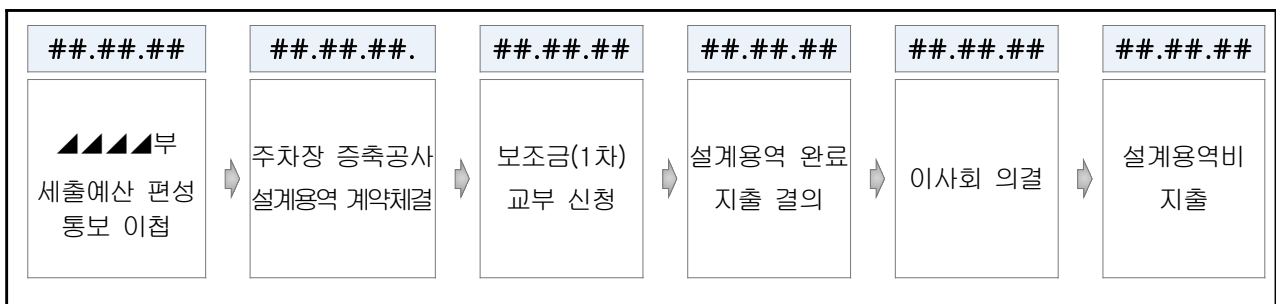

4. 관계기관 의견

●●보훈병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●보훈병원장은

- '나'항과 관련하여, 이사회 의결사항에 해당하는 공사를 진행하는 경우 원인 부서뿐만 아니라 예산관리 부서에서도 이사회 부의 안건 관리에 철저를 기하여 주시기 바람(통보)
- '다'항과 관련하여, 국고보조금 지원 사업임에도 자체예산으로 집행하는 일이 없도록 국고보조금 교부신청 등 보조금 집행 절차를 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)

○ ▷▷이사(●●보훈병원장)은

- '나', '다'항과 관련하여 사전에 이사회 승인 절차를 누락하고 관련 국고보조금 교부 및 집행을 부적정하게 처리한 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
