


[30-1] [주의] 사항

1. 제 목 : 최상층 세대 천정단열재 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ❄❄❄❄처
3. 관 련 자 : ○○○○본부 □□□□처 □□□□1부 차장대우 건축4급 rrr(주의)
(현 소속 : ◁◁지역본부 ❄❄사업본부 □□□□1부 차장대우 건축4급)
4. 내 용 :

○○○○본부 □□□□1부에서는 2016. 11월 ◆◆도시 2-*M2BL 아파트 건설 공사 5공구(공임 1,164호)의 공사를 시행하면서 [그림 10]과 같이 아파트 최상층 세대의 천정 콘크리트 타설 시 부착토록 되어 있는 두께20mm 단열재 물량이 설계 내역서에 누락된 것으로 판단하고 해당물량을 [표 86]과 같이 설계 변경 하였다.

[그림 10] ◆◆도시 2-*M2BL 최상층 천정 단열재 설계현황

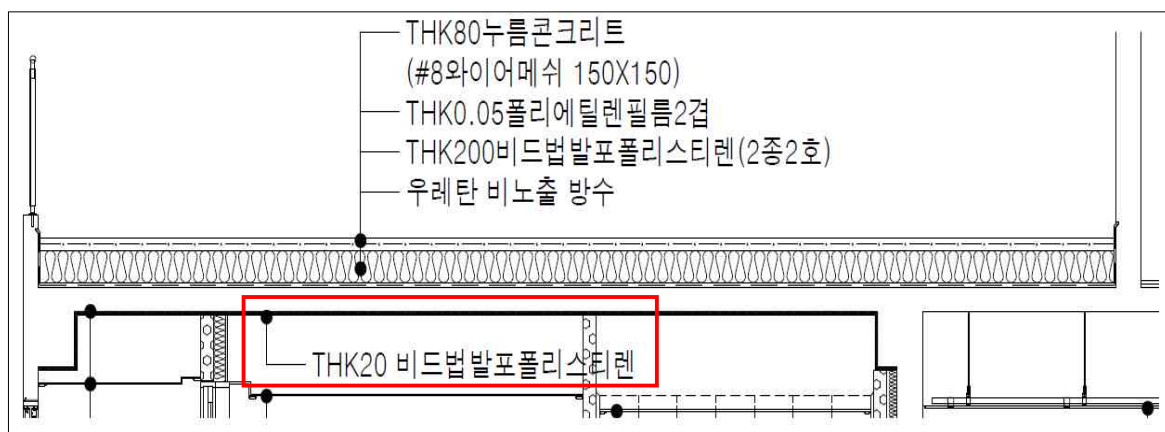

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

[표 86] ◆◆도시 2-*M2BL 최상층 천정 단열재 설계변경 현황

항목	단가	변경전		변경후	
		수량	금액	수량	금액
스티로폼깔기(m²) (비드법 2종2호 20mm)	5,389	-	-	13,254	90,978천 원

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

公社 아파트 건설공사 발주 시 최상층 천정에 설치되는 20mm 단열재는 공법의 특성상 [표 87]과 같이 목공사 내역 항목 중 최상층세대 경량철골 천정틀 공사 일위대가 항목에 포함되어 있는 자재로 단열공사 내역과 분리되어 있으므로 누락 여부를 정확하게 판단하여야 한다.

[표 87] ◆◆도시 2-*M2BL 최상층 경량철골천정틀 일위대가

도시 M2BL (실적)		도시 M2(실적)		페이지 : 36 / 323 출력일 : 2017-05-2						
CODE	명 규	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액
SAHR9018	최상층경량철골천정틀	(거실,H=540MM,석고보드9.5MM)			M2					
LGA00083	특별인부	인	0.0745	0.0	102,334.0	0.0	7,623.8	0.0	7,623.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0475	0.0	84,166.0	0.0	3,997.8	0.0	3,997.8	0.0
MCQ33901	공포	발	2.0	166.0	0.0	0.0	332.0	332.0	0.0	0.0
MGE20702	타정틀	개	19.0	5.0	0.0	0.0	95.0	95.0	0.0	0.0
	아연도 나사못									
	D6 25MM									
MAK19020	스티로폼	m2	1.1	2,060.0	0.0	0.0	2,266.0	2,266.0	0.0	0.0
	20MMX900X1800 0.025(2종2호)									
							20,400	8,779.0	11,621.0	0.0

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

그런데도 ◆◆도시 2-*M2BL 5공구에서는 20mm 천정단열재가 최상층 경량 철골 천정틀 공사의 일위대가 항목 내에 적정 물량이 반영되어 있음에도 불구하고 단열공사 내역에서 해당 천정단열재가 확인이 되지 않자 해당 물량이 누락된 것으로 판단하여 설계변경을 시행하였다.

그 결과 ◆◆도시 2-*M2BL 5공구의 낙찰률(74.22%)을 적용한 단가 기준으로 [표 86]과 같이 약 91백만 원의 설계변경이 부적정하게 이루어졌다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은


최상층세대 천정단열재 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자 건축4급 rrr에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

[30-2] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 최상층 세대 천정단열재 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부 □□□□1부에서는 2016. 11월 ◆◆도시 2-*M2BL 아파트 건설 공사 5공구(공임 1,164호)의 공사를 시행하면서 [그림 11]과 같이 아파트 최상층 세대의 천정 콘크리트 타설 시 부착토록 되어 있는 두께20mm 단열재 물량이 설계 내역서에 누락된 것으로 판단하고 해당물량을 [표 88]과 같이 설계 변경 하였다.

[그림 11] ◆◆도시 2-*M2BL 최상층 천정 단열재 설계현황

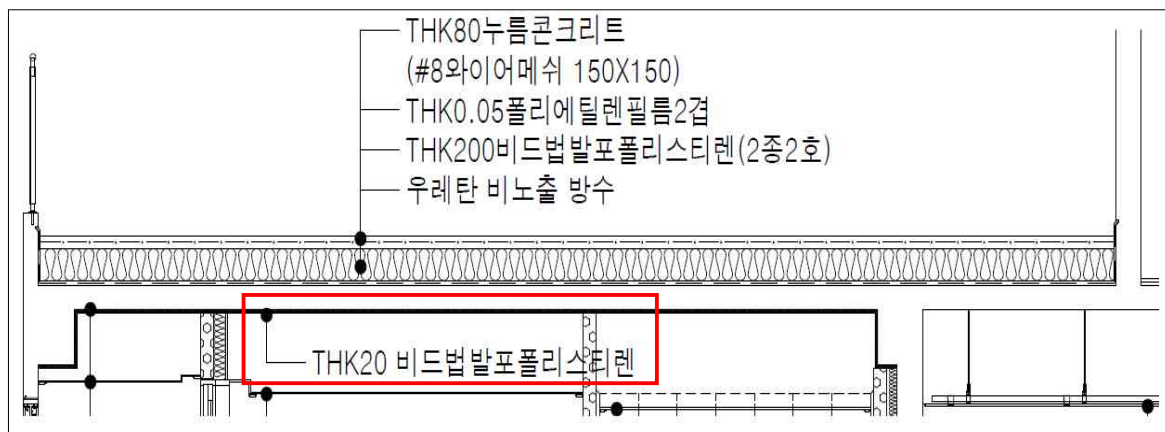

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

[표 88] ◆◆도시 2-*M2BL 최상층 천정 단열재 설계변경 현황

항목	단가	변경전		변경후	
		수량	금액	수량	금액
스티로폼깁기(m²) (비드법 2종2호 20mm)	5,389	-	-	13,254	90,978천 원

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

公社 아파트 건설공사 발주 시 최상층 천정에 설치되는 20mm 단열재는 공법의 특성상 [표 89]와 같이 목공사 내역 항목 중 최상층세대 경량철골 천정틀 공사 일위대가 항목에 포함되어 있는 자재로 단열공사 내역과 분리되어 있으므로 누락 여부를 정확하게 판단하여야 한다.

[표 89] ◆◆도시 2-*M2BL 최상층 경량철골천정틀 일위대가

도시 M2BL (실적)		도시 M2(실적)		페이지 : 36 / 323 출력일 : 2017-05-2						
CODE	명 규	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액
SAHR9018	최상층경량철골천정틀	(거실, H=540MM, 석고보드9.5MM)			M2					
LGA00083	특별인부	인	0.0745	0.0	102,334.0	0.0	7,623.8	0.0	7,623.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0475	0.0	84,166.0	0.0	3,997.8	0.0	3,997.8	0.0
MCQ33901	공포	발	2.0	166.0	0.0	0.0	332.0	332.0	0.0	0.0
MGE20702	타정틀	개	19.0	5.0	0.0	0.0	95.0	95.0	0.0	0.0
	아연도 나사못									
	D6 25MM									
MAK19020	스티로폼	m2	1.1	2,060.0	0.0	0.0	2,266.0	2,266.0	0.0	0.0
	20MMX900X1800 0.025(2종2호)									
							20,400	8,779.0	11,621.0	0.0

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

그런데도 ◆◆도시 2-*M2BL 5공구에서는 20mm 천정단열재가 최상층 경량 철골 천정틀 공사의 일위대가 항목 내에 적정 물량이 반영되어 있음에도 불구하고 단열공사 내역에서 해당 천정단열재가 확인이 되지 않자 해당 물량이 누락된 것으로 판단하여 설계변경을 시행하였다.

그 결과 ◆◆도시 2-*M2BL 5공구의 낙찰률(74.22%)을 적용한 단가 기준으로 [표 88]과 같이 약 91백만 원의 설계변경이 부적정하게 이루어졌다.

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

◆◆도시 2-*M2BL 5공구의 최상층 천정단열재 설계변경 시 중복하여 반영된
관련 공사금액 약 91백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).
