

[15] [통보(모범사례)] 사항

1. 제 목 : 지구 외 도로 개설방법 변경을 통한 사업비 절감
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : 경남지역본부 ☆☆☆☆단 차장 토목3급 HHH
4. 내 용

위 관련자는 2016. 2. 1.부터 감사일 현재까지 경남지역본부 ☆☆☆☆단에서 ○○○○ 공공주택지구(이하 “○○○○지구”이라 한다)의 인허가 및 조사설계 업무를 수행하고 있다.

○○○○지구 교통영향평가(2007. 12.)에는 아래 [그림 1]와 같이 경부고속도로 남측과 지방도 ****호선을 연결하기 위한 지구 외 도로를 지하차도(L=0.24km, B=18m)로 개설하도록 계획되어 있었다.

[그림 1] ○○○○지구 지구 외 도로(지하차도) 개설 위치도



자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그런데, 관련자는 지구 외 도로 노선 중 경부고속도로 횡단구간은 비개착공법¹⁾을 적용할 수 밖에 없지만, 그 외 도로 노선은 비굴착공법²⁾(지하차도) 및 굴착공법(일반도로)이 모두 적용이 가능할 것으로 판단하고 도로 개설 예정구간의 현황 여건³⁾을 재조사하였다.


관련자는 지하차도 설치 예정구간의 지형 및 지장물 현황 등을 재조사하고 ○○○○지구의 단지계획고, 기반시설설치 계획 및 도로설계현황을 면밀히 검토하였는데

굴착공법으로 도로를 개설할 경우, 비굴착공법 보다는 토지 수용 면적이 많아지고 비탈면이 발생하는 단점이 있지만 수용토지가 지가가 낮은 임야이고 지장물이 적어 경제적인 도로 개설이 가능할 뿐만 아니라,

운전자 시거향상 및 자전거보행자 겸용도로 반영 등으로 교통성이 향상되고 도로 유지관리비가 절감되는 등 사용성과 경제성이 모두 향상되는 것으로 분석되었다.

이에 따라, 관련자는 동 지하차도가 일반도로로 설계될 수 있도록 본사 설계주관부서에 공법변경의 필요성에 대해 협의하고 2016. 10. 설계교류회를 통하여 지하차도가 일반도로로 변경 설계되도록 업무 수행하였다.

[그림 2] ○○○○지구 지하차도 설계변경 현황


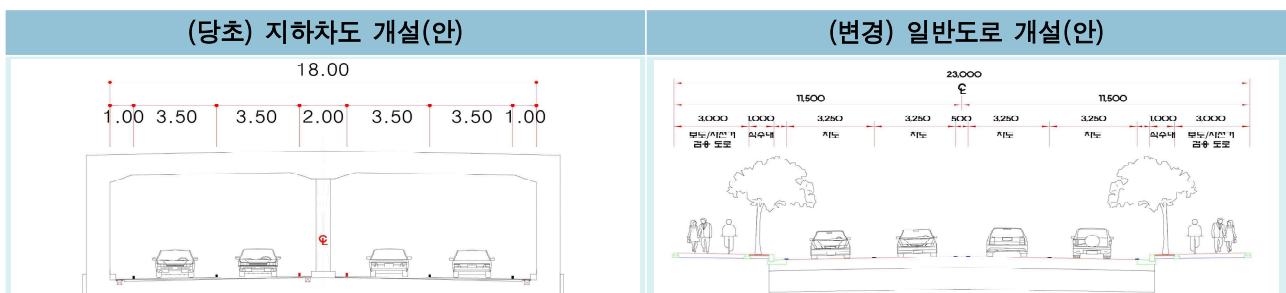


자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

- 1) 고속도로 및 철도 등 주요 간선 교통시설에는 비개착공법 적용(프론트잭킹, 파이프루프, TBM공법 등)
- 2) 보안시설(건축물 등)이 많거나 보전이 필요한 시설이 있을 경우 또는 도심지 등 지가가 높은 지역에 주로 적용
- 3) 지형조건, 지목 및 보안시설 유무 등

이와 더불어, 관련자는 “○○○○지구 지구지정(2차) 및 지구계획(2차) 변경 인허가 신청(2016. 5.)” 시에 동 지하차도를 일반도로로 변경하여 신청하고 동 변경내용이 승인 될 수 있도록 약 7월의 기간 동안 지자체(♠♠♠도 등) 및 국토부에 도로개설공법 변경의 합리성 및 필요성을 협의하였는데, 관련 인허가 기관에서도 도로 개설 변경(안)이 보다 합리적이고 효율적인 것으로 판단하고 2016. 12. 공공주택 통합심의위원회의 심의 의결을 통하여 인허가 승인하였다.

[그림 3] ○○○○지구 인허가 변경 승인 현황 도면

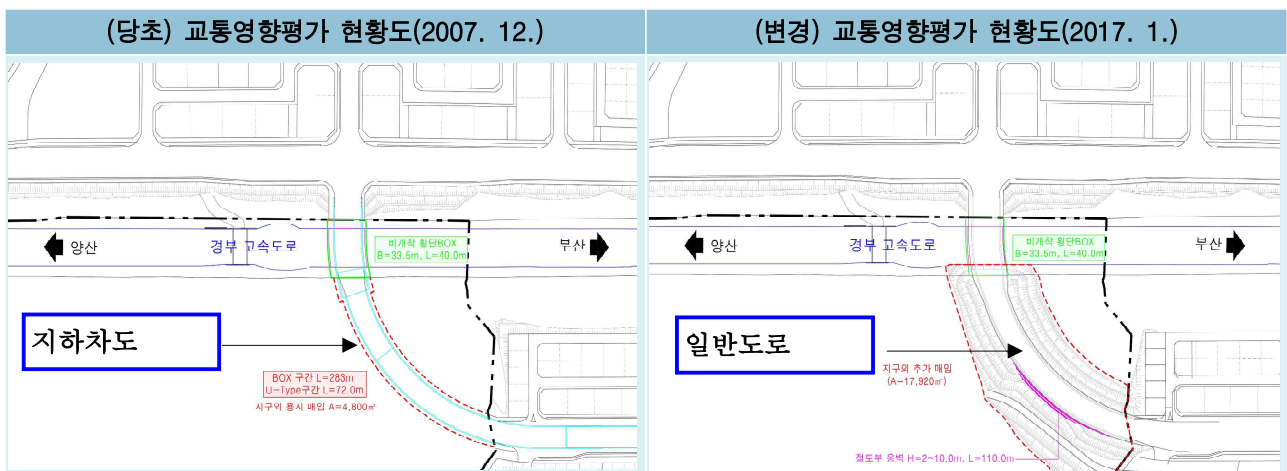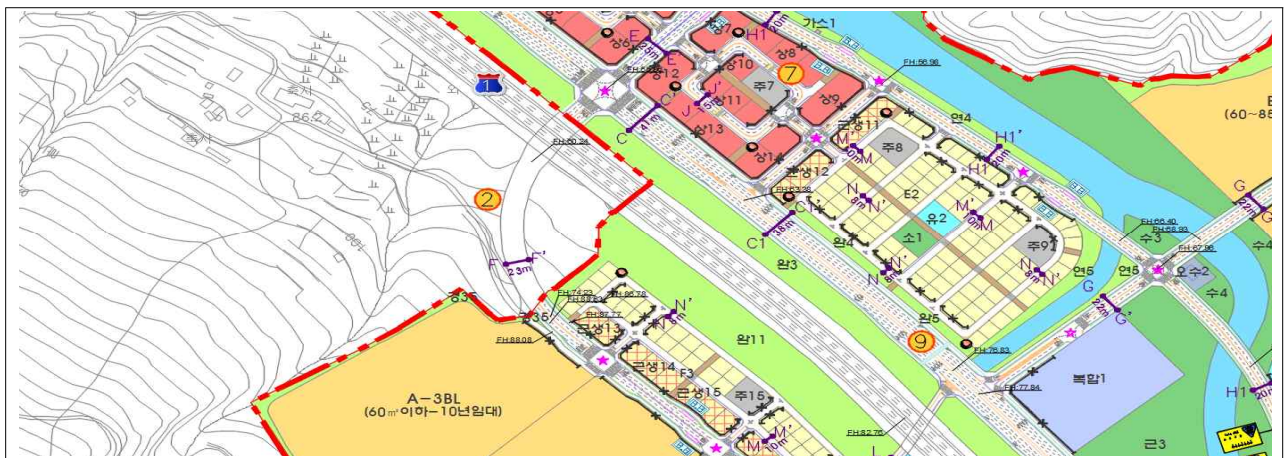

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 지구 외 도로의 교통성 향상 및 유지관리비의 절감이 예상되고 관련 공사비 약 174억원이 절감되었다.

5. 조치할 사항

○○○○○처장은

적극적인 업무수행으로 도로개설방법 변경을 통해 지구 외 도로 교통성 향상 및 사업성 개선에 기여한 토목 3급 HHH에게 ‘사장 표창’을 상신하여 주시기 바랍니다.(통보(모범사례))

붙임 : 공적조서 1부. 끝.

□ 공적조서

소속	직렬 · 직급	사번	성명	입 사 일 현승진일	전 입 일 생년월일																																
경남지역본부	토목, 3급	113935	HHH	'03. 12. 08 '16. 01. 01	'15. 02. 04. '78. 06. 22																																
공적내용	지구 외 도로 개설방법 변경을 통한 사업비 절감																																				
상기인은 경남지역본부 ☆☆☆☆단에 토목3급으로 근무하면서 적극적이고 능동적인 자세로 맡은바 업무를 충실히 수행하여 타의 모범이 되었고, 특히 지구 외 개설방법 변경을 통해 사업비 절감의 성과를 이룸 사업비 절감내역 기반영되어 있는 지하차도에 대하여 설계 진행 중이었음에도 사업지구 현황여건 등을 감안한 지속적인 검토 · 협의를 통해 지구 외 도로 개설방법 변경을 통하여 사업비를 절감 [표 44] 절감내역 <table><tr><th>구분</th><th>지하차도(단위:억원)</th><th>도로개설(오픈컷)(단위:억원)</th><th>비 고</th></tr><tr><td>비개착공사</td><td>127.1</td><td>127.1</td><td></td></tr><tr><td>지하차도</td><td>131.4</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>토공사</td><td>6.3</td><td>12.8</td><td></td></tr><tr><td>가시설공</td><td>67.5</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>절토부 옹벽</td><td>-</td><td>5.8</td><td></td></tr><tr><td>보상비</td><td>4.6</td><td>17.3</td><td></td></tr><tr><td>합 계</td><td>336.9</td><td>163.0</td><td>감) 173.9</td></tr></table>						구분	지하차도(단위:억원)	도로개설(오픈컷)(단위:억원)	비 고	비개착공사	127.1	127.1		지하차도	131.4	-		토공사	6.3	12.8		가시설공	67.5	-		절토부 옹벽	-	5.8		보상비	4.6	17.3		합 계	336.9	163.0	감) 173.9
구분	지하차도(단위:억원)	도로개설(오픈컷)(단위:억원)	비 고																																		
비개착공사	127.1	127.1																																			
지하차도	131.4	-																																			
토공사	6.3	12.8																																			
가시설공	67.5	-																																			
절토부 옹벽	-	5.8																																			
보상비	4.6	17.3																																			
합 계	336.9	163.0	감) 173.9																																		

현부서 근무기간 (수공기간)	담당업무	상별	동일공적표창사례	비고
'15.02.04~현재까지 ('16.02.01~현재까지)	○○○○ 인허가	사장표창 ('14. 4., '16.11., '16.12.)	없음	
