

감사결과 처분요구서

【제 목】 (모범) 설비 재사용을 통한 원가 및 폐기물 절감

【부 서 명】 &&&팀

【행정상 조치】 통보(모범)

【지 적 내 용】

1. 업무개요

&&&팀은 소속부서의 건축사업 전반에 관한 업무를 추진하면서 타 부서에서 지원 요청한 건축 등 공사를 시행하였고, 'ABC공사'를 <표 1>과 같이 실시하였다.

<표 1> ABC공사

공종	계약금액	공사기간	비고
건축,기계	994,131,050원	24.01.08.~24.06.15	▪ 대지면적 : 7,970 m ² ▪ 연 면 적 : 648 m ²
통신	190,942,000원	24.01.08.~24.06.15	

2. 모범내용

&&&팀은 'ABC' 건립에 대한 실시설계를 2023. 6. 22일에 완료하고 2023. 12. 28일 공사를 발주하여 공사를 추진하면서,


2019. 1월에 건축되어 사업이 종료된 'DEF' 철거가 계획되자 2024. 2. 16일 현장확인을 통해 <표 2>와 같이 이전설치가 가능한 기자재를 점검하였고,

〈표 2〉 DEF 재사용 대상 공사 기자재 현황

구 분	재활용 설치 품목	비 고
기계분야	실내기(천장형에어컨, 13EA), 실외기 2EA, 컨트롤리모컨 일체	각 실
통신분야	구내방송장치(2EA), 빔 프로젝트(2EA), 스피커(10EA), 마이크 및 악세사리 일체	홍보실, 회의실

2024. 3. 6일 철거담당 부서와 협의를 통해 〈그림〉과 같이 기계·통신 장비를 2024. 5월에 이전 설치를 완료 함으로써

〈그림〉 ABC 재사용 공사 기자재 현황

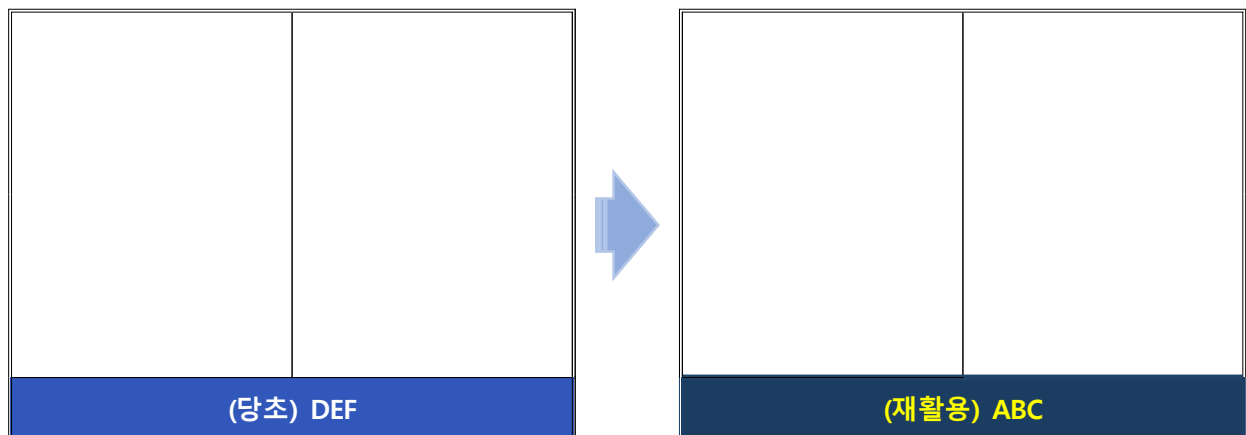

〈표 3〉과 같이 당초 설계 반영된 기계·통신공사 관급자재 구매 예산 총 72,307,000원의 절감을 통해 「지방재정법」 제3조 따른 재정을 건전하고 효율적으로 운용하기 위한 지방재정 운용의 기본원칙 준수를 위해 노력하였고,

〈표 3〉 기계·통신장비 재사용에 따른 원가절감 현황

구 분	금 액			철거·설치 비용㉔	최종금액 (㉕-㉖+㉔)	증감액	
	공사비	관급자재㉖	총 액㉕				
기계공사	85,672	56,068	141,740	20,493	106,165	(감)	35,575
통신공사	143,539	47,403	190,942	10,671	154,210	(감)	36,732
합 계	229,211	103,471	332,682	31,164	260,375	(감)	72,307

건설공사에 사용된 장비를 재사용함으로써 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」에 따른 폐기물 발생 억제 목적 달성을 위한 노력하는 등 그 직무를 성실하게 수행하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(\$\$\$\$, &&&&)은

모범사례를 널리 알리고 아래 관련자에 대해서는 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (행정상 통보, 모범사례)

[관련자]

◁◁◁◁

●●●급

ㄹㄹㄹ(모범)

⇒⇒⇒⇒

Σ Σ Σ 급

ㄹㄹㄹ(모범)
