

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목 △△△ 탐방안내소 전면개선 공사 감액 필요

소 관 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△사무소에서는 △△△△△△△을 찾는 탐방객에게 탐방정보 제공 및 탐방프로그램 운영을 통한 △△△△의 다양한 기능 홍보, 탐방서비스 제공의 일환으로 舊청사를 활용하여 [표 1]처럼 △△△ 탐방안내소 전면개선 공사를 발주하여 사업 진행중에 있다.

[표 1] △△△ 탐방안내소 전면개선 공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	사업비(천원)	비고
△△△ 탐방안내소 전면개선 공사	2025. 11. 3. ~ 2026. 6. 30.	- 탐방안내소 리모델링 공사 1식	991,089	△△ △△시 △△면 △△리777

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사

감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공 기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점


해당 공사의 설계 내역서 등 설계도서를 확인한 결과, 건축공사(토목공정 포함)에서 가설공사 대해 현장 여건을 고려해야 할 사항이 확인되었다.

가설공사 공정 중 아래[그림 1]에서처럼 건물의 평면 위치와 높이를 정확히 설정하기 위해 주로 건축물의 외관선, 기초의 상단 레벨을 표시하는 평규준틀(수평으로 설치된 구조물)과 건물 코너 부분의 수직 및 수평 정렬을 보조하기 위해 건축물의 귀(모서리)부분에 직각형태로 조립된 틀인 귀규준틀을 설치하여 건축물을 대지(大地)에 올바르게 시공될 수 있도록 가설공사를 시행하여야 한다.

그런데 △△△△△△사무소에서 추진 중인 ‘△△△ 탐방안내소 전면개선 공사’의 가설공사에서 중요 공정인 평·귀규준틀 설치 여부를 확인한 결과 기초 공사를 진행하면서 평·귀규준틀을 설치하지 않고 공사를 진행하면서 해당 공정에 대해 현장 실정보고 및 설계변경(감액) 등의 조치를 감사일 현재까지(2026. 4. 10.) 취

하지 않은 채 후속 공정을 진행하고 있는 실정이다.

[그림 1] 평·귀기준틀 상세도

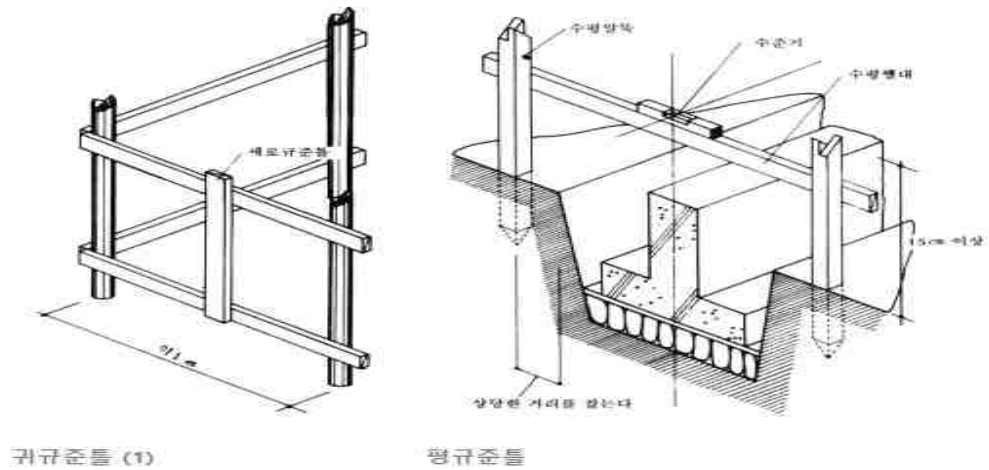

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

다만, 평·귀기준틀 설치 대신 측량기기(광파기기, 레벨기 등)를 활용하여 대지(大地)에 올바르게 기초공사를 진행한 것으로 확인되었다.

위 사항에 대해 아래[표 2]에서처럼 현장 여건에 맞게 적정한 상태로 설계 변경할 경우 총공사비 약 금2,365,100원을 절감할 수 있을 것으로 확인되었다.

[표 2] △△△ 탐방안내소 전면개선 공사 현황

공 종	당 초(천원)	재산정(천원)	차액(천원)
· 순공사비	1,856,975	0	△1,856,975
· 제경비	293,115	0	△293,115
· 부가가치세액	215,010	0	△215,010
· 총공사비	2,365,100	0	△2,365,100

※ 적용내역[수평 기준틀(평, 귀) 내역 삭제]

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지

않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 불필요한 공정 변경 등 현장 여건에 맞게
적정한 상태로 설계 변경하여 공사비 2,365,100원을 감액하도록 조치하시기
바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재
발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)
