

종합감사
공개용

양산부산대학교병원 시설관리팀 감사결과 보고서



2022. 4.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I. 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	3
4. 감사결과 처리	4
II. 감사대상 현황	5
1. 부서운영 분야	5
2. 주요업무 분야 및 현황	7
3. 기타현황	10
III. 감사 결과	12
1. 감사결과 총괄	12
IV. 처분요구와 통보사항	13
1. 처분요구사항 일람표	13
2. 신분상 조치인원 명세	13
3. 처분요구상세	13
가. 공정별 분할계약 부적정	14
나. 시설공사 공사면허 관리 부적절	17
다. 건설기술인 현장배치 사실 미확인	20
라. 시설공사 법정경비 중 환경보전비 미계상	23
마. 시설공사 하자보수 관리미흡	26
바. 공공건축 조성사업 절차 미이행	28
사. 관급자재 직접구매 미이행	30
아. 공공요금관리 및 처리업무 개선	32
자. 유지보수 용역 계약 만료에 따른 계약의뢰 지연에 관한 사항	35
차. 시설공사 시 감염위험도 평가 누락	38
카. 시설관리팀 관련 위원회 규정 미준수	42

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 시설관리팀(이하 ‘시설관리팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2022년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 시설관리팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 시설관리팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 그리고 시설관리팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원의 규정과 정책 등을 준수하는지의 여부, 종전 종합감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 시설관리팀에서 2019. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지 수행한 업무에 한정하여 검토하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2022. 1.28.~ 2. 4.)를 거쳐 2022. 2.7.부터 2022. 2.18.까지 10일간 감사인원 10명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

1) 시설관리팀-265(2022.02.04.) ‘양산부산대학교병원 시설관리팀 종합감사 감사자료 제출’

분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ①주요 업무분야에서는 시설의 기본계획 수립, 설계, 시공, 감독 및 준공 관련 서류 및 전자문서를 검토하였고, ②부서 운영의 적정성을 확인하기 위해 경비정산내역 및 자산운용현황을 점검하였으며, ③복무관리 실태를 점검하기 위하여 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보 시스템인 ‘YES’에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 부당 및 개선사항과 관련하여 시설관리팀으로부터 의견을 듣고 의견을 조정하기 위해 시설관리팀장 등이 참석한 가운데 2022. 2.18.(금) 감사마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2022. 4.15.(금) 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황


1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

시설관리팀은 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 관리 및 재해방지, 안전관리에 관한 업무를 수행하는 부서로서 「양산부산대학교병원 직제 규정」 제11조에 따라 관리국 밑에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, 팀원 10명 등 총 11명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 시설관리팀 조직도

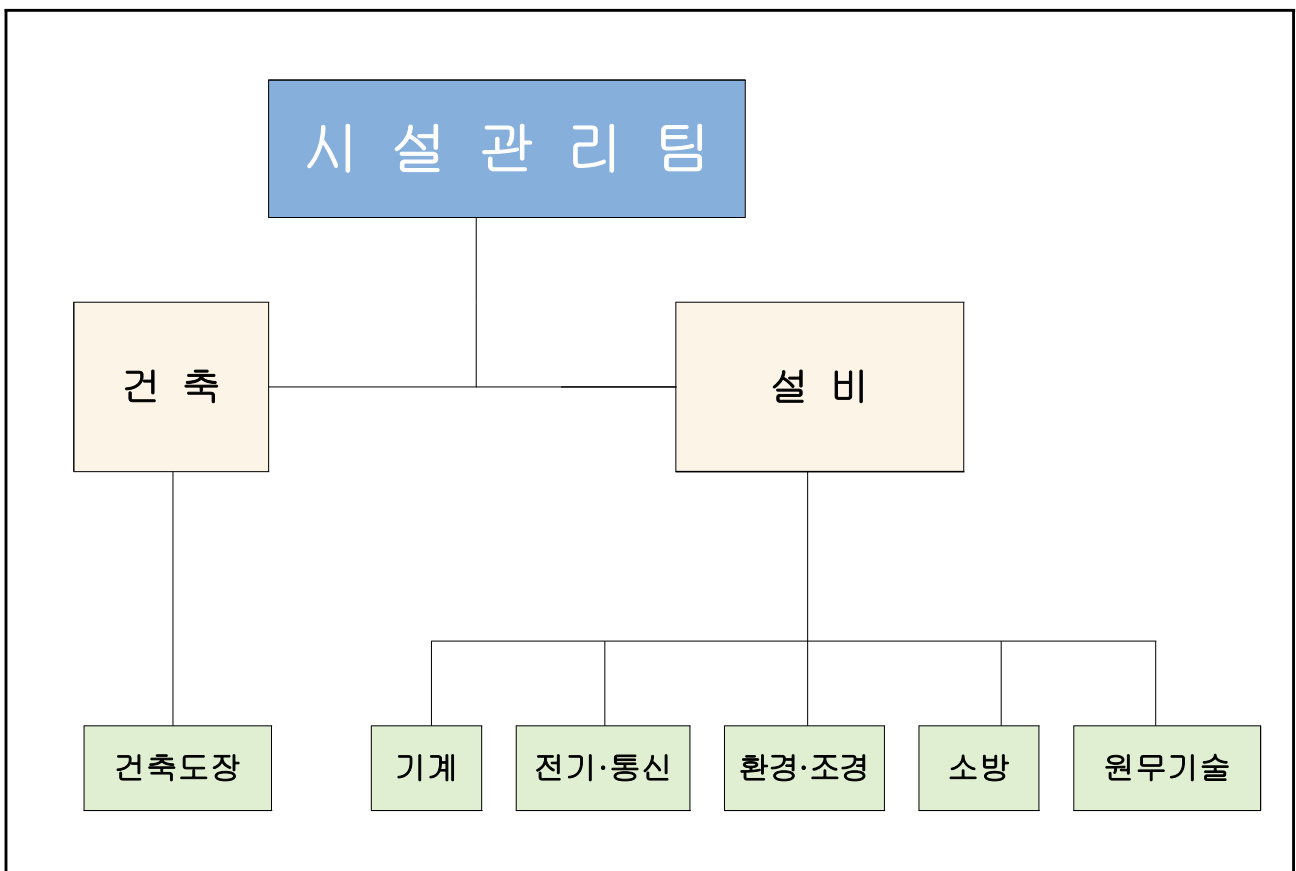

[표 1] 시설관리팀 인력 현황

연도	구분		2급	3급	4급	5급	6급	8급	소계	계약직	총계
2019	일반직	시설직	1	3	1	2	2		9		9
		원무기술직						1	1	1	2
2020	일반직	시설직	1	3	1	3	1		9		9
		원무기술직						1	1	1	2
2021	일반직	시설직	1	3	1	3	1		9		9
		원무기술직						1	1	1	2

나. 부서예산 현황

최근 3년간 시설관리팀의 예산 배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 시설관리팀 예산집행 현황

(단위: 원, %)

연도	예산액	집행액	잔액	집행률(%)	비고
2019	45,851,325,322	21,796,049,159	24,055,276,173	48%	
2020	32,710,289,845	8,452,377,218	24,257,912,627	26%	
2021	33,084,178,383	9,856,878,059	23,227,300,324	30%	

※ 예산 집행률이 70% 이하 사유

- 시설공사 추진계획 중에 예산을 편성 하였으나, 코로나 및 기타사항으로 업무를 추진하지 않은 시설공사의 예산 잔액 발생
- 전기요금, 상하수도 사용료, 난방비 및 도시가스사용료 등 공과금 항목을 예산에 편성하였으나 예산합의를 승인하지 않고 서면으로 공과금 지출을 요청하는 등 예산업무 처리가 부적절하게 진행됨(처분요구사항 8. 업무개선 조치 함.)

2. 주요업무 분야 및 현황

가. 주요업무 내용

시설관리팀의 주요업무는 [표 3]과 같다.

[표 3] 시설관리팀 주요업무

- 1) 시설의 기본계획 수립, 설계, 시공, 감독 및 준공에 관한 사항
- 2) 방화·방재·소방 및 안전관리 업무에 관한 사항
- 3) 시설물의 보수 및 수리에 관한 사항
- 4) 각종 시설물의 안전사고 예방점검 및 수리에 관한 사항
- 5) 적출물 관리에 관한 사항
- 6) 각종 설비용역에 대한 행정 및 지휘·감독에 관한 사항
- 7) 교환시설의 관리에 관한 사항
- 8) 환경보전에 관한 사항
- 9) 소각장 시설의 운영 및 관리에 관한 사항
- 10) 시설물관리기록의 유지에 관한 사항
- 11) 각종 설비의 운전관리 및 운영일지의 기록과 점검에 관한 사항
- 12) 조경공사에 관한 사항

나. 주요사업 추진실적

최근 3년간 시설관리팀의 주요사업 추진실적은 [표 4]와 같다.

[표 4] 시설관리팀 주요사업 추진실적

연도	주요 공사	추진목표	목표대비 수행율(%)		미비사유	비고
2019	의생명창의연구동 건립공사	1) 공기 : 365일 (2018.02.21.~2019.02.20.)	공기	405일 90%	변압기 증설에 따른 시운전 및 마감공사 지연	
		2) 원가 19,429,257,356원	실행 금액	198.1억 98%	설계변경 및 물가변동 미반영	
	직원 기숙사 건립공사	1) 공기 : 334일 (2018.04.20.~2019.03.19.)	공기	347일 96%	변압기 증설에 따른 시운전 및 마감공사 지연	
		2) 원가 10,184,294,025원	실행 금액	103.4억 98%	설계변경 및 물가변동 미반영	

연도	주요 공사	추진목표	목표대비 수행율(%)		미비사유	비고
	추가부지 기반조성공사	1) 공기 : 304일 2018.07.16.~2019.05.15.	공기	304일 100%	설계변경 및 물가변동 미반영	
		2) 원가 2,693,472,500원	실행 금액	28.7억 94%		
	주사실, 항암주사실, 의공실 시설변경 및 재배치공사	1) 공기 : 160일 (2019.07.19.~2019.12.25.)	공기	160일 100%		
		2) 원가 640,229,780원	실행 금액	5.86억 109%		
	의생명창의연구동 3층 입주기업 공간 마감공사	1) 공기 : 80일 (2019.10.28.~2020.01.15.)	공기	80일 100%		
		2) 원가 995,400,000원	실행 금액	9.60억 104%		
	항암조제로봇 도입에 따른 특수조제실 시설 변경 설계용역	1) 공기 : 60일 (2019.11.11.~2020.01.09.)	공기	60일 100%		
		2) 원가 39,134,968원	실행 금액	3,913만 100%		
	제2변전실 건립 설계용역	1) 공기 : 70일 (2019.09.16.~2019.11.24.)	공기	70일 100%		
		2) 원가 38,400,000원	실행 금액	3,840만 100%		
2020	병원 외부청소 및 실리콘 보수작업	1) 공기 : 60일 (2019.11.11.~2020.01.09.)	공기	80일 100%		
		2) 원가 113,142,680원	실행 금액	1.11억 102%		
	교수연구행정동 3층 변경공사	1) 공기 : 120일 (2020.01.06.~2020.05.04.)	공기	120일 100%		
		2) 원가 1,073,444,630원	실행 금액	10.32억 100%		
	어린이병원 조경시설 보수공사	1) 공기 : 136일 (2020.08.18.~2020.12.31.)	공기	177일 77%	업체 공사 지연	
		2) 원가 174,833,900원	실행 금액	1.67억 105%		
	제2변전실 건립공사	1) 공기 : 240일 (2020.08.10.~2021.04.06.)	공기	240일 100%		
		2) 원가 2,087,030,430원	실행 금액	20.42억 102%		
	특수조제실 시설변경 및 재배치 공사	1) 공기 : 240일 (2020.08.10.~2021.04.06.)	공기	240일 100%		
		2) 원가 1,389,185,051원	실행 금액	13.07억 106%		
	주출입구 시설개선 공사	1) 공기 : 217일 (2020.11.26.~2021.06.30.)	공기	217일 100%		
		2) 원가 1,593,314,800원	실행 금액	15.93억 100%		

연도	주요 공사	추진목표	목표대비 수행율(%)		미비사유	비고
2021	제2변전실 건립공사	1) 공기 : 240일 (2020.08.10.~2021.04.06.)	공기	240일 100%		
		2) 원가관리 2,087,030,000원	실행 금액	20.42억 102%		
	특수조제실 시설변경 및 재배치공사	1) 공기 : 240일 (2020.08.10.~2021.04.06.)	공기	240일 100%		
		2) 원가관리 1,389,180,000원	실행 금액	13.07억 106%		
	주출입구(4개소) 개선공사	1) 공기 : 150일 (2020.11.26.~2021.04.24.)	공기	67일 연장 69%	코로나19로 인한 해외 생산 지연	
		2) 원가관리 1,593,310,000원	실행 금액	15.33억 104%		
	무정전전원공급장치 구매설치	1) 공기 : 51일 (2021.05.10.~2021.06.29.)	공기	51일 100%		
		2) 원가관리 844,590,000원	실행 금액	8.45억 100%		
	진단검사의학과 TLA 도입 부대공사 및 안클리닉 시설변경공사	1) 공기 : 70일 (2021.09.06.~2021.11.14.)	공기	35일 연장 67%	의료장비 반입일정에 따른 유저요청	
		2) 원가관리 943,560,000원	실행 금액	8.78억 107%		

다. 부서운영경비 사용 현황

최근 3년간 시설관리팀의 부서운영경비 사용 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] 시설관리팀 부서운영경비 사용 현황

(단위: 천원, %)

연도 업무추진비내역	2019			2020			2021		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	3,530	3,623	102.6%	3,600	3,629	100.8%	4,050	4,050	100%

3. 기타 현안 사항


양산부산대학교병원은 2008년 준공 후 시설 사용연수가 경과함에 따라 시설물의 노후화로 인한 환경개선의 수요 증가로 시설관리팀 업무량이 꾸준히 증가하고 있다. 또한, 유희부지의 지속적인 개발로 건축물의 신·증축이 지속적으로 이루어져 시설관리 총면적이 증가하고 있으며 현재도 경남권역 감염병 전문병원 건립 공사가 설계 진행 중에 있다.

[표6]최근 3년간 양산부산대학교병원 시설관리 면적 증가 추이

연 도	2019년	2020년	2021년	비 고
건물 동 수	11동	14동	14동	503.2㎡ 증축공사 진행 중 24,450㎡ 증축 설계 중
연면적(㎡)	156,346.6㎡	175,878.9㎡	175,878.9㎡	
연면적 비율(%)	100%	112.5%	112.5%	

그 결과 [그림2]와 같이 1인당 시설관리 면적이 19,452.1㎡으로 국립대병원 중 가장 많은 수치로 업무의 효율성과 안전한 시설물 관리를 위해 여러 차례 인원증원을 요청하였으나 인원 증원이 받아들여지지 않고 있는 실정이다.

[그림2]국립대학병원 시설관리팀 인원 및 면적 현황

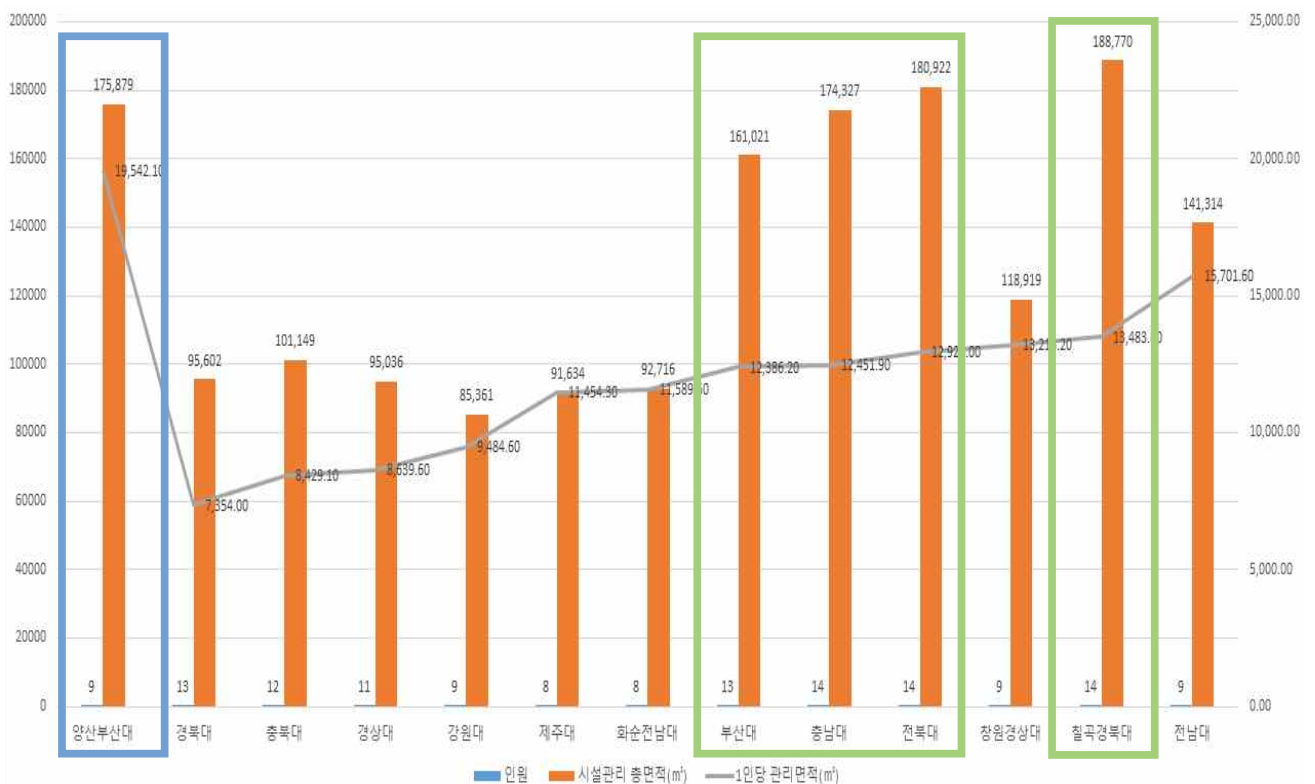

최근 사회 전반에 걸쳐 시설물관리 안전사고(화재, 붕괴 등)발생으로 관련 법령을 강화하며, 기관별 안전 시스템이 강화되고 있으나, 시설관리팀에는 소방 전문 담당자 없이 시설관리팀장이 겸무로 소방관련 업무를 처리하는 등 안전관리에 취약한 부분을 개선하기 위해서도 인원이 증원되어야 할 필요가 있다.

III 감사결과

감사결과 총괄

감사결과 총 11건의 부당·개선 사항이 확인되었으며, 이를 처분요구 종류별로 구분하면 [표7]과 같다.

[표7] 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
11		4			2	2(4)		2	4	3						

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

□ 수의계약에 따른 문제점

- ① 시설관리팀은 단일 공사로서 설계서등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할할 수 없으나, 최근 3년간 6건의 공사에서 공사량을 분할하여 수의 계약을 실시함.
- ② 시설관리팀은 각종 공사를 실시하면서 전문공사 면허가 등록되지 않은 업체와 공사를 진행하여 공사의 안전 및 품질관리가 미흡함.
- ③ 시설관리팀은 건설기본법에 따라 공사 시 건설기술인을 현장에 배치하고 배치 사실에 대한 확인을 받아야 하지만 최근 3년간 31건에 대하여 건설기술인의 현장배치 사실을 미확인함.

□ 행정관리 미흡

- ① 시설관리팀은 시설물관리 용역계약 요청 시 계약 방법에 따라 계약 준비를 위한 시간을 고려하여 계약 종료 전에 계약을 의뢰하여야 하지만 대부분 계약 만료 1개월 이전에서 계약 만료일이 지나고 나서 물류관리팀으로 계약을 요청하는 등 관련업무 진행에 효율성을 저하시킴.
- ② 시설관리팀은 의료기관 내 모든 공사 진행 시 감염위험도 평가를 실시하여야 하지만 최근 3년간 실시한 공사 중 54건에 대하여 감염위험도평가를 미 실시 함.

이에 대하여 시설관리팀에 공정별 분할계약 부적정에 따른 대안을 마련하도록 시정요구 하는 등 총 11건의 감사결과를 처분요구 하였다.

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	양산병원 시설관리팀	공정별 분할계약 부적정	주의 및 시정		2	처분 후 2개월내	
2	"	시설공사 공사면허 관리 부적절	주의 및 시정		2	"	
3	"	건설기술인 현장배치 사실 미확인	권고			"	
4	"	시설공사 법정경비 중 환경 보전비 미계상	권고			"	
5	"	시설공사 하자보수 관리 미흡	통보			"	
6	"	공공건축 조성사업 절차 미이행	통보			"	
7	"	관급자재 직접구매 미이행	권고			"	
8	"	공공요금관리 및 처리업무 개선	개선			"	
9	"	유지보수 용역 계약 만료에 따른 계약의뢰 지연에 관한 사항	개선			"	
10	"	시설공사 시 감염위험도 평가 누락	권고			"	
11	"	시설관리팀 관련 위원회 규정 미준수	통보			"	

2. 신분상 조치인원 명세

제목	처분내역			
	조치결과	소속	직급	성명
공정별 분할계약 부적정	주의	양산부산대학교병원 시설관리팀	시설 2급	◇◇◇
		양산부산대학교병원 물류관리팀	행정 3급	△△△
시설공사 공사면허 관리 부적절	주의	양산부산대학교병원 시설관리팀	시설 2급	◇◇◇
		양산부산대학교병원 물류관리팀	행정 3급	△△△

3. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

주의 및 시정요구

제 목 공정별 분할계약 부적정

소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀, 부산대학교병원 인력개발팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령(판단근거)

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제68조(공사의 분할계약금지) 1항 동일 구조물 공사 및 단일 공사로서 설계서등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 시설관리팀에서 시행한 공사를 확인한 결과 [표1]과 같이 단일공사에 대하여 공사량을 분할하여 수의 계약한 사실을 확인하였다.

이는 수의계약을 위한 분할계약으로 의심될 여지가 있어 공공기관이 지켜야 할 공정한 절차를 준수하여 업무를 진행했다고 판단하기 어렵다.

[표1] 공정별 분할계약 내역 (2019년~2021년)

(단위: 천원)

No	연도	사업명	업체명	준공금액	준공일	비고
1	2019	간호간병통합서비스병동 전환을 위한 72, 91병동 시설변경 및 보완공사(통신)	비공개	11,140	2019-12-10	
	2019	간호간병통합서비스병동 전환을 위한 72, 91병동 시설변경 및 보완공사(너스콜)		7,204	2019-12-10	
	2019	간호간병통합서비스병동 전환을 위한 72, 91병동 시설변경 및 보완공사(건축)		12,800	2019-12-10	
	2019	간호간병통합서비스병동 전환을 위한 72, 91병동 시설변경 및 보완공사(자동문)		18,312	2019-12-10	
2	2020	소아수술실 시설 개보수공사(자동문)		11,132	2020-03-10	
	2020	소아수술실 시설 개보수공사(수장)		10,340	2020-03-10	
3	2020	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(금속창호)		18,920	2020-03-29	
	2020	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(설비)		8,580	2020-03-29	
	2020	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(수장)		18,810	2020-03-29	
	2020	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(타일)		17,080	2020-03-29	
4	2021	감염병 전문병원 건립추진단 사무실 배치 및 감염관리실 재배치(수장)		10,700	2021-06-28	
	2021	감염병 전문병원 건립추진단 사무실 배치 및 감염관리실 재배치(창호)		9,400	2021-06-28	
5	2021	51병동 8호실 병실 (4인실1실->2인실2실)변경(수장)		19,350	2021-08-08	
	2021	51병동 8호실 병실 (4인실1실->2인실2실)변경(기계설비)		8,600	2021-08-08	
	2021	51병동 8호실 병실 (4인실1실->2인실2실)변경(창호)		2,134	2021-08-08	
6	2021	성인병동 탕비실 환경개선 가구(싱크) 공사		39,490	2021-11-14	
	2021	성인병동 탕비실 환경개선 창호공사		20,713	2021-11-14	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 공정별 시기를 분할하거나 공사량을 분할하여 수의 계약하는 일이 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항>

양산부산대학교병원장은

단일 공사에 대하여 공사량을 분할하여 수의 계약하는 일이 없도록 철저히
관리하여 주시기 바랍니다.(시정요구)

부산대학교병원장은

같은 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 소홀히 한 부서장에게 [주의] 조
치하여 주시기 바랍니다.(주의)

[관련자] 양산부산대학교병원 관리국 시설관리팀 시설2급 ◇◇◇ 【주 의】

양산부산대학교병원 관리국 물류관리팀 행정3급 △△△ 【주 의】

부 산 대 학 교 병 원

주의 및 시정요구

제 목 시설공사 공사면허 관리 부적절

소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀, 부산대학교병원 인력개발팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령

건설산업기본법 제9조1항, 건설업을 하려는 자는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만 경미한 건설공사는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.[종합공사(5천만원 미만), 전문공사(1천5백만원 미만)]

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 시설관리팀에서 시행한 시설공사 현황을 살펴본 결과 [표1]과 같이 어린이병원, 편의시설동 및 장례식장 장애인 편의시설 공사 외 8건에 대해서 전문공사 면허가 등록되지 않은 업체와 공사를 진행한 사실을 확인하였다.

[표1]공사면허 미등록 업체 현황

No	사업명	업체명	공사면허 등록현황	비고
1	어린이병원, 편의시설동 및 장례식장 장애인편의시설공사	비공개	미등록	
2	간호간병통합서비스병동 전환을 위한 72, 91병동 시설변경및보완공사(자동문)		미등록	
3	중앙진료동,외래진료동, 병동 및 재활병원 장애인편의시설보완공사		미등록	
4	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(금속창호)		미등록	
5	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(수장)		미등록	
6	코로나19 중증환자 전담치료병상 구축 긴급 공사(수장)		미등록	
7	급식관리실 조리원 휴게, 샤워실, 직원교육실 시설개선(건축)		미등록	
8	성인병동 탕비실 환경개선 창호공사		미등록	
9	편의시설동 직원식당 주방 바닥 등 개보수 바닥공사		미등록	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 향후 건설공사 시 공사 면허를 철저히 관리하여 공사의 전반적인 공정, 안전 및 품질 관리가 철저히 이루어질 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항>

양산부산대학교병원장은

공사계약 전 적법한 공사면허를 가진 계약대상자인지를 확인 후 공사를 시행할 수 있도록 철저히 관리하여 주시기 바랍니다.(시정요구)

부산대학교병원장은

같은 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 소홀히 한 부서장에게 [주의] 조치하여 주시기 바랍니다.(주의)

[관련자] 양산부산대학교병원 관리국 시설관리팀 시설2급 ◇◇◇ 【주 의】
양산부산대학교병원 관리국 물류관리팀 행정3급 △△△ 【주 의】

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 건설기술인 현장배치 사실 미확인

소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령

건설산업기본법 제40조①항, 동법 시행령 제8조①항에 따라 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 법령으로 정하는 바에 따라 **건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 하며**, 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인으로 해당 건설공사의 착수와 동시에 배치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

계약상대자는 건설산업기본법에 따라 건설기술인을 현장에 배치하여야 하며,

배치 사실에 대한 발주자의 확인을 받아야 한다. 하지만 [표1]과 같이 양산부산대학교병원 시설관리팀에서 실시한 다수의 건설공사(진단검사의학과 노후 배관 긴급 교체 외 30건)에 건설기술인의 현장배치 사실을 확인하지 않았다.

[표1] 건설기술인 현장배치 미확인 현황

No	사업명	업체명	현장배치 사실확인	비고
1	진단검사의학과 노후 배관 긴급 교체	비공개	X	
2	중앙공급실 멸균기 배수 배관 확장 공사		X	
3	어린이병원, 편의시설동 및 장례식장 장애인편의시설공사		X	
4	간호간병통합서비스병동 전환을 위한 72, 91병동 시설변경 및 보완공사(자동문)		X	
5	신생아집중치료실 병상 조정 관련 시설변경공사		X	
6	케이지 랙 세척기 장비도입에 따른 부대시설(설비)		X	
7	중앙진료동, 외래진료동, 병동 및 재활병원 장애인편의 시설보완공사		X	
8	선형가속기 출입문(1,2치료실) 보수공사		X	
9	의료기관 비감염성 일회용기저귀 보관용 냉장창고 설치공사		X	
10	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(금속창호)		X	
11	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(수장)		X	
12	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(타일)		X	
13	병동 고층부 급탕열교환기 교체설치공사		X	
14	MICU 격리실 시설개선공사(자동제어)		X	
15	어린이병원 다인실 냉장고장 변경 제작 및 설치		X	
16	권역응급의료센터 소생실 및 처치실 음압설비 구축 공사(기계설비)		X	
17	행동발달증진센터 확장 재배치 공사(건축)		X	
18	코로나19 중증환자 전담치료병상 구축 긴급 공사(기계설비)		X	
19	코로나19 중증환자 전담치료병상 구축 긴급 공사(수장)		X	
20	코로나19 중증환자 전담치료병상 구축 긴급 공사(자동제어)		X	
21	코로나19 중증환자 전담치료병상 구축 긴급 공사(창호)		X	
22	중앙진료동-재활병원 지하1층 연결통로 보수공사		X	
23	CS/GSICU 배수배관 교체 공사		X	
24	51병동 8호실 병실 (4인실1실->2인실2실)변경(수장)		X	
25	급식관리실 조리원 휴게, 샤워실, 직원교육실 시설개선(건축)		X	
26	병원 외부 코킹공사		X	
27	성인병동 탕비실 환경개선 가구(싱크) 공사		X	
28	성인병동 탕비실 환경개선 창호공사		X	
29	장애친화 건강검진기관 점검결과에 따른 탈의실 개선 건축공사		X	
30	편의시설동 직원식당 주방 바닥 등 개보수 바닥공사		X	
31	행동발달증진센터 음악치료실 방음 인테리어 및 53병동 보호실 공사		X	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 향후 건설공사 시 건설산업기본법에 따라 건설기술인을 현장에 배치하고, 현장배치 사실을 확인받아 철저히 관리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

건설공사 시 건설기술인을 현장배치하고 그 사실을 확인할 수 있도록 관련부서와 협의하여 효율적인 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 시설공사 법정경비 중 환경보전비 미계상

소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령(판단근거)

건설기술진흥법 제66조(건설공사의 환경관리), 건설산업기본법 제2조(건설공사의 정의)에 따라 건설공사 시 건설공사의 발주자는 **건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 한다.**

3. 감사결과 확인된 문제

건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 환경관리비라고 하며 환경관리비는 폐기물처리비와 환경보전비로 구성된다. 양산부산대학교병원 시설관리팀에서

2019년부터 2021년까지 실시한 시설공사 내역을 확인한 결과 [표1]과 같이 간호간병 통합서비스 병동전환을 위한 72, 91병동 시설변경 및 보완 공사 외 48건의 수의계약 공사에서 환경보전비가 미계상된 사실을 확인하였다.

[표1]환경보전비 미계상 현황

구분	연도	사업명	계약방법
1	2019	간호간병 통합서비스 병동전환을 위한 72, 91병동 시설변경 및 보완 공사	수의계약(견적)
2	2019	기숙사 스크린 도어 설치 공사	수의계약(제조사)
3	2019	신생아집중치료실 병상 조정 관련 시설변경 공사	수의계약(견적)
4	2019	어린이병원, 편의시설동 및 장례식장 장애인 편의시설 공사	수의계약(견적)
5	2019	외래진료동 5층 건강증진센터 천장 누수 보수 공사	수의계약(견적)
6	2019	원내 방충망 교체 공사	수의계약(견적)
7	2019	의료가스실 진공펌프 교체 공사	수의계약(견적)
8	2019	정신건강클리닉 외래진료실 비상탈출문 설치 공사	수의계약(견적)
9	2019	중앙공급실 멸균기 배수 배관 확장 공사	수의계약(견적)
10	2019	중앙진료동 1층 원무팀 원무창구 칸막이 설치 공사	수의계약(견적)
11	2019	중앙진료동,외래진료동, 병동 및 재활병원 장애인편의시설 보완 공사	수의계약(견적)
12	2019	진단검사의학과 노후 배관 긴급 교체 공사	수의계약(견적)
13	2019	케이지 랙 세척기 장비도입에 따른 부대시설 공사	수의계약(견적)
14	2020	MICU 격리실 시설 개선 공사	수의계약(견적)
15	2020	권역응급의료센터 소생실 및 처치실 음압설비 구축 공사	수의계약(견적)
16	2020	냉각탑(Cooling Tower) 베어링 노후화로 인한 교체 공사	수의계약(견적)
17	2020	물류배송설비(기송관) 증설 공사	수의계약(제조사)
18	2020	병동 고층부 급탕열교환기 교체설치 공사	수의계약(견적)
19	2020	선형가속기 출입문(1,2치료실) 보수 공사	수의계약(견적)
20	2020	소아수술실 시설 개보수 공사	수의계약(견적)
21	2020	어린이병원 다인실 냉장고장 변경 제작 및 설치 공사	수의계약(견적)
22	2020	오믹스머신러닝센터 구축 공사	수의계약(견적)
23	2020	외래진료동 3층 비뇨생식기클리닉 방광경실 환경개선 공사	수의계약(견적)
24	2020	원내 방충망 교체	수의계약(견적)
25	2020	원내 보도블럭 및 수목 경계석 보수 공사	수의계약(견적)
26	2020	의료기관 비감염성 일회용기저귀 보관용 냉장창고 설치공사	수의계약(견적)
27	2020	의생명창의연구동 스크린도어 설치 공사	수의계약(제조사)
28	2020	재활병원 수치료실 리프트 철거 공사	수의계약(견적)
29	2020	재활병원 수치료실 시설 개보수 공사	수의계약(견적)
30	2020	컨베이어시스템 C2-LIFTER 보완(교체) 및 수리 공사	수의계약(제조사)
31	2020	하절기 냉방용 빙축열 시스템 일반정비 공사	수의계약(제조사)
32	2020	행동발달증진센터 확장 재배치 공사	수의계약(견적)
33	2020	흡수식냉온수기 1호 고온재생기 교체 공사	수의계약(제조사)
34	2021	51병동 8호실 병실 (4인실1실->2인실2실)변경 공사	수의계약(견적)

구분	연도	사업명	계약방법
35	2021	CS/GSICU 배수배관 교체 공사	수의계약(견적)
36	2021	감염병 전문병원 건립추진단 사무실 배치 및 감염관리실 재배치 공사	수의계약(견적)
37	2021	급식관리실 조리구역 바닥마감 개선 공사	수의계약(견적)
38	2021	급식관리실 조리원 휴게, 샤워실, 직원교육실 시설개선 공사	수의계약(견적)
39	2021	병원 외부 코킹공사	수의계약(견적)
40	2021	성인병동 탕비실 환경개선 가구(싱크)/창호 공사	수의계약(견적)
41	2021	영상의학과 내 출입문 시설 변경 공사	수의계약(견적)
42	2021	외래 진료환경 개선을 위한 이비인후클리닉 진료실 슬라이딩도어설치 공사	수의계약(견적)
43	2021	원내 화장실 양변기 시트 및 커버 900개 교체 공사	수의계약(견적)
44	2021	장애친화 건강검진기관 점검결과에 따른 탈의실 개선 건축공사	수의계약(견적)
45	2021	장애친화 건강검진기관 점검결과에 따른 탈의실 개선공사 장비이설	수의계약(제조사)
46	2021	중앙진료동-재활병원 지하1층 연결통로 보수 공사	수의계약(견적)
47	2021	편의시설동 직원식당 주방 바닥 등 개보수 바닥 공사	수의계약(견적)
48	2021	하절기 냉방용 빙축열시스템 일반정비 공사	수의계약(제조사)
49	2021	행동발달증진센터 음악치료실 방음 인테리어 및 53병동 보호실 공사	수의계약(견적)

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 향후 시설공사 시 법정경비 항목인 환경보전비를 계상하여 공사를 진행할 수 있도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

시설공사 시 법정경비 항목인 환경보전비를 계상하여 공사를 진행할 수 있도록 관련부서와 협의하여 효율적인 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 시설공사 하자보수 관리 미흡
소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀
조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀
내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령(판단근거)

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제60조(공사계약의 하자담보 책임기간) 및 제61조(하자검사), 공사계약 일반조건 제35조에 따라 시설공사 준공 후 하자담보책임기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하고, 하자담보책임기간 만료 14일 전부터 만료일까지 최종검사를 실시하여야 하며, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수 완료확인서를 계약대상자에게 발급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 하자검사조서와 하자보수 관리대장을 비치하여 하자보수관리 업무를 수행하고 있으나, 발견된 하자의 이행여부(결과보고 등) 및 하자보수완료확인서를 계약대상자에게 미발급한 사실을 아래 [표1]과 같이 확인하였다.

[표1] 하자보수 완료확인서 미발급 현황

년도	하자보수 실시 건수	하자검사 조서여부	하자이행 결과 확인 및 완료 확인서 발급 여부	비고
2019	추가부지 부대토목 및 조경공사 외 7건	실시	미실시	
2020	의생명연구동 건립공사(건축/토목/기계/기계소방) 외 32건	실시	미실시	
2021	의생명창의연구동 3층 입주기업 공간 마감 공사 (건축/토목/기계/기계소방) 외 47건	실시	미실시	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 현재 시행하고 있는 하자검사조서 및 하자보수 관리대장을 지속적으로 관리하며 발견된 하자의 이행여부에 대한 결과 보고 및 하자보수 완료 확인서를 계약대상자에게 발행하여 하자보수 관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

하자보수 진행 시 이행여부에 대한 결과 보고 및 하자보수 완료확인서를 계약대상자에게 발급하여 하자보수 관리에 만전을 기해주시기 바랍니다.(통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 공공건축 조성사업 절차 미이행

소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령(판단근거)

건축서비스산업진흥법 제22조의2(공공건축 건축기획의 수행 등), 제22조의3(공공건축심의위원회), 제23조(공공건축 사업계획에 대한 사전검토 등), 제24조(공공건축지원센터)

- 시행시기: [본조신설 2018.12.18.], [시행일 공포 후 1년이 경과한 날]
- 공공건축 조성사업 절차

설계비 추정가격	건축기획업무①	사업계획사전검토②	공공건축심의③	설계공모④
5천만원 미만	필수	×	선택	선택
5천~1억원 미만	필수	×	필수	선택
1억원 이상	필수	필수	필수	의무(우선적용)

3. 감사결과 확인된 문제

공공기관은 건축 서비스 산업의 활성화와 공공 건축의 품격을 향상시키기 위하여 발주하고자 하는 건축물 등의 특성, 규모 및 사업비 등을 고려하여 적합한 발주방식을 선정하여야 한다. 하지만 양산부산대학교병원 시설관리팀에서 시행한 시설공사 현황을 살펴본 결과 법령에서 정한 건축기획업무의 미이행 및 설계용역업체 선정 과정에 있어 공공건축심의위원회를 통한 공공건축심의가 이루어지지 않은 사실을 [표1]과 같이 확인하였다.

[표 1] 공공건축조성사업 절차 미준수 현황

용역명	계약일자	설계비(공고)	미이행 항목
부속시설 증축 및 시설배치 공사	2020.07.27	99,503천원	①건축기획업무 ③공공건축심의
경남권역 감염병 전문병원 건립공사	2021.02.18	4,266,000천원	③공공건축심의

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 공공기관으로서의 건축물 등 건축의 공공적 가치를 구현할 수 있도록 공공건축 조성사업 절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

공공건축조성사업 시 건축기획업무, 사업계획사전검토, 공공건축심의 및 설계공모 등 공공건축조성사업 절차에 맞게 시설공사를 진행하여 주시기 바랍니다.(통보)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 관급자재 직접구매 미이행
소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀
조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀
내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령(판단근거)

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조(공사용 자재의 직접 구매 증대) 제3항, 같은 법 시행령 제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등)에 따라 40억 이상 종합공사, 3억 이상 전문공사 시행 시 공사에 사용될 관급자재의 추정가격이 4천만원 이상인 경우 제품을 직접 구매하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 시설관리팀에서 2019년부터 2021년까지 시행한 시설공사를 확인한 결과 [표1]과 같이 의생명연구동 건립공사(건축/토목/기계/기계

소방) 외 7건에 공사에서 관급자재를 직접 구매하지 않은 사실을 확인하였다.

[표1] 관급자재 직접 미구매 현황(2019년~2021년)

No	연도	사업명	업체명	공사 구분	비고
1	2019	의생명연구동 건립공사 (건축/토목/기계/기계소방)	비공개	종합공사 (40억 이상)	
2	2019	의생명연구동 건립공사(전기/전기소방)		전문공사 (3억 이상)	
3	2019	의생명연구동 건립공사(통신)		전문공사 (3억 이상)	
4	2019	기숙사 건립공사(건축/토목/기계)		종합공사 (40억 이상)	
5	2019	기숙사 건립공사(전기)		전문공사 (3억 이상)	
6	2019	기숙사 건립공사(통신)		전문공사 (3억 이상)	
7	2020	제2변전실 건립공사(전기)		전문공사 (3억 이상)	
8	2021	양산부산대학교병원 부속시설 증축 및 시설 재배치 공사(전기)		전문공사 (3억 이상)	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 관련 법령이 정한 시설공사에 대하여 관급자재를 직접 구매하여 공사를 진행하도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

40억 이상 종합공사, 3억 이상 전문공사 시행 시 공사에 사용될 관급자재의 추정가격이 4천만원 이상인 경우 제품을 직접 구매할 수 있도록 관련부서와 협의하여 효율적인 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 공공요금관리 및 처리업무 개선

소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전 관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관계규정(판단근거)

「사무관리규정」 제4조(문서의 성립 및 효력)에 따르면 문서는 다른 특별한 규정이 없는 한 당해 문서에 대한 서명(전자문서명포함)에 의한 결재가 있음으로써 성립하며, 문서가 수신자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생하는 도달주의를 원칙으로 하며, 「부산대학교병원 위임전결규정」 제11조(협의) ①항에 따라 제3조의 직무권한을 행사함에 있어서 다른 부서와 관련되어 협조를 필요로 하는 사항은 당해 부서장과의 협의를 거쳐야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

현재 매월 발생하는 전기료, 상하수도료, 난방사용료, 전화사용료의 공공요금
이 담당자의 확인을 거쳐 전자문서가 아닌 지로용지만 회계관리팀으로 직접
전달하고 있으며, 입점업체(새마을금고, 농협, 할리스 등), 치과병원 및 한방
병원의 공공요금 사용 상세내역서 또한 사내 메신저를 통해 회계관리팀에서
내용을 전달하고 있다. 시설관리팀에서는 공공요금 정산 업무처리 시에는 관
련 규정에 맞게 내부 결재와 같은 보고 절차를 준수하여 업무를 수행할 수
있도록 업무처리 방법을 개선할 필요가 있다.

[표1] 연도별 공공요금 납부현황

(원)

년도(발생기준)	전기요금	상하수도료	난방사용료	전화사용료	비고
2019년	4,356,251,770	1,429,722,570	606,474,350	225,201,579	
2020년	4,527,071,010	1,599,636,060	746,646,940	267,613,695	
2021년	4,845,428,460	1,392,446,330	775,830,280	291,025,293	
계	13,728,751,240	4,421,804,960	2,128,951,570	783,840,567	

4. 관계기관 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 관련 규정을 준수하여 타부서와 관련된 공공요금 납부요청
등은 전자문서로 업무를 처리하여 업무관리에 만전을 다하겠다는 의견을 제시
하였다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

공공요금납부에 관련된 납부고지서, 예산합의승인서, 입점업체사용액 등의
첨부 문서를 부서장의 확인 후 전자문서로 해당부서에 전달될 수 있도록 업
무를 개선하시기 바랍니다.(개선)

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 유지보수 용역 계약 만료에 따른 계약의뢰 지연에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관계법령(판단근거)

병원 내 시설물, 기계장치, 의료폐기물, 소방시설물 등 각종 시설관리에 관한 유지보수 용역계약을 체결하기 위해 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률을 기본으로 폐기물관리법, 화재예방 소방시설 설치 및 유지 안전관리에 관한 법률, 승강기시설 안전관리법 등 각 용역별 그에 따른 법률에 적용 받는다. 시설관리팀에서 각 용역별 관련 법률에 의거 유지보수 용역계약을 물류관리팀에 의뢰하고 물류관리팀에서는 계약내용을 검토하여 입찰 및 수의로 계약을 체결하고 업체는 계약기간 동안 용역을 이행한다.

3. 감사결과 확인된 문제

각종 시설물관리 용역계약은 물류관리팀에서 계약 진행에 앞서 계약 방법에 대한 검토와 입찰 과정에 필요한 시일과 계약된 업체가 용역을 이행하기 위한 준비시간 등이 보장되어야 한다. 그러나 2019년부터 2021년까지 유지보수용역 계약 현황을 확인한 결과 [표1]과 같이 대부분이 계약 만료가 한 달도 남지 않은 시점이거나 혹은 계약이 만료되고 나서 물류관리팀으로 계약을 요청하였으며, 시설관리팀의 요청에 따라 대부분 수의계약으로 체결되었음이 확인되었다. 물론 수의계약은 각각의 사유서는 첨부되어 진행되었지만, 시설물관리 용역계약의 특성상 시일이 촉박할 경우 물류관리팀에서 계약의 방법을 충분히 검토할 시간이 부족하여 계약금액에 대한 협상에서도 불리하게 작용 될 수 있으며 계약업체 또한 계약이행 준비에도 영향이 있을 수 있다.

[표1] 유지보수용역 계약현황

순번	시설물 관리내용	업체명	계약기간	금액(원)	계약 방법	계약 의뢰일자	비고 (만료일기준)
1	시설물관리	비공개	2019.01.01 ~ 2019.06.30	203,927,922/월	수의	2019.01.02	계약 만료일 초과
			2019.07.01 ~ 2019.12.31	230,224,882/월	수의	2019.06.14	16일 전
			2020.01.01 ~ 2020.06.30	240,606,431/월	수의	2019.12.30	1일 전
			2020.07.01 ~ 2020.12.31	240,606,431/월	수의	2020.06.03	27일 전
			2021.01.01 ~ 2021.06.30	250,035,115/월	수의	2020.12.29	2일 전
			2021.07.01 ~ 2021.12.31	250,035,115/월	수의	2021.06.25	5일 전
2	승강기유지보수		2018.02.28 ~ 2020.2.29	13,751,326/월	입찰	2018.02.08	19일 전
			2020.03.01 ~ 2022.2.28	15,072,704/월	입찰	2020.02.11	17일 전
3	통합배선 및 교환기 MDF 기계장치 유지관리		2018.06.01 ~ 2021.05.31	8,118,100/월	수의	2018.05.29	2일 전
			2021.06.01 ~ 2024.05.31	9,050,000/월	수의	2021.05.27.	4일 전
4	UPS유지보수		2018.03.01~ 2020.01.31	1,652,180/월	입찰	2018.01.04	27일 전
			2020.02.01.~ 2022.01.31	1,540,629/월	입찰	2020.01.13	18일 전
5	물류배송설비		2019.01.01 ~ 2019.12.31.	14,000,000/월	수의	2019.01.03	계약 만료일 초과
			2020.01.01 ~ 2020.12.31.	14,000,000/월	수의	2019.12.30	1일 전
			2021.01.01 ~ 2021.04.30	14,000,000/월	수의	2020.12.29	2일 전

			2021.05.01 ~ 2022.04.30	27,225,000/월	입찰	2021.04.01.	29일 전
6	자동제어설비		2017.12.01 ~ 2019.11.30	2,750,000/월	수의	2019.11.01	29일 전
			2019.12.01 ~ 2021.11.30	2,750,000/월	수의	2019.10.31	30일 전
7	출입통제시스템 유지보수		2019.01.01 ~ 2021.12.31	2,852,000/월	수의	2019.01.28	계약 만료일 초과
8	방사선동위원소 보관장소 무인경비시스템		2017.10.01. ~ 2020.09.30	165,000/월	수의	2017.09.22	8일 전
			2020.10.01. ~ 2023.09.30	165,000/월	수의	2020.09.21	9일 전
9	의료폐기물 위탁처리 용역		2018.02.01~ 2020.01.31	730원/kg	입찰	2017.12.20.	42일 전
			2020.02.01~ 2022.01.31	780원/kg	입찰	2019.12.30	32일 전
10	소방시설 소방안전관리 용역		2018.11.01~ 2020.10.31	2,565,200원/월	입찰	2018.10.02	29일 전
			2020.11.01~ 2022.10.31	2,846,610원/월	입찰	2020.10.07	26일 전
11	폐수처리슬러지 위탁처리용역		2019.11.01~ 2020.10.31	605,000원/톤	수의	2019.10.14	17일 전
			2021.01.15~ 2022.01.14	605,000원/톤	수의	2020.12.24	19일 전

4. 관계기관 등 의견 및 검토결과

유지보수 용역계약에 대한 계약의뢰가 상당히 지체되었음을 인정하고 향후 물류관리팀 및 관련 부서와 협의하여 계약 만료 2개월 전에 계약의뢰를 요청하도록 업무관리에 만전을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

유지보수 용역계약 만료 시 관련부서에서 안내한 기한(관련문서: 물류관리팀 -715(2022.02.14.) ‘계약 및 입찰 요청안내’ 수의계약 1개월, 입찰 2개월) 내에 재계약이 요청될 수 있도록 업무를 개선하시기 바랍니다.(개선)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 시설공사 시 감염위험도 평가 누락

소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전 관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련정책(판단근거)

양산부산대학교병원 건축과 개보수 관련 감염관리 정책(정책번호 IC-24)에 따르면 병원 내 공사 시 미생물과 분진의 확산을 막음으로써 **환자 뿐 아니라** 직원과 방문객, 장비와 기구 등을 공사 관련 분진이나 기타 오염물로부터 보호하기 위하여 의료기관 내 시행하는 건축 및 개보수 전 작업내용에 대하여 **감염위험도를 평가**하고, 공사 착수 전 공사계획을 첨부하여 감염관리팀으로 감염관리 위험사정을 요청하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 최근 3년간(2019.1.1.~2021.12.31.) 시설관리팀에서 시행한 시설공사 현황(천만원이상)을 살펴본 결과, 감염위험도 평가의 범위를 의료기관 내 시행하는 건축 및 개보수 모두를 포함하도록 규정하고 있음에도 아래 [표 1]과 같이 의생명창의연구동 3층 입주기업 공간 마감공사 외 53건에 대하여 감염위험도 평가를 누락한 사실을 확인하였다.

[표1] 천만원이상 시설공사 감염위험도 평가 누락 현황

(단위: 천원)

구분	년도	사업명	계약금액
1	2019	의생명창의연구동 3층 입주기업 공간 마감공사 (건축/기계/기계소방/전기/전기소방/통신)	1,015,825
2	2019	진단검사의학과 노후 배관 긴급 교체	17,600
3	2019	기숙사 스크린 도어 설치	71,200
4	2019	병동환자용 승강기 출입구 출입통제시스템 설치	53,300
5	2019	진단검사의학과 Central UPS연결 케이블 포설 공사	18,000
6	2019	어린이병원, 편의시설동 및 장례식장 장애인편의시설공사	47,000
7	2019	외래진료동 5층 건강증진센터 천장 누수 보수공사	13,200
8	2019	정신건강클리닉 외래진료실 비상탈출문 설치	12,500
9	2019	중앙진료동 1층 원무팀 원무창구 칸막이 설치공사	13,600
10	2019	케이지 랙 세척기 장비도입에 따른 부대시설 공사(설비/전기)	36,030
11	2019	중앙진료동, 외래진료동, 병동 및 재활병원 장애인편의시설보완공사	47,000
12	2020	제2변전실 건립공사(설계용역/전기감리/소방감리/건축/기계/전기/소방)	2,187,575
13	2020	의생명창의연구동 동물실험실 구축관련 부대시설 추가공사(건축/기계/전기)	152,473
14	2020	병원 주출입구 개선공사	1,593,315
15	2020	물류배송설비(기송관) 증설	12,000
16	2020	의생명창의연구동 스크린도어 설치	55,000
17	2020	선형가속기 출입문(1,2치료실) 보수공사	18,308
18	2020	소아수술실 시설 개보수공사(자동문/전기/수장)	29,672
19	2020	재활병원 수치료실 리프트 철거공사	4,180
20	2020	재활병원 수치료실 시설 개보수공사(금속창호/설비/수장/전기/타일)	55,437
21	2020	신규 MRI 장비 도입에 따른 부대시설 공사(감리/소방/전기)	46,681
22	2020	냉각탑(Cooling Tower) 베어링 노후화로 인한 교체	14,149
23	2020	원내 보도블럭 및 수목 경계석 보수공사	11,500
24	2020	터보냉동기, 흡수식냉온수기 일반정비	38,209
25	2020	어린이병원 다인실 냉장고장 변경 제작 및 설치	32,700
26	2020	오믹스머신러닝센터 구축 공사(건축/기계설비/전기/통신)	49,860

구분	년도	사업명	계약금액
27	2020	의생명창의연구동 동물실험실 부대시설 전기공사	35,686
28	2020	중앙진료동 정류기반 노후 밧데리 교체 공사	18,800
29	2021	경남권역 감염병 전문병원 건립공사(설계과업지시서/설계)	4,299,000
30	2021	코로나19 중증환자 전담치료병상 구축 긴급 공사 (CCTV/TAB/기계설비/너스쿨/전기/창호/항온항습기)	289,854
31	2021	임상시험센터 문서보관실 이전에 따른 시설변경공사(소방/전기)	20,990
32	2021	보일러 저녹스 버너 교체 공사	162,354
33	2021	지하주차장 개방에 따른 화재연동출입통제시스템설치	23,100
34	2021	어린이병원 및 장례식장 전기실 정류기반 노후화 밧데리 교체 공사	19,000
35	2021	중앙진료동-재활병원 지하1층 연결통로 보수공사	22,000
36	2021	감염병 전문병원 건립추진단 사무실 배치 및 감염관리실 재배치 (수장/전기/통신/창호)	24,600
37	2021	코로나19관련 출입문 화재연동 출입통제시스템 설치	27,900
38	2021	핵의학과 감마카메라 장비 도입에 따른 검사실 CCTV 설치	2,300
39	2021	핵의학과 감마카메라 장비 도입에 따른 검사실 시설변경 공사 (소방/전기/소방설계/감리용역)	19,950
40	2021	CS/GSICU 배수배관 교체 공사	18,800
41	2021	전기자동차 급속충전시설 설치(CCTV/전기케이블/주차장도색/캐노피설치)	62,585
42	2021	급식관리실 조리구역 바닥마감 개선(바탕보수 및 미끄럼방지바닥마감)	12,900
43	2021	51병동 8호실 병실 (4인실1실->2인실2실)변경(수장/기계설비/전기/창호)	32,194
44	2021	원내 화장실 양변기 시트 및 커버 900개 교체	19,154
45	2021	하절기 냉방용 빙축열시스템 일반정비	33,000
46	2021	흡수식냉온수기 저녹스버너 교체공사	148,132
47	2021	급식관리실 조리원 휴게, 샤워실, 직원교육실 시설개선(건축/기계설비/전기)	35,590
48	2021	영상의학과 내 출입문 시설 변경공사	12,400
49	2021	외래 진료환경 개선을 위한 이비인후클리닉 진료실 슬라이딩 도어 설치 공사	15,250
50	2021	병원 외부 코킹공사	22,000
51	2021	성인병동 탕비실 환경개선 가구(싱크/창호) 공사	60,203
52	2021	주차장 분리운행을 위한 주차관리시스템 부대시설 공사	32,295
53	2021	편의시설동 직원식당 주방 바닥 등 개보수 바닥공사	21,500
54	2021	행동발달증진센터 음악치료실 방음 인테리어 및 53병동 보호실 공사	19,240

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 병원정책을 준수하여 향후 시행되는 시설공사에 대하여 감염위험도 평가가 누락되는 일이 없도록 업무 프로세스를 재정립하여 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

병원정책에 따라 의료기관인증평가 기준을 충족시킬 수 있도록 병원 내 모든 공사에 대하여 감염위험도 평가를 실시하여 위험사정을 해소할 수 있도록 관련부서와 협의하여 효율적인 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (권고)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 시설관리팀 관련 위원회 규정 미준수

소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전 관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련규정(판단근거) 및 감사결과 확인된 문제

가. 시설·환경 안전관리위원회 규정 미준수

양산부산대학교병원 위원회 운영규정 제19조3(시설·환경 안전관리위원회)에 따르면 시설사업 및 환경관련 제반사항을 심의하여 원장의 자문에 응함으로써 병원시설건물의 신·증축, 개·보수공사 및 기존 실방의 조정에 관한 업무와 환경안전관련 제반업무를 원활하게 추진함을 목적으로 **병원시설**의 신·증축 및 이천만원이상 개·보수 공사계획 수립 및 타당성검토에 관한 사항(제19조3의제2항제2호) 등을 심의하도록 되어있다.

이와 관련하여 최근 3년간(2019.1.1.~2021.12.31.) 시설관리팀에서 시행한 2천만원이상 공사현황을 살펴본 결과 [표 1]과 같이 2천만원 이상 공사임에도 시설·환경안전관리위원회의 심의를 거치지 않고 시행한 사실을 확인하였다.

[표 1] 시설·환경안전관리위원회 심의 누락 현황(2천만원 이상 공사) (단위:천원)

구분	연도	사업명	계약금액	비고
1	2019	기숙사 스크린 도어 설치	71,200	
2	2019	어린이병원, 편의시설동 및 장례식장 장애인편의시설공사	47,000	
3	2019	중앙진료동,외래진료동, 병동 및 재활병원 장애인편의시설보완공사	47,000	
4	2020	의생명창의연구동 동물실험실 구축관련 부대시설 공사(건축/기계/전기)	152,473	
5	2020	의생명창의연구동 동물실험실 부대시설 전기 추가공사	35,686	
6	2020	의생명창의연구동 스크린도어 설치	55,000	
7	2021	병원 외부 코킹공사	22,000	
8	2021	성인병동 탕비실 환경개선 가구(싱크)/창호 공사	60,203	
9	2021	전기자동차 급속충전시설 전기케이블 설치	62,940	
10	2021	지하주차장 개방에 따른 화재연동출입통제시스템설치	23,100	
11	2021	편의시설동 직원식당 주방 바닥 등 개보수 바닥공사	21,500	

나. 에너지절약추진위원회 규정 미준수

에너지절약추진위원회 규정은 병원의 시설물을 운용함에 있어 에너지 절약 추진에 관한 기본계획의 수립과 집행을 위하여 위원회의 조직과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 제정되었으며, 년 2회 개최하는 것을 원칙으로 심의결과를 회의록으로 작성하고 위원장의 결재를 받아 원장에게 보고하도록 되어있다.

이와 관련하여 최근 3년간(2019.1.1.~2021.12.31.) 시설관리팀에서 주최한 에너지절약추진위원회의 개최 현황을 살펴본 결과, [표 2]와 같이 총 6

번의 위원회를 서면으로 개최하였으나, 회의록에 위원장의 결재가 누락 되어있었으며, 개최 및 심의결과를 원장에게 보고하는 결재절차가 누락된 사실을 확인하였다.

[표 2] 에너지절약추진위원회 보고 누락 현황

연도	구분	개최일자	확인된 사항	비고
2019	상반기	2019.03.20.	개최 및 심의결과 미보고	위원장 결재 참석자 서명으로 갈음
	하반기	2019.08.21.	위원장 결재 누락, 개최 및 심의결과 미보고	
2020	상반기	2020.04.22.	개최 및 심의결과 미보고	위원장 결재 참석자 서명으로 갈음
	하반기	2020.08.18.	위원장 결재 누락, 개최 및 심의결과 미보고	
2021	상반기	2021.05.11.	위원장 결재 누락, 개최 및 심의결과 미보고	
	하반기	2021.08.18.	개최 및 심의결과 미보고	위원장 결재 참석자 서명으로 갈음

3. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 병원정책을 준수하여 향후 시행되는 시설공사에 대하여 감염위험도 평가가 누락되는 일이 없도록 업무 프로세스를 재정립하여 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

시설관리팀에서 주관하는 시설사업 및 제반사항에 대하여 능률적인 업무 수행을 위해 병원규정을 철저히 준수하여 관련 위원회의 기능이 원활하게 이루어지도록 만전을 기해주시기 바랍니다. (통보)
