

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-070	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	부서경고, 통보		
관 계 부 서	◆◆◆처(◇◇◇팀), ●●●처(○○○팀)		
제 목	화물터미널지역 신규 주차장 개발 예산집행 비효율		

지 적 내 용

1. 업무 개요

●●●처(○○○팀)는 인천국제공항 자유무역지역 및 신규 물류인프라 개발계획 수립 및 시행을 업무로 수행하고 있다. 이와 관련하여 ●●●처(○○○팀)는 신규 화물터미널 개발사업의 투자유치 환경을 조성하기 위한 목적으로 북측 화물터미널지역 내 미개발지역(이하 “대상부지”이라 한다)에 신규 주차장을 개발하는 계획¹⁾(이하 “신규 주차장 개발계획”이라 한다)을 '21. 10월에 수립하였다. 동 신규 주차장 개발계획의 총 사업비는 약 \$\$\$억 원으로 주요 내용은 아래 [표 1]와 같다.

[표 1] 북측 화물터미널지역 신규 주차장 개발계획
생략

상기 신규 주차장 개발계획 수립 후 ●●●처(○○○팀)는 신규 주차장 설계 및 시공 시행을 관련부서(※※※처 및 §§§처)에 요청²⁾하였으며, 이에 따라 ☞☞처는 ‘ㄴㄴ공사’ 계약을 2022. 10. 26. 체결하였고, 현재 공사가 진행 중으로 '25.2월 준공예정이다.

2. 관계법령 및 판단기준

공항공사 「예산편성지침」에 따르면 ‘미래성장을 위한 투자는 효율적으로 추진하되, 불요불급한 지출은 최대한 억제하는 것을 예산편성의 기본방향으로

1) 「북측화물터미널지역 신규주차장 개발 시행계획(안)」 (●●●처-3715, '21.10.13)

2) 「북측화물터미널지역 신규주차장 개발사업 협조요청」 (●●●처-3716, '21.10.14)

수립하고 있으며, 공항공사 「예산집행지침」도 불요불급한 투자를 억제하고, 효율적인 사업추진을 통해 비용이 최대한 절감되도록 노력하는 것을 기본 원칙으로 하고 있다.

따라서 ●●●처(○○○팀)는 공항공사 「예산편성지침」 및 「예산집행지침」에 의거하여 사업 추진 시 불요불급한 지출을 억제하고 효율적으로 사업을 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 적자 등 재무여건 고려 부족

코로나 팬데믹 영향으로 공항공사는 '20~'21년(2년간) 동안 당기순손실이 1조 1,817억 원 발생되었으며, 부채비율은 '19년 31%에서 '21년 68%으로 2배 이상 증가하였으며, '22년에도 5,273억 원의 당기순손실이 발생하였으며, 부채비율은 93%로 증가하였다. 신규 주차장 개발계획을 수립하던 시기에 이러한 재무여건에 놓여지게 됨에 따라 공항공사 재무건전성에 대한 중요성이 증대되고 있는 실정이었다.

나. 대상부지에 대한 화물터미널 개발계획, 민간사업자 수요 부재

그런데 ●●●처(○○○팀)는 대상부지에 대한 신규 화물터미널 개발계획이 수립되어 있지 않은 상태에서, 대상부지에 대한 민간사업자의 화물터미널 개발사업 투자의향서³⁾ 접수, 「인천국제공항공사 부동산 임대사업 계약특례 세부기준」에 따른 부동산심의위원회 개최·사업자 공고·제안서 접수·우선협상대상자와의 협상 등 민간사업자를 유치하여 화물터미널을 개발하는데 요구되는 일련의 절차가 없었음에도 불구하고, 대상부지의 신규 주차장을 개발하는 계획을 '21.10월 수립하였다. 대상부지는 종합감사 중인 현재 기준으로 개발계획 또는 민간사업자와 체결된 협약이 전무하여 대상부지에 화물터미널이 개발되기까지는 상당한 기간 소요될 것으로 판단된다.


3) ●●●처(○○○팀)는 북측 화물터미널지역 북단의 화물터미널 개발예정부지에 대해 ■■■■ 및 ■■■■의 화물터미널 추가 확대 계획이 있다고 하나, 해당 사업자들로부터 서면으로 제출받은 투자의향서 또는 투자계획은 없으며, 별도의 내부방침문서도 없다.

다. 신규 화물터미널 개발이 가능한 주차장이 확보된 부지 존재

그리고, 신규 주차장 개발계획을 수립하는 시점에 이미 주차장이 조성되어 있는 화물터미널 개발예정부지가 대상부지 외에 아래 [그림]과 같이 3곳이 존재하고 있었음에도 불구하고, 부지 ■■■m² 이상의 신규 화물터미널을 개발하기 위해 대상부지에 신규 주차장 개발을 추진하였다.

[그림] 신규 주차장 개발계획 수립시점 화물터미널 개발예정부지 현황

연 번	지 역	면 적
1	북측 화물터미널지역 북단	38,885m ²
2	북측 화물터미널지역 남단	23,232m ²
3	남측 화물터미널지역	29,665m ²

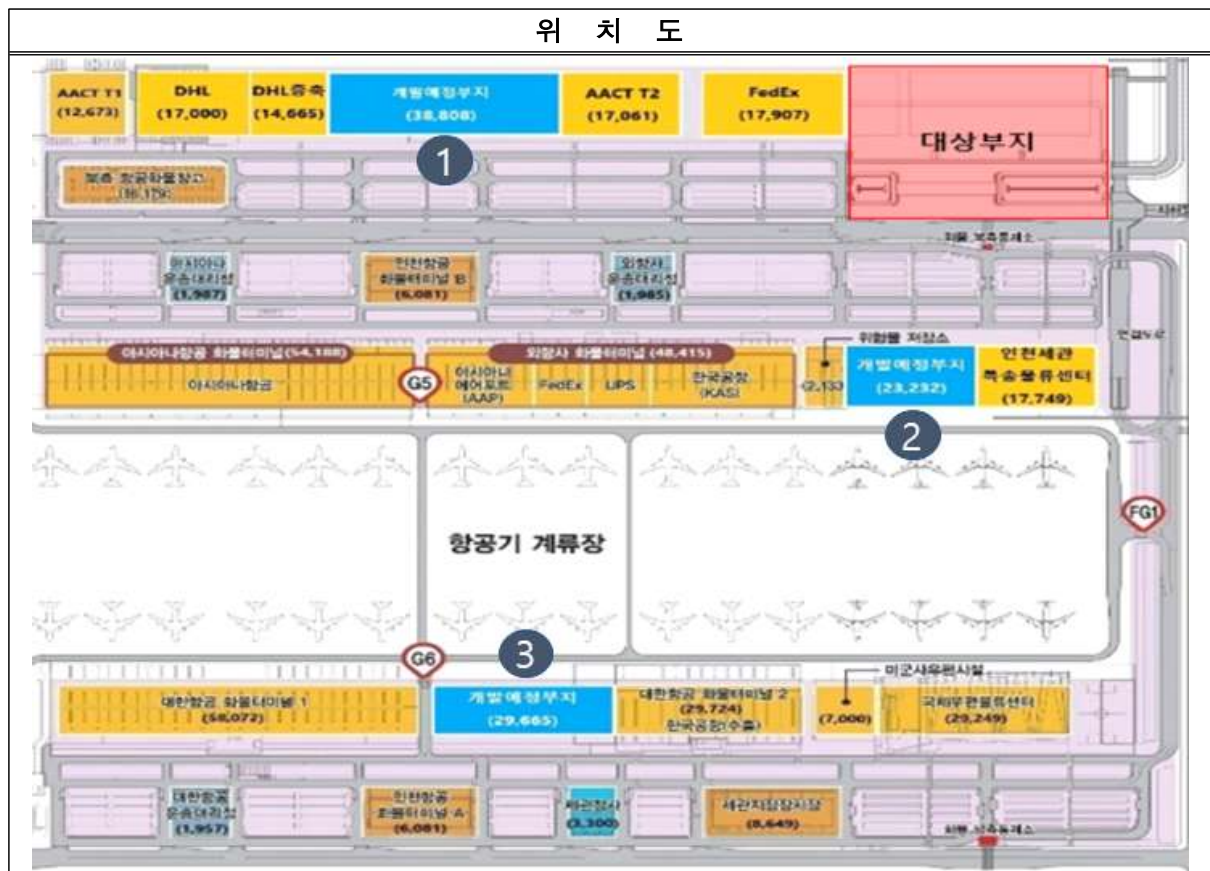

그러나, 신규 화물터미널을 개발하는데 있어서 ■■■m² 이상의 부지 확보가 필요하다는 것에 대한 근거를 ●●●처(○○○팀)는 제시하지 못하였으며, 다른 자료로도 그 근거가 확인되지 않는다. 게다가 ●●●처(○○○팀)은 '22.11월 38,885m² 면적의 상기 [그림] 1번 개발예정부지를 전체 개발하는 것이 아닌 약 ▲▲▲m² 부지만 신규 화물터미널로 개발하고자 부동산심의

위원회를 개최하여 심의⁴⁾하는 등 상충된 업무처리를 보이고 있다.

또한, 남측 화물터미널지역의 화물터미널 개발예정부지는 ●●●처(○○○팀)에서 '21.4월 수립한 “항공화물 인프라 개발 중장기 종합 추진계획”⁵⁾에 따라 스마트화물터미널 테스트베드 후보부지⁶⁾ 3곳 중 하나이긴 하나, 스마트 화물터미널 테스트베드 부지로 확정되진 않은 상황이었다.

라. 신규 주차장의 이용 저조

그리고 기존 화물터미널의 주차장 사용현황을 살펴볼 때, '22년도 화물터미널지역 주차장의 주차율은 일평균 최대 ①①①%이고, 최근 5개년(2016~2020년) 인천공항 화물터미널 주차장의 수익기준 평균 주차율⁷⁾은 약 ●●%이다.

[표 2] 화물터미널지역 주차장 시간대별 주차율 (2022년 일평균)

생략

따라서, 현재 화물터미널지역 주차장 사용율이 최대 ①①①% 밖에 안되는 실정을 고려할 때, 신규 주차장은 준공 이후 기존 화물터미널지역 최대 주차율(①①①%) 보다 낮은 주차율로 운영될 것으로 판단되며, 신규 주차장 전면에서 신규 화물터미널이 개발되어 운영되지 않을 경우, 정기권 및 무료(45분 미만 차량) 차량 수요도 없을 것이므로 수익기준 주차율(●●%) 보다 낮은 주차율로 운영될 것을 판단된다.

한편, ●●●처(○○○팀)는 당시 코로나19 등 재난 및 질병으로 인한 긴급상황 발생 등으로 화물터미널 폐쇄 시 화물터미널 조업공간을 대체하는 예비공간으로도 신규 주차장을 활용할 계획이라 하나, 화물터미널 내에서 이뤄지는 조업활동의 상당한 부분은 보안검색을 거친 후 이뤄지는 행태를 고려할 때, 화물터미널 폐쇄에 따른 대체공간으로의 기능도 한계가 존재한다.

4) “인천공항 신규 화물터미널 개발을 위한 민간제안사업 부동산심의위원회 심의계획(안)”
(●●●처-4928, '22.11.3)

5) ●●●처-1389(2021.04.19)

6) 스마트화물터미널 테스트베드 후보부지 : ~생략~

7) “북측 화물터미널 신규주차장 개발사업 예비타당성 조사 결과 송부”(☆☆☆처-3817, '21.09.23)
~생략~

따라서, 재난 및 질병으로 인한 긴급상황 발생 등으로 화물터미널이 폐쇄되어 대체공간이 요구된다하더라도 주차장 내에서 할 수 있는 조업수준을 고려할 때 기존의 화물터미널 주차장 내에서도 충분히 확보가 가능할 것으로 판단된다.

마. 결론

따라서 당시 공항공사의 재무여건을 고려할 때, 인천공항의 항공화물 수요에 기반한 화물터미널 신규 개발 적정 시기, 기존 화물터미널 개발예정 부지 외에 추가 부지에 대한 개발 필요성, 민간사업자의 구체적인 사업의향 존재 여부, 화물터미널지역 주차장 혼잡도 등을 종합적으로 분석하여 사업을 추진해야했음에도 불구하고 그러하지 않았다.

그 결과 약 \$\$\$억 원의 대규모 사업비를 투자한 신규 주차장이 준공 후 유희시설 또는 사용빈도가 낮은 시설로 운영될 가능성이 상당하며, 이에 대한 불필요한 유지보수 비용 발생 등 예산의 비효율적인 집행에 따라 공항공사 재정건전성에 악영향을 미치는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

●●●처(○○○팀)는 인프라를 사전에 구축하여 경쟁력 있는 글로벌 기업에 대해 보다 적극적으로 신규 투자를 유치하고, 투자수요 발생 시 즉각적인 대응을 가능하기 위해 당시 주차장 개발을 추진하였으며, 보충적으로 긴급상황 발생 등으로 화물터미널 폐쇄 시 화물터미널 조업 대체 예비공간으로도 활용하고자 함이었다는 의견을 제시하였다. 한편, 예비타당성 조사 보고서 상 주차율 ●●●%는 일일 평균 주차요금을 기준으로 산정한 것이며, 실제 화물터미널지역 주차장은 혼잡한 상태라는 의견을 제시하였다.

또한, ■■■(39,198m²) 및 ●●●(30,680m²) 등을 토대로 신규 화물터미널 개발에 최소 ■■■m² 이상 부지가 필요하며, 북측 화물터미널지역 북단 개발예정부지의 경우 민간사업자의 개발 의향이 존재했으며, 남측 화물터미널지역 개발예정부지의 경우 ●●●처에서 추진 중인 ‘스마트화물터미널

테스트베드' 부지로 계획하고 있음에 따라 신규 화물터미널 개발을 위해서는 당시 대상부지에 신규 주차장 조성이 필요하다는 의견을 제시하였다.

그러나 상기 의견에 대해 살펴보면, 첫째 최근 건설된 [X][X][X] 제2화물터미널은 '17.9월 [X][X][X]와 실시협약 체결 후 '20.3월에 운영이 개시되어 2년 6개월이 소요되었으며, [X][X][X] 2단계 화물터미널은 '19.10월 [X][X][X]과 실시협약을 체결하고 '22.8월 운영이 개시되어 2년 10개월이 소요되는 등 화물터미널 개발사업에 대한 추진 결정 후 사업자 공고 등의 소요되는 기간을 제외한 협약체결 후 운영개시까지 약 2.5~3년이 소요되는 것을 볼 때 화물터미널 신규 개발에 맞춰 충분한 대응이 가능하다고 볼 수 있다.

둘째, 화물터미널 내에서 이뤄지는 조업활동의 상당한 부분은 보안검색을 거친 후 이뤄지는 행태를 고려할 때, 화물터미널 폐쇄에 따른 대체공간의 기능에도 한계가 존재하며, 기존의 화물터미널 주차장 내에서도 충분히 이러한 공간 확보가 가능할 것으로 판단된다.

셋째, 화물터미널, 항공화물창고, 대리점동 등 인근에 시설물이 위치하고 있는 주차장에 한해 일부 혼잡한 상황이 존재하나, 별도 시설물이 없는 주차장 구역의 경우 주차율이 매우 낮은 수준으로, 신규 주차장이 혼잡한 주차구역 주차수요를 분산하는 기여한다고 판단할 수 없다.

넷째, 기존에 존재하였던 화물터미널 개발예정부지에 대해서도 [X][X][X]m² 이상 부지가 필요하는 근거를 전혀 확인할 수 없으며, 기존 화물터미널 운영 현황을 보더라도 부지면적 [X][X][X]m² 이하로 운영 중(예, [X][X][X] 화물터미널은 2만m² 이하의 구역으로 조업구역을 구분하여 운영, [X][X][X] T1·2 및 [X][X][X] 화물터미널 1단계는 부지면적 2만m² 이하로 운영)인 화물터미널이 확인된다. 또한, 남측 화물터미널지역의 화물터미널 개발예정부지는 스마트화물터미널 테스트베드 후보 부지 3곳 중 하나였을 뿐, 스마트화물터미널 테스트베드로 확정된 부지가 아니었다.

이에 따라 상기 [X][X][X]처([X][X][X]팀)의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① 사장(◆◆◆처장)은 화물터미널지역 신규 주차장 개발사업과 관련하여 비효율적 예산 집행을 초래하고, 공항공사 채무건전성에 악영향을 끼친 ●●●처(○○○팀)에 대하여 「부서경고」 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

② 사장(●●●처장)은 대규모 사업비가 소요되는 사업 추진 시 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무절차를 정비하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략
