

일련번호	07	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

부 서 주 의

제 목 스마트 관망관리 인프라 인계인수 및 하자관리 미흡

소 관 부 서 □□□□□□단, ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 □□□□□□단, ◆◆◆◆◆단


내 용

1. 업무개요

□□□□□□단은 ㄴㄴ 남부권 10개 지자체와 체결한 “스마트 관망관리 인프라 구축사업 위수탁 협약서”에 따라 스마트 관망관리 인프라 구축사업 공사 및 제조구매설치 업무를 수행중이며, ◆◆◆◆◆단은 ㄴㄴ 북부권 6개 지자체 및 ㄱㄱ시와 체결한 “스마트 관망관리 인프라 구축사업 위수탁 협약서”에 따라 스마트 관망관리 인프라 구축사업 공사 및 제조구매설치 업무를 수행중이다.


2. 관계 규정 및 판단기준

ㄴㄴ 남부권 10개 지자체와 체결한 ‘○○시(군) 스마트 관망관리 인프라 구축사업 위수탁 협약서’ 제10조(시설물 준공 및 성과물 인계인수)에 따른 시설물의 인계인수 절차는 다음과 같다.



ㄴㄴ 북부권 6개 지자체 및 ㄱㄱ시와 체결한 ‘○○시(군) 스마트 관망관리 인

프라 구축사업 위수탁 협약서' 제10조(시설물 준공 및 성과물 인계인수)에 따른 시설물(물품(장비)구매)의 인계인수 절차는 다음과 같다.

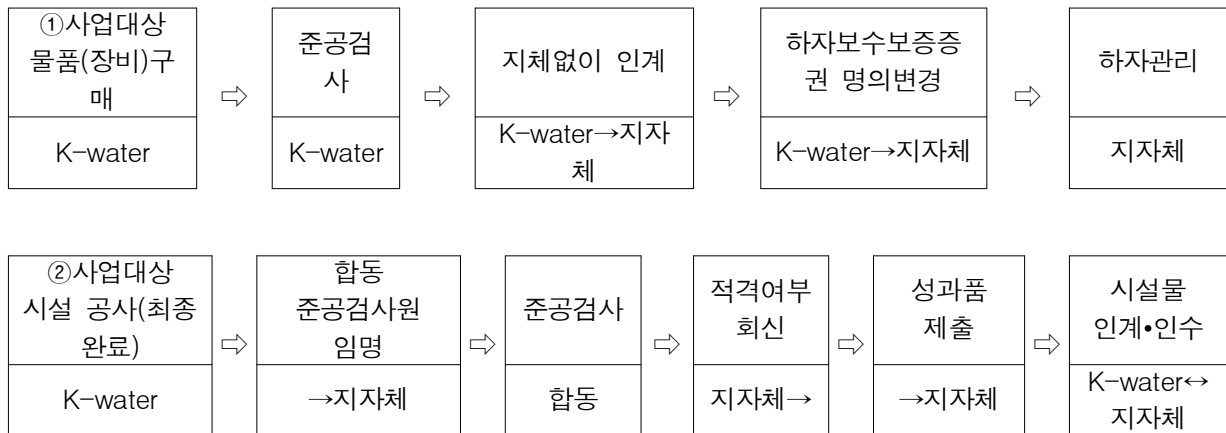

이에 따라, K-water는 스마트 관망관리 인프라 구축사업의 구매한 다양한 물품(제조구매 포함)에 대해서는 협약에 의거 목적물별로 준공하되, 준공시점에 지체없이 지자체에 인계하고 하자보수보증권 명의변경 및 지자체로 이관하여, 지자체에서 하자관리를 포함하여 운영관리하도록 신속히 조치할 필요가 있다.

그리고, 위수탁 협약서에 따라, K-water는 협약에 의거 최종 완료되는 공사의 준공 후 7일 이내에 음성군과 공동으로 준공검사원을 임명하여 준공검사를 실시하고, 준공검사 완료일로부터 14일 이내에 지자체의 적격 여부를 회신받으면, 준공 관련 서류(준공검사통지서, 지자체 명의 하자보증증권, 그 밖의 관련자료)를 제출하고 해당 서류 제출일에 해당 시설의 소유권은 지자체에 귀속되며, 지자체에서 하자관리를 포함하여 운영관리를 하도록 명시되어 있다.

더욱이, 「건설기술관리규정」 제86조(하자검사 및 보수)에 따르면 시설물관리 부서의장은 하자담보 책임기간 중에 있는 공사에 대하여 상·하반기 각 1회 이상 하자정기검사를 실시하여야 하고, 하자담보책임기간이 만료일 14일 전 수급인으로부터 하자검사원을 제출받아 하자검사를 이행하여 하자담보 책임기간 내에 발

생한 하자에 대하여 수급인의 부담으로 하자를 보수토록 하는 등 시설물의 적절한 관리를 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□단은 ㄱㄱ 남부권 10개 지자체를 대상으로 시행중인 스마트 관망관리 인프라 구축사업으로 설치한 시설물 대부분을 준공하였으나, 지자체로 하자보증증권을 포함하여 인계·인수가 완료되지 않았고, ◆◆◆◆◆◆단은 ㄴㄴ 북부권 6개 지자체 및 ㄷㄷ시를 대상으로 시행중인 스마트 관망관리 인프라 구축사업으로 구매한 물품 대부분을 준공하였고 일부 지자체는 최종 완료되는 공사의 준공까지 완료하였으나, 하자보증증권 명의 변경을 포함하여 감사일 현재까지 인계·인수가 완료되지 않았다.

더욱이, 하자보증증권의 채권자 명의변경이 이루어지지 않았음에도 재임소 설비 등 출입제한시설 내 설치된 시설물 등, 동 사업으로 설치한 각종 시설물에 대하여 「국가계약법」 및 「건설기술관리규정」에 따른 하자검사 또한 이루어지지 않아, 적절한 유지관리가 이루어지고 있는지 확인하기 어려운 실정으로, 스마트 관망관리 인프라 구축사업의 완료 시점 도래시점까지 관련 시설물에 대한 인계·인수절차가 마무리 될 수 있도록 관리할 필요가 있다.

관련부서 의견 및 검토의견

◆◆◆◆◆◆단은 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제시하지 않았다.

□□□□□□단은 스마트 관망관리 인프라는 시설별 분리 발주 및 준공시점 상이하고, 각 지자체에서 완료시점에 전체 시설물 일괄 인수인계를 요청하였으며, 하자관리 또한 시행중에 있다는 의견을 제시하였으나, 지방상수도 관로상에 설치가 완료된 시설물의 유지관리 업무 및 하자관리 등 효율성 및 주체를 고

려할 때, 협약조건에 의거 설치완료 시점에 즉시 인계하여 적절한 유지관리가 이루어질 수 있도록 조치하고, 하자관리 또한 관련법령 및 규정에 따른 정기 및 만료검사 등이 적절이 이루어지지 않은 채 하자담보책임기간이 경과된 계약건들을 다수로서 사업 및 계약관리 업무가 적절하게 않은 것이 명확하다.

조치할 사항

- ① □□□□□□단장은 기 준공된 스마트 관망관리 인프라 인계인수 및 하자관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (부서주의)
- ① ◆◆◆◆◆◆단장은 기 준공된 스마트 관망관리 인프라 인계인수 및 하자관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (부서주의)
