

수범사례 일람표

연번	부서명	건 명	PAGE
1	토목궤도팀	노후 분기기 개량을 통한 궤도 안정성 확보	1
2		연결통로 설치에 따른 수익금 등 창출	2
3		7호선 최초 레일연마차 연마공사 수행	3
4	건축팀	GTX-A노선도 검단연장선 선반영 예산절감	4
5		내부고객만족도 제고	5
6	기계환경팀	공기업 최초 성능점검업 등록 및 자체시행	6
7	전자팀	태그리스 게이트 확대 구축	7
8		성과공유제를 활용한 자동개집표기 GCU 보드 개발	8
9		인천교통정보센터와 망연계 시스템 구축	9
10	공기질개선TF팀	공기질 개선사업의 성공적 추진으로 초미세먼지 16.8% 저감	10
11		스마트 공기질 관리시스템 구축으로 에너지 절감	11
12		역사 환기설비 분산·정밀제어를 통한 에너지 절감	12
13	건설공사TF팀	건설현장 스마트 안정장비 도입	13
14		건설현장 스마트 CCTV 도입	14
15		철거시설 재사용으로 고객 이동 편의 증진	17

(1) 추진배경

- 1호선 본선 콘크리트도상에 부설된 분기기 목침목의 부패, 할렬 등으로 인한 궤간확대, 선형틀림 등의 문제점 발생
- 환경문제로 인한 향후 목침목 수급의 어려움, 침목교체시 레일 양로(인상) 과다에 따른 레일변형, 협소한 작업공간 및 짧은 차단시간으로 침목 교체(공법) 변경 필요

(2) 추진실적

- 2022. 5월 : 분기기 제작사와 노후목침목 분기기 개량 시범설치 협약체결
 - 인천교통공사 : 개량공사 시행
 - (주)세안(분기기 제작사) : 공사자재 수증, 기술지원 및 준공 후 모니터링
 - ※ 수증자재 비용(분기레일, RC침목, 특수 그라우트 등) : 142백만원
- 2022. 7월 : 공동특허 협약 및 공동특허출원 업무위임 협약 체결
- 2023. 2월 : 공동특허 등록
 - 특허명 : 선로전환기용 목침목을 콘크리트 블록으로 바꾸기 위한 교체 시공방법
- 2023. 4월 : 박춘103A(60kg #10 양개) 1틀 개량 완료(시범설치)
- 2023. 6월 : 2023년도 한국철도학회 춘계학술대회 학술논문 등재
 - 논문명 : 콘크리트도상 노후 분기기 목침목 RC침목화 연구 및 시공
 - 저 자 : 김동연(세안), 이남수(세안) , 김민수, 신경선, 윤영중
- 2024. 2월 : 예술회관 101, 신연수 103A 개량 완료(60kg #8 편개 2틀)
- 2024. 12월 : 작전102(60kg #12 편개) 개량 완료 예정

(3) 추진성과

- 분기기 제작사와 협업을 통한 기술력 향상 및 사업비 절감(142백만원)
- 특허등록에 따른 부대수입 창출 기회 및 공사 대외 이미지 제고
- 반 영구적 RC침목 교체로 궤도안정성 확보 및 향후 유지보수비용 절감
 - 목침목 내구연한 : 20년, 콘크리트침목 : 50년 이상

2

연결통로 설치에 따른 수익금 등 창출

(1) 추진배경

- ☐ 역세권 개발에 따른 지하연결통로 설치 요청
 - 대상역사 및 협약기관
 - 가정역 : 한국토지주택공사
 - 동수역 : 부평2구역 주택재개발정비사업 조합
 - 인천대입구역 : 롯데쇼핑(주)

(2) 추진실적

- ☐ 동수역 추진실적(타 역사 추진실적 동일)
 - 2019. 02. : 사업시행계획 변경에 따른 공사의견 제시
(출입구 이설에 따른 ES 설치)
 - 2019. 05~ 2023. 12. : 사업시행자와 연결통로 설치 관련 지속적 협의
 - 2024. 01. : 연결통로 설치를 위한 협약서(안) 송부 및 회시(2회)
 - 2024. 03 : 협약서 내용의 적정성 관련 법률자문 및 협약체결
(2024. 03. 22. 기술지원료 입금)
 - 2024. 04 : 공사착공(2025. 03. 준공예정)

(3) 추진성과

- ☐ 출입구 및 편의시설 설치
 - 가정역 유희공간 4개소 확보
 - 동수역 기존 계단식 출입구를 ES가 설치된 출입구로 개량(캐노피 포함)
 - 인천대입구역 5번 출입구 신설(ES 2대 포함)

※ 참고 : 출입구 설치비용 약 42억원(ES 2대 약 5.5억원 포함)

- ☐ 기술수수료 입금

연 번	입금일 (예정일)	현 장 명	입금액 (백만원)	비 고
계			302.3	
1	2024.2.29	가정역 핵심시설 출입통로 설치공사	115.7	
2	2024.3.22	동수역 출입구 이설 및 연결통로 설치공사	85.7	
3	2024.5.30	인천대입구역 5번 출입구 설치공사	100.9	

3

7호선 최초 레일연마차 연마공사 수행

(1) 추진배경

- ☐ '선로시설관리내규 제49조 레일의 마모관리' 관리주기 도래
 - 곡선부($R \leq 620m$) : 연 1회
 - 곡선부($R \leq 620m$)를 제외한 구간 : 1회/5년
- ☐ 2024년 철도안전관리체계 정기점검 결과에 따른 시정조치 필요
 - 7호선 연장구간 대상 시행계획 검토 및 수립
- ☐ 2024년 인천시 종합감사 궤도공사 이례사항 대비 모터카 필요

(2) 추진실적

- ☐ 레일연마 실적(서울교통공사 연마실적 "0")

수행연도	공 사 명	연마연장(km)
2022	수동연마 공사	3.654
2023	수동연마 공사	3.970

- ☐ 2024년 레일연마공사(레일연마차) 추진 실적
 - 07. 04. ~ 12. : 서울교통공사 의견 조회(차량기지 사용 가능, 모터카 대여 불가)
 - 07. 05. ~ 11. : 7호선시설팀 의견 조회(연마차 고장 시 구원모터카 필요)
 - 07. 08. ~ 08. 02. : 시공사(국내독점) 인력 및 장비 보유현황 조회(모터카 보유)
 - 08. 02. ~ 23. : 레일연마공사 계약의뢰 및 체결(시공사 모터카 대여)
 - 08. 06. : 서울교통공사 및 관련부서 연마공사 시행알림
 - 08. 08. ~ 09. 02. : 굴현차량기지 내 점검 및 탈선복구훈련 협의 및 시행
(검단연장선 연마에 따라 천왕차량기지 대여료 및 대여 행정 절감)
 - 08. 13. ~ 29. : 시공사 운전원 7호선 구간인증
 - 08. 27. ~ 09. 02. : 서울교통공사 천왕차량기지 연마장비 반입 협조요청 및 반입
 - 09. 04. : 서울교통공사 관제 천왕차량기지 ~ 7호선 본선 간 운행협의
 - 09. 06. ~ 11. 15. : 레일연마공사 수행 및 준공

(3) 추진성과

- ☐ 7호선시설팀, 서울교통공사, 시공사 유동적 소통
 - 차량기지, 모터카 부재로 점검 장소 및 구원 방법이 확보되지 않았으나
 - 소통 및 협의를 통한 구원모터카 확보 및 운전원 구간인증 등 적법하고 안전한 연마수행
- ☐ 7호선 레일연마공사 최초 수행
 - 21.417km, 260.340pass.km 레일연마수행
 - 수동연마 기간/연장, 비용/연장 대비 효율적
 - 소음저감(평균 1.8dB) 및 승차감(평균 1.05dB) 개선 레일결함 제거 및 사용수명 연장

GTX-A노선도 검토연장선 선반영 예산절감

(1) 추진배경

- ☐ 2024년 GTX-A노선 개통에 따른 안내판 설치시 2025년 개통예정인 검단 연장선 노선도를 선반영

(2) 추진실적

☐ GTX-A노선도 개정시 검단연장선 선반영

- 대 상 : 인천1,2호선 및 7호선 수도권노선도 등 244개소
- 기 간 : 2024. 3. ~ 2025. 6.
- 내 용 : 타 운영기관 노선도 교체시 검단연장선 개통내용 선반영 후
일정에 맞게 스티커를 제거하여 비예산으로 안내판 교체
- 예산절감액 : 179백만원
- 견적서 및 안내판 시안

[illegible]

(3) 추진성과


- ☐ 타 운영기관 노선도 교체시 검단연장선 개통내용 선반영에 따른 예산절감
- ☐ 검단연장선 개통 전 안내판 정비 등 원만한 개통준비 완료

(1) 추진배경

- ☐ “근무환경 시설 개선공사(4-2차-건축)” 신호관제 침실 공사 진행 중 기존 침실을 사용할 때 소음이 들렸다는 직원의 불편사항 접수
- ☐ 소음 차단을 위한 흡음 천장마감재 설치 등 공사 설계에 반영된 내용이 있었으나, 더 높은 차음효과를 위하여 추가 방안 검토

(2) 추진실적

- ☐ “근무환경 시설 개선공사(4-2차-건축)” 설계변경하여 관제실과 기계실이 접하는 벽면에 벽면틀 및 단열재 설치하여 차음효과 높임
- 신호관제 침실 설계변경 전, 후 도면

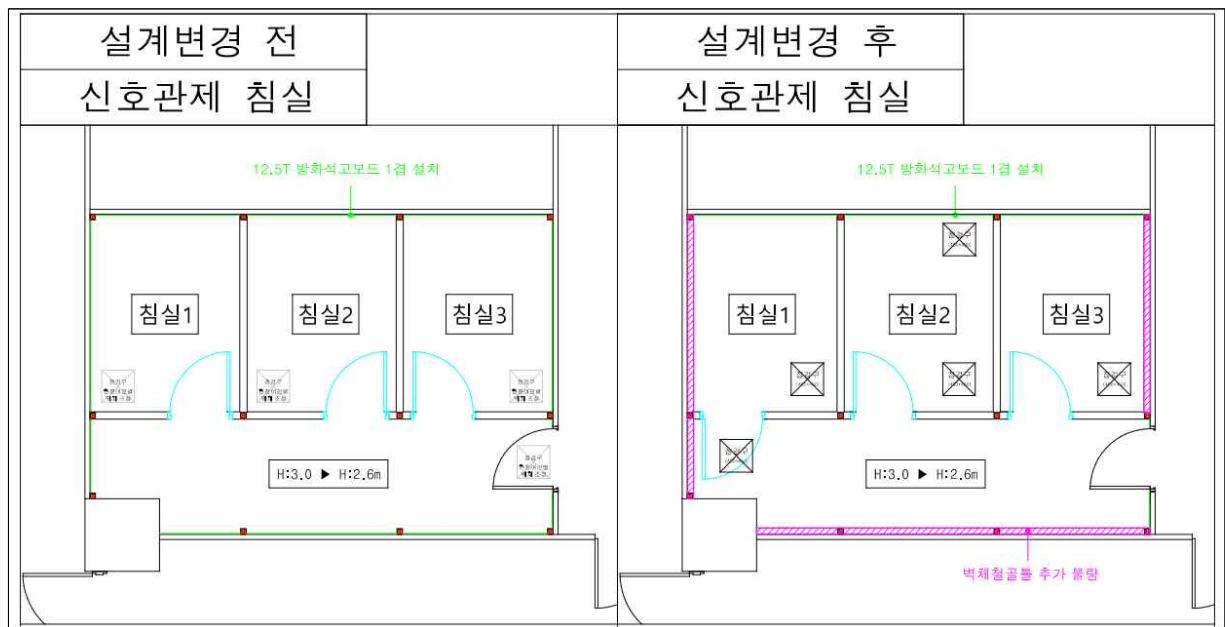

(3) 추진성과

- ☐ 신호관제 침실 소음 저감으로 내부고객만족도 제고

(1) 추진배경

- 기계설비법 제17조 및 기계설비유지관리기준 제11조에 따라 일정 규모 이상의 건축물등에 설치된 기계설비에 대한 성능점검필요

* 관리주체는 해당 건축물 등의 완공일(이하 기준일)로부터 1년이 되는 날을 기준으로 **1년마다 1회 이상** 성능점검을 실시해야 한다.

- 관련법에 따른 성능점검 시행 필요로 매년 지속적 예산소요

* 외주용역 시 **매년 146백만원** 예산 및 지하역사 적용(국토부 고시예정) 시 **매년 약 18억3천만원** 예산 필요

(2) 추진실적

□ 사업개요

- 공사 재정 건전성 개선을 위한 자구책 마련으로 기계설비법 적용
- 건축물 4개소(본사사옥 등)에 대한 성능점검 자체시행

□ 추진내용

- 성능점검업 등록 및 자체시행을 위한 법적사항 검토
 - 기계설비 성능점검업 등록(**전국 공기업 최초**, 인천-제18호)
- 기계설비 성능점검(자체) 추진 기본계획 수립
 - (1단계)본사 등 건축물 자체시행 / (2단계)역사 확대시행 / (3단계)대외영업 수익창출
- 기계설비 성능점검(자체) 세부시행계획 보고(업무 TF 구성 및 시행)
 - 업무 TF 구성, 추진기간 : 2024.2.19.~4.30.(2.3개월)
- '24년 기계설비 성능점검 업무제고 실무능력 향상교육 시행(서울특별시 예산부담)
 - 실무능력 향상교육 및 기계설비 성능점검 계측장비 제작사 실무교육

(3) 추진성과

- '24년 기계설비 성능점검 자체시행에 따른 **예산절감(146백만원)**
- 인천광역시 주관 재정혁신대상 **인천시장상(대상)** 수상
- 우리공사 특화 매뉴얼 작성을 통한 **성능점검 기술력 및 연속성 마련**



□ 추진배경

- 첨단 디지털 기술과 비대면 기술 발전 및 활용 가속화
- 기술발전에 따른 교통약자 및 지하철 이용고객에 대한 이동 편의성 제고 방안 강구

□ 추진실적

- 태그리스 게이트 확대 구축 계획 수립('24. 1. 12.)
 - (기간/사업비) '24. 1. ~ '25. 2. / 비예산
 - (설치개소) 62개역 77개소(1호선 30개역, 2호선 27개역, 7호선 5개역)
- 전략적 제휴 업무협약(MOU) 체결('24. 2. 27.)
- 태그리스 게이트 설치 관련 현장실사
 - 겐트리 설치공간, 역사 환경 파악 및 기존 설비 제원 조사 등
- 태그리스 게이트 확대 구축
 - 총35개역: 1호선 3개역, 2호선 전역사, 7호선 5개역(인천구간)
- 태그리스 게이트 이용 홍보 추진 및 서비스 개시
 - 공사 자체 홍보매체, 홈페이지 및 SNS채널, 포스터 등 대시민 홍보 추진
 - 35개역 39개소, '24. 10. 8. 개시

□ 추진성과

- 차세대 대중교통 결제시스템 구축으로 편리한 지하철 대중교통 환경 조성
 - 교통약자(영유아 동반, 휠체어 장애인 등) 및 무거운 짐을 든 고객의 이동 편의성 향상
- 태그리스 시스템 기술 고도화를 통한 고객서비스 향상
 - 기존 결제방식(NFC) 보다 20% 이상 빠른 게이트 통과 속도 구현
- 민간협업을 통한 시스템 무상 구축으로 공사 재무건전성 강화
 - 민간기업과 MOU를 통한 구축사업비 비예산 유치로 935백만원 예산절감
- 유관기관 최초로 태그리스 서비스 상용화 실시(2.7호선)
 - 2025. 5월 1호선 30개역 포함 전 역사 서비스 예정

☐ 추진배경

- 제작사 단종으로 수급 불가인 GCU 보드의 원활한 수급 방안 마련
- 위.수탁기업간 상생협력으로 전자설비 노후 단종 부품 개발과 품질 향상 및 기업의 기술력 향상

☐ 추진실적

- 성과공유제 과제 공모 및 제안 평가
- 표준계약 체결을 위한 표준계약서 법률자문 및 표준계약 체결
- 성과공유 사업 추진
 - 과제 수행을 위한 회의 진행(4회)
 - 시제품 확인을 위한 중간보고회('24. 10.)
 - 시제품 현장 시범 설치('24. 10.)
 - 신규 GCU보드 개발 완료('24. 10.)

☐ 추진성과

- 원활한 사업수행을 위해 상생협력 체계 구축
 - 요구사항 정리 및 설계.제작 등 기술적 검토 회의 추진
 - 개발환경 구축을 위한 인프라 지원체계 마련
- 시제품 개발을 위한 상호 노력
 - 중간 보고회, 1.2차 현장 시험 및 성능 검증 완료
- 회로 개선을 통해 고장 발생 요인을 최소화하고 수급이 원활한 부품 사용으로 수리 방안 마련

☐ 추진배경

- 대시민 서비스 「인천 교통빅데이터 플랫폼」 출시 예정
- 유관 행정기관 간 협력 구축을 통한 적극행정 추진

☐ 추진실적

- 망연계 시스템 구축 관련 협의(3회, '24. 8. ~ 10.)
 - 데이터 연계 방식 및 프로토콜 정의 등 제반사항 협의
- 데이터 생성 프로그램 개발('24. 9. ~ 10.)
 - 사전협의를 데이터 구조형태로 텍스트 파일로 변환 추출
- 테스트 파일 제공 및 서비스 예시 구현
 - 인천교통정보센터 테스트용 웹 서비스 시연회
- 시스템 구축 및 망연계 추진('24. 10. ~ 12.)
 - 망연계 시스템 구축: 본사(4F) 전자통제실 서버 및 VPN 설치
 - 공사 ↔ 인천시 ITS 시스템 간 망연계

☐ 추진성과

- 인천시 인천교통정보센터와 우리공사 간 협력체계 마련
- 연계망 구축 비예산 사업 및 프로그램 자체 개발로 50백만원 예산절감
- 인천 시민에게 도시철도 이용자료 제공으로 다양한 서비스 활용 기반 마련
 - 지하철, 도로, 버스 혼잡도 등 대시민 서비스 제공 예정

(1) 추진배경

- ☐ 환경부 제4차 지하역사 공기질 개선대책에 따른 국비지원 사업추진
 - (2023. 2) 제4차 지하역사 공기질 개선대책(환경부 생활환경과-241)
 - (2023. 9) 미세먼지 개선사업 기본계획 수립(공기질개선TF2023-2449)
 - (2024. 4) 2024년도 미세먼지 개선사업 종합계획(공기질개선TF2024-1466)

(2) 추진실적

- ☐ 사업예산 현황

구분	합계	'18~22년	'23년	'24년	'25년	'26~27년	비고
		집행		시행	가내시	계획	
사업비	227,808	48,708	7,691	9,972	10,185	159,665	

- ☐ 세부 사업내용 : 4개 분야 8개 사업 추진

구분		사업비 (백만원)	비고
2024년 공기질 개선사업		13,603	
1. 터널 본선의 환기설비 등 교체	집진설비 설치	1,305	이월예산(1.85억) 포함
	송풍기 교체	6,039	이월예산(12.4억) 포함
	본선 인버터 설치	854	이월예산(0.35억) 포함
2. 스마트 공기질 관리시스템 구축	초미세먼지 측정기 설치	882	이월예산(8.82억) 활용
	역사 인버터 설치	1,408	
3. 역사 환기설비 교체 등 개선	공조덕트 교체	1,142	이월예산(11.4억) 활용
	공조기 필터 개선	178	
4. 역사 공기청정기 설치	공기청정기 설치	1,795	이월예산(1.48억) 포함

(3) 추진성과

- ☐ 2023년 대비 역사 초미세먼지 16.8% 저감

초미세먼지 16.8% 저감 : 20.8mg/m³(2023년) ⇒ 17.3mg/m³(2024년)

※ 1, 2, 7호선 평균농도 기준

- ☐ 환경부 공기질 개선사업 보조금 9,972백만원 확보 : **유관기관 중 2번째**

국고보조금 29.7% 추가 확보 : 7,691백만원(2023년) → 9,972백만원(2024년)

※ 서울55% > 인천 23% > 대구 13% > 기타기관 9%

(1) 추진배경

- 사장방침 NO.21 【스마트 공기질 관리시스템 구축 기본계획 보고】
 - 실시간 공기질 정보 수집 및 빅데이터 분석·예측하여 최적의 공조시스템 운영으로 쾌적한 역사 환경 조성을 도모코자 함.
 - 환기설비 운영의 효율화 및 에너지 절감 효과 추진 필요

(2) 추진실적

- 스마트 공기질 관리시스템 구축
 - 대 상 : 인천1, 2호선 지하역사 49개역 및 본선환기실 54개소
 - 기 간 : 2023년 ~ 2024년
 - 사 업 비 : 3,451백만원(국시비 4 : 6)
 - 내 용 : 고효율 에너지 절약형 스마트 공기질 관리시스템 도입으로 지하역사 공기질 개선 및 에너지절감

(3) 추진성과

- 전년도 대비 역사 **공기질 약 16.8% 개선**(실내공기질 측정결과)

구분	2023년	2024년	증감
초미세먼지 농도($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.8	17.3	△ 3.6

- 환기설비 인버터 제어(60Hz ⇒ 45Hz)에 따른 **연간 에너지 약 641MWh 절감**

구분	수량	사용 전력량(MWh)		진행상황
		추진 이전	추진 이후	
역사 인버터	80대	3,340	1,408	18대 설치 완료, 62대 설계완료
본선 인버터	51대	10,625	4,479	9대 설치 완료, 42대 설계완료

(1) 추진배경

- ☐ 일반적으로 초미세먼지 농도값이 높은 승강장을 기준으로 공조기 일괄제어 중
- ☐ 대합실 측정기 신설 ⇒ 공조기 분산제어로 미세먼지 관리 고도화 및 에너지 절감




(2) 추진실적

- ☐ 기 간 : 2024. 5. ~ 2024. 11.
- ☐ 대 상 : 2호선 지하역사 21개역 대합실
- ☐ 주요내용 : 대합실 초미세먼지 자동측정기 21대 구매 및 설치
- ☐ 소요예산 : 705백만원(국·시비 4 : 6)

(3) 추진성과

- ☐ 대합실·승강장 초미세먼지 농도 개별측정 및 분산제어로 에너지 절감
- ☐ 실시간 데이터 반영에 의한 고도화된 정밀제어로 쾌적한 역사환경 조성
- ☐ 외함에 설치된 LED 판넬을 광고·홍보 용도로 활용 가능

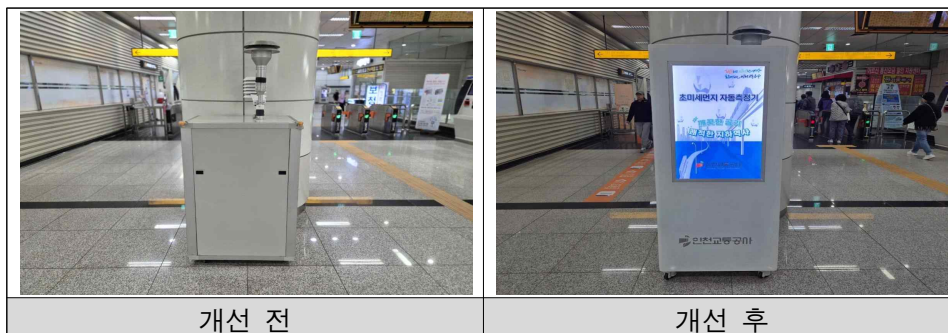

건설현장 스마트 안전장비 도입

(1) 추진배경

- 정부의 스마트 안전장비 지원사업 확대 및 의무화 추세
- 국토안전관리원 주재한 '50억 미만 소규모 건설현장 스마트 안전장비 지원사업' 모집 공고 확인 후, 이동편의시설 건설현장 2개소(가정, 동막)에 적용 가능한 스마트 안전장비 2종류 신청

(2) 추진실적

- 스마트 안전장비 이동편의시설 현장 총 5대 선정
○ 장비 협착 방지 장치 2대, 위험구역 접근 알림장비 3대 선정

현장	지원장비(대)	
	장비 협착 방지 장치	위험구역 접근 알림장비
가정역	1	2
동막역	1	1

- ## ○ 스마트 안정장비 선정결과

[illegible]

(3) 추진성과

- 이동편의시설 설치공사 현장 스마트 안전관리 시스템 구축으로 스마트 하고 효율적인 안전관리 가능
 - 장비 협착 방지 장치 : 장비에 협착 경보 장치를 부착하여 일정거리 이내 접근시 운전자 및 작업자에게 경고 및 알림을 통해 장비와 근로자 간 충돌 및 협착 예방
 - 위험구역 접근 알림장비 : 개구부 등 위험구역으로 접근하는 근로자 사전 경고 및 알림을 통해 작업자 미인지에 따른 추락사고 예방
- 스마트 안전장비 선정으로 예산 절감
 - **4,787,000원** 예산 절감 : 장비 협착 경보 알림장비 2대(1,523,500원/대) + 위험구역 접근 알림장비 3대(580,000원/대)
 - 스마트 안전장비 주요 기능 및 금액

장비명 (사 진)	주요 기능	물품 금액 (제조사)	적용 위험 요인·대상 (지원 가능 수량)
장비 협착 경보 알림장비 	• 영상인식 시스템을 탑재한 카메라와 모니터 및 스피커를 건설기계 또는 위험구역에 부착하여 실시간으로 사람을 감지하여 운전자 또는 보행자에게 위험상황을 알림	1,523,500원 (영신디앤씨)	적용 위험 요인 장비와 근로자 간 충돌 및 협착 적용 대상 건설기계에 부착 또는 위험구역 통로에 설치 지원 가능 수량 현장당 최대 1 EA
위험구역 접근 알림장비 	• 레이더 센서를 탑재한 장치를 위험구역에 간단히 설치하여 해당 구역 접근 시 사이렌 및 경보로 즉각 알림	580,000원 (휴랜)	적용 위험 요인 위험구역 미인지에 따른 추락 등 적용 대상 위험구역 접근 통로 등에 설치 지원 가능 수량 현장당 최대 2 EA

(4) 관련사진



(1) 추진배경

- 정부의 스마트 안전장비 지원사업 확대 및 의무화 추세
 - 2024 AIoT 국제전시회(과학기술정보통신부 주최) 출장 중 이동편의시설 현장 적용 스마트 기술조사를 통해 실시간 및 원격으로 조종 가능한 건설현장 CCTV 적용 가능 확인


(2) 추진실적

- 건설현장 스마트 CCTV 설치
 - 동막역 이동편의시설 설치공사 현장 스마트 CCTV 총3대 설치




(3) 추진성과

- 이동편의시설 설치공사 현장 스마트 안전관리 시스템 구축으로 스마트 하고 효율적인 안전관리 가능
 - PC 및 모바일로 현장 관리 가능 : 시간·공간적 제약이 없어 빈틈없는 공사현장 관리 가능

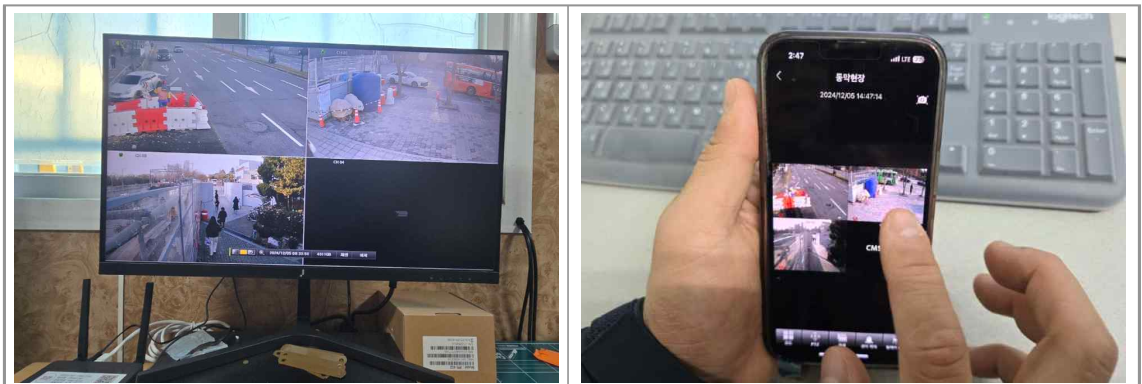

- 건설현장 및 주변 보·차도 확인 가능 : CCTV가 원격으로 360°회전 조작 가능하여 작업자 안전보호구 착용상태, 작업현황 등 건설현장 확인 뿐 아니라 인근 보도 및 차도 상태도 확인 가능하여 건설자재 반입 등 관련 공종시 집중 현장 관리 및 안전상태 확인

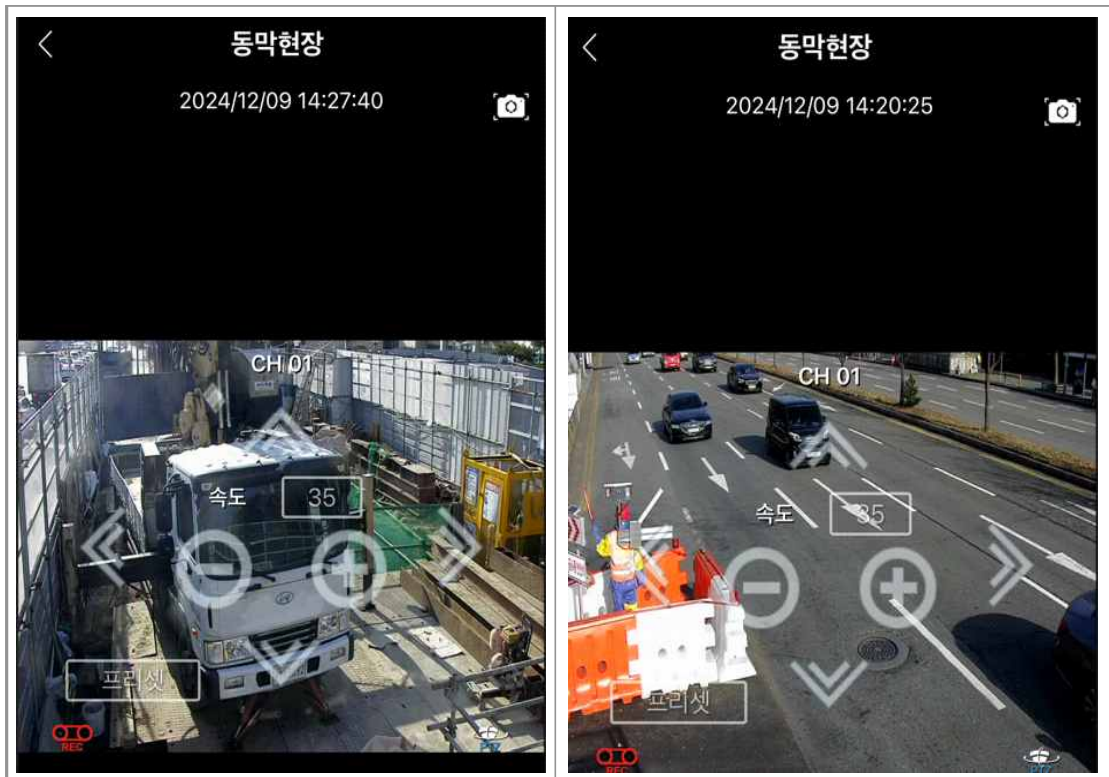

(1) 추진배경

- '동막역 이동편의시설 설치공사' 현장 3번 출입구 계단 철거에 따른 '자전거 경사로 철거'
- 3번 출입구에 ES설치에 따른 '자전거 경사로' 철거에 앞서 고객 편의 및 예산 절감을 고려하여 동막역 내 '자전거 경사로' 미설치 출입구에 '자전거 경사로' 재사용 검토

(2) 추진실적

- 4번 출입구 '자전거 경사로' 재사용 설치
- 3번 출입구 4번 출입구 '자전거 경사로' 재설치 업무지시

"철거하고 친환경재사용, 함께하는 친환경공사"

인천교통공사

수신 (영유) **성강종합건설(주)(동막역 현장대리인)**

제목 **업무지시서 통보 「인천1호선 동막역 3번 출입구 이동편의시설 설치공사(토목, 건축)」**

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「인천1호선 동막역 3번 출입구 이동편의시설 설치공사(토목, 건축)」에 대한 업무 지시서를 통보하니 이행하여 주시기를 바랍니다.

붙임 업무지시서(동막역)_001 1부, 끝.

인천교통공사 사장 

일련번호: 001/19
일련번호: 001/19
일련번호: 001/19

발신자: 인천교통공사(2024-09-19) 발송
수신자: 성강종합건설(주) (2024.09.19) 발송
주: 21510 인천광역시 남동구 중남로 574
전화번호: 032-461-0388 / 팩스번호: 032-461-2076 / 팩스번호: 032-461-2076 / 팩스번호: 032-461-2076

업무지시서

문서번호	2024-공사감독지시-01	문서명	인천1호선 동막역 3번 출입구 이동편의시설 설치신속공사
주 신	성강종합건설(동막역 현장대리인 외연군)	종 종	■건축 ■기계설비 ■토목 □교통
제 목	기계, 건축 분야 공사 시행 및 교통소통대책 반영 권		

○ 우리 현장의 토목, 건축 공정이 진행되는바, 동막역 내부계단 공정이 지연 되는바 1번 사항은 신속히 하시고 내역 미반영 2-4번은 추가하여 공사시행 하기 바랍니다.

1. 내부계단부의 철거이리프드 철거공사 시행(기계분야 시공사 미반영)

2. 현관승강기와 연결된 철거이리프드 철거공사 기계분야 확인(유선) : 기계 부관

3. 3번 출입구 자전거 이동로(계단부) 철거후 4번 출입구 재설치(추가)

4. 교통소통대책 반영(단절로 계획, 인력투입 등)

5. 계획서 제출(사용내역계획, 인력투입계획, 누락 총괄 관리 및 중립 관리 등)


○ 계획서는 시행전 제출하여 주시고 추가 시행 전은 내역 반영하여 설계변경 처리 바랍니다.

장기과 같이 업무를 지시하오니
이행하여 주시기 바랍니다.
2024. 09. 09 일


공사감독 박 경 현 (서명 또는 인)

- 자전거 경사로 이전 설치


- 3번 출입구 '자전거 경사로 해체' 및 4번 출입구 '자전거 경사로' 재설치

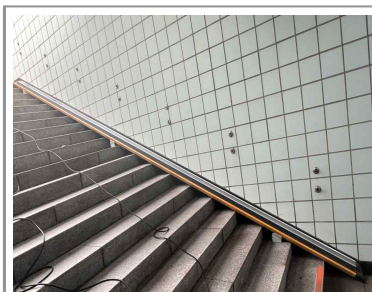

3번 출구 경사로 해체

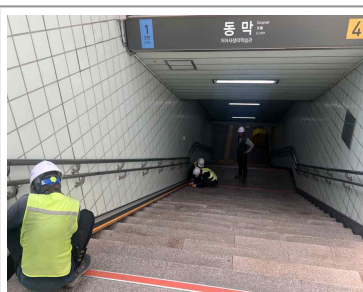


4번 출입구 자전거 경사로 설치

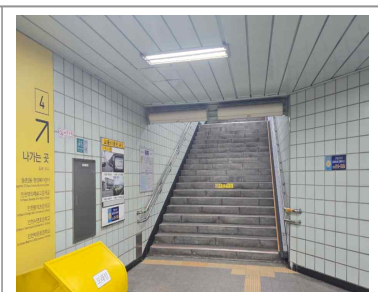

(3) 추진성과

□ 자전거 경사로 재료비 예산 절감

○ 5,280,000원 예산 절감 : 총24m × 220,000원/m

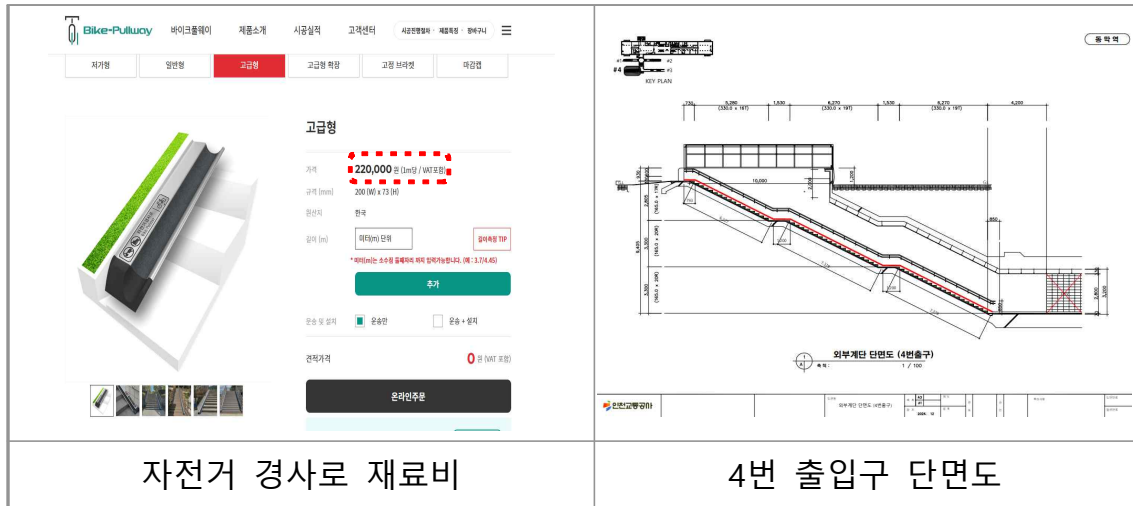

□ 고객 편의 증진

○ 동막역 자전거 이용 고객 이동 편의 증진
