

# 감사결과처분(요구)서

|                  |                            |          |           |          |                      |
|------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| 일련번호             | 22                         | 감사자      | 감사실       |          | 공 개( )<br>비 공개(○)    |
| 신분상 조치인원         | -                          | 재정상 조치방법 | 감액        | 재정상 조치금액 | 50,609,000원          |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△국립공원사무소<br>(△△△국립공원사무소) | 처분요구일자   | 2023. . . | 회신기일     | 처분요구일로부터<br>각 3개월 이내 |

△△△국립공원사무소  
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 △△ 진입도로 정비공사 공종 변경 필요  
관 계 기 관 △△△국립공원사무소  
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독원의 임무)

① 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에서 정하는 바에 따른다. <개정 2022.11.24.>

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경)

① 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다.

- 1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
- 2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
- 3. 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우

#### 4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

## 2. 현황 및 지적내용

### ○ △△ 진입도로 정비공사 현황

| 공 사 명                              | 공 사 기 간                   | 주 요 공 사 내 용   | 계약금액(천원) | 계 약 업 체 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|---------|
| △△국립공원 생태문화·교육 플랫폼 구축 △△ 진입도로 정비공사 | '21. 10. 29.~ '23. 5. 22. | △△ 진입도로 신설 1식 | 911,268  | △△△△(주) |

### ① 기존 농업용수로 및 오수관로 정비 관련 배수공 공종 변경 필요 현황

| 공 종                | 규 격                | 수 량   | 당 초     |            | 재 산 정  |           | 차액 계<br>(B-A, 원) | 비 고  |
|--------------------|--------------------|-------|---------|------------|--------|-----------|------------------|------|
|                    |                    |       | 단가      | 금액(A)      | 단가     | 금액(B)     |                  |      |
| 기존 배수공 (변경 전)      |                    |       |         |            |        |           | △28,745,939      |      |
| 토공                 |                    |       |         |            |        |           | △2,135,703       |      |
| 구조물터파기             | 토사                 | 419m³ | 1,257   | 526,683    | -      | -         | △526,683         | 삭제필요 |
| 뒤메우기 및 다짐<br>(콤팩터) | 백호0.7m³<br>(100%)  | 420m³ | 3,831   | 1,609,020  | -      | -         | △1,609,020       | 삭제필요 |
| 관로공                |                    |       |         |            |        |           | △6,319,740       |      |
| PE다중벽관             | D250               | 19본   | 126,315 | 2,400,000  |        |           | △2,400,000       | 변경필요 |
| PE다중벽관 접합 및<br>부설  | D=250mm,<br>환봉지지연결 | 110개소 | 35,634  | 3,919,740  | -      | -         | △3,919,740       | 변경필요 |
| PC암거               |                    |       |         |            |        |           | △20,290,496      |      |
| 부설 및 조립,<br>강선인장   |                    | 36m   | 162,236 | 5,840,496  | -      | -         | △5,840,496       | 삭제필요 |
| PC암거               | 1.0×1.0            | 37m   | 390,540 | 14,450,000 | -      | -         | △14,450,000      | 삭제필요 |
| 기존 배수공 (변경 후)      |                    |       |         |            |        |           | 1,163,340        |      |
| 토공                 |                    |       |         |            |        |           | -                |      |
| 구조물터파기             | 토사                 | 0m³   |         |            | -      | -         | -                |      |
| 뒤메우기 및 다짐<br>(콤팩터) | 백호0.7m³<br>(100%)  | 0m³   |         |            | -      | -         | -                |      |
| 관로공                |                    |       |         |            |        |           | 1,176,340        |      |
| PE다중벽관             | D200               | 10본   |         |            | 82,000 | 820,000   | 820,000          |      |
| 다중벽PE관 접합 및<br>부설  | D=200mm,<br>환봉지지연결 | 10개소  |         |            | 35,634 | 356,340   | 356,340          |      |
| PC암거               |                    |       |         |            |        |           | -                |      |
| 부설 및 조립,<br>강선인장   |                    | 0m    |         |            | -      | -         | -                |      |
| PC암거               | 1.0×1.0            | 0m    |         |            | -      | -         | -                |      |
| 소 계                |                    |       |         | 28,745,939 |        | 1,176,340 | △27,569,215      |      |
| 제경비                |                    |       |         | 7,841,678  |        | 266,953   | △7,574,725       |      |
| 총 계                |                    |       |         | 36,587,617 |        | 1,443,293 | △35,144,324      |      |

### ○ 사업개요

- 사업위치: △△ △△시 △△면 △△리 138번지 일원

- 사업금액: 금1,537,000,000원
- 사업규모: 3,150m<sup>2</sup> / 차량용 도로(길이 350m, 폭 9m)
- 사업기간: 절대공기 240일
- 사업목적: △△△국립공원 △△지구 내 친환경 야영장 사업대상지(現 주차장)와 현재 청소년수련시설로 고시된 향후 자연학습장(힐링센터) 조성사업 대상지를 연계하는 진입도로 조성사업으로 △△지구 슬럼화 극복과 생태체험 및 체류기반 시설 조성을 위한 기반 확보에 그 목적이 있음.

- △△△국립공원사무소에서는 생태문화·교육플랫폼 구축사업의 일환으로 신설 중인 △△야영장과 힐링센터를 연결하는 도로인 △△ 진입도로 정비공사를 시행(착공: '21. 10. 29.) 중에 있으며, 공사구간 내 기존 U형측구 농업용수로 를 정비하고자 PC암거 설치 및 힐링센터에서 배출되는 오수를 공공오수시설로 연결하기 위한 오수관로 설치를 설계에 반영하였으며,
- 공사사진 확인결과 기존 농업용수호가 충분히 제기능을 유지하고 있어 정비가 불필요하고, 힐링센터 신축계획 확인결과 힐링센터 오수관로와 진입도로 오수관로 관경이 다르고 관로 접합 수량이 과다 설계되어 있어 현장 실정에 맞게 변경이 필요한 실정임.
- 설계내역 중 반영되어 있는 PC암거 설치 수량을 변경하고(36m → 0m), 오수관로 관경을 D250mm → D200mm로 변경 및 관로 접합을 본당 1개소씩 접합으로 변경하여 공사비를 재산정할 경우, 공사비 약 35,144천 원을 절감할 수 있는 것으로 확인되었다.

- 설계도면 및 현황사진



## ② 전석쌓기 구조물공 공종 변경 필요 현황

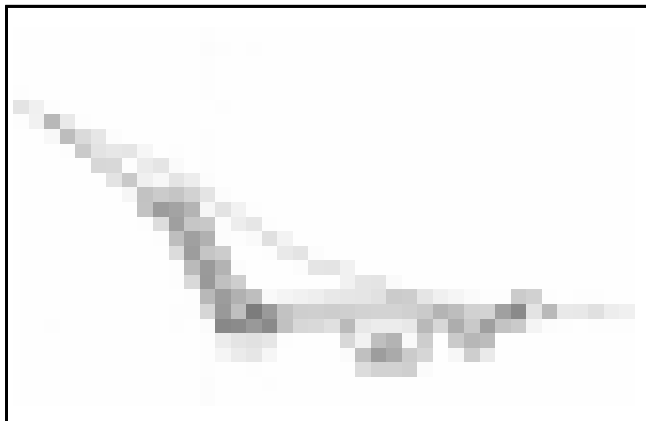
| 공 종               | 규 격         | 수 량  | 당 초    |            | 재 산 정 |       | 차액 계<br>(B-A, 원) | 비 고  |
|-------------------|-------------|------|--------|------------|-------|-------|------------------|------|
|                   |             |      | 단가     | 금액(A)      | 단가    | 금액(B) |                  |      |
| 기존 구조물공 (변경 전)    |             |      |        |            |       |       | △9,488,940       |      |
| 전석쌓기              |             |      |        |            |       |       | △9,488,940       |      |
| 레미콘타설<br>(장비사용타설) | 무근<br>구조물   | 88㎡  | 20,698 | 1,821,424  | -     | -     | △1,821,424       | 삭제필요 |
| 유로폼               | 간단,<br>0~7m | 170㎡ | 23,758 | 4,038,860  | -     | -     | △4,038,860       | 삭제필요 |
| 뒷채움잡석             | 램머다짐        | 285㎡ | 7,158  | 2,040,030  | -     | -     | △2,040,030       | 삭제필요 |
| 부직포설치             |             | 949㎡ | 1,674  | 1,588,626  | -     | -     | △1,588,626       | 삭제필요 |
| 기존 구조물공 (변경 후)    |             |      |        |            |       |       |                  |      |
| 레미콘타설<br>(장비사용타설) | 무근<br>구조물   | 0㎡   | -      | -          | -     | -     | -                |      |
| 유로폼               | 간단,<br>0~7m | 0㎡   | -      | -          | -     | -     | -                |      |
| 뒷채움잡석             | 램머다짐        | 0㎡   | -      | -          | -     | -     | -                |      |
| 부직포설치             |             | 0㎡   | -      | -          | -     | -     | -                |      |
| 소 계               |             |      |        | 9,488,940  |       | -     | △9,488,940       |      |
| 제경비               |             |      |        | 5,976,376  |       | -     | △5,976,376       |      |
| 총 계               |             |      |        | 15,465,316 |       | -     | △15,465,316      |      |

○ △△ 진입도로가 임야 사면을 절토하여 조성되는 부지인 바 도로 한쪽면이

경사지임에 따라 구조물공으로 전석쌓기를 설계에 반영하였으며,

- 계획도면 및 공사사진 확인결과 사면에 전석을 붙여 쌓고 하단 접합부인 포장도로 측구가 전도예방 지지대 역할을 충분히 할 것으로 판단되어 기초 콘크리트, 뒷채움잡석, 부직포 공종을 삭제하여 공사비를 재산정할 경우 **약 15,465천원을 절감**할 수 있는 것으로 확인되었다.

- 설계도면 및 현황사진

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 전석쌓기 단면도                                                                           | 전석쌓기 대상지 현장사진                                                                       |

### 3. 조치할 사항

- **재정상 감액** (단기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 현장 여건에 맞는 공종 변경·삭제 등 설계변경을 통해 총 공사비(50,609천원) 예산을 절감하도록 감액 조치

- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련
