

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사 산악 할증 적용 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 우수 및 탐방객 답압 등에 의한 훼손노면 정비를 통해 탐방객 안전사고 예방 및 양질의 탐방서비스 제공을 위하여 「2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사」를 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

국토교통부의 「건설공사 표준품셈」에 따라 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적정공사비 산정을 위하여 공사규모, 현장조건 등을 감안하여 적용하고, 작업 지연과 지세/지형 등 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

- 시공위치의 형상(산지 등) 등의 조건에 의해 작업효율에 영향을 받는 경우 할증 (인력품)을 산악지 50%, 야산지 25%, 습지 20%, 경사지 20%까지 가산할 수 있음.

- 단, 작업 조건의 개선(지형 평탄화, 탑승장비 활용 등)으로 본 작업의 영향을 받지 않는 경우 적용하지 않는다.

3. 감사결과 확인된 문제점


△△△△△△△△△△에서는 「2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사」 사업을 추진하면서 [표 1]과 같이 로프난간 84m, 목재교량(평형) 10m, 목재계단 100단, 조경석 쌓기 76m, 목재데크 계단 171경간 등을 설치하였다.

[표 1] 2023년 훼손탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	2023. 7. 10. ~ 2023. 12. 11.	로프난간 84m 조경석 쌓기 76m 목재데크 계단 171경간 신설 등	***,***	△△△△(주)

위 사업에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 목재교량(평형) 시공 시 [그림]과 같이 탑승장비(굴삭기)를 사용하여 산악 할증을 적용하지 않는 것이 타당함에도 산악할증(인력품) 25%를 적용한 사실을 확인하였다.

[그림] 현황사진

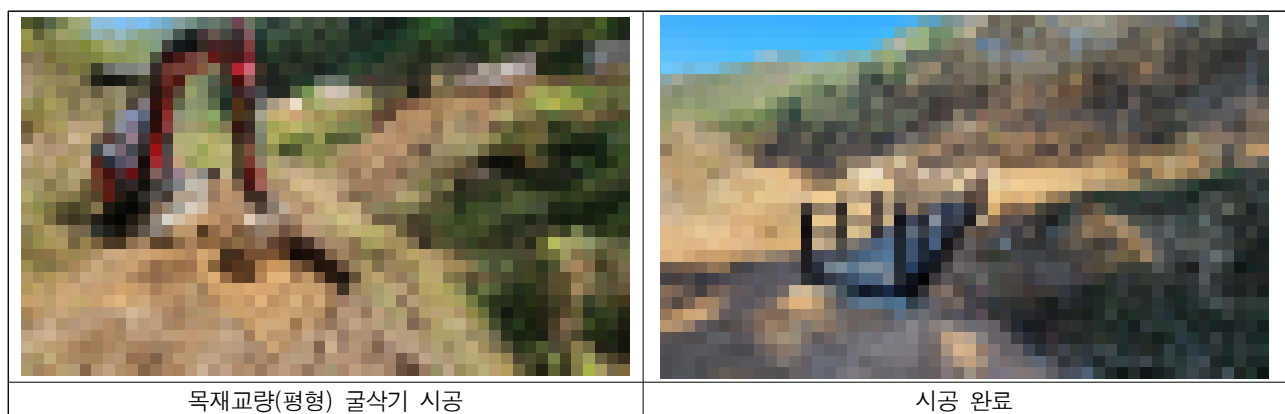

이에 따라, 아래 [표 2]와 같이, 사업 추진 시 변경 또는 공사 준공 시 산악 할증 적용을 제외하지 않은 채 과다 집행한 공사비(금*,***,***원)에 대하여 회수할 필요가 있다.

[표 2] 2023년 훼손탐방로 정비공사 산악할증 적용 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사								
1구간 (진관△△~△△) 목재교량(평형)	W2000, L=10m	1개소	**,***,***	**,***,***	**,***,***	**,***,***	—	
산지할증	야산지 25%	1식	*,***,***	*,***,***	—	—	△*,***,***	
소 계			**,***,***	**,***,***	**,***,***	**,***,***	△*,***,***	천원미만 절사
제경비							△*,***,***	
총 계							△*,***,***	

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△)은 굴삭기를 사용하였음에도 인력품으로 산악 할증 적용하여 과다 집행한 공사비 *,***,***원에 대하여 재정상 회수 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)
