



회수, 통보

제 목 2022년 안전쉼터 조성공사 미시공 공사비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 △△△△의 자연생태계를 보전하고, △△△△을 이용하는 국민의 안전사고 예방 및 편의 제공을 위해 △△△△ 산행 중 잠시 쉴 수 있도록 휴식공간을 제공하기 위하여 ‘2022년 △△△△△△△ 안전쉼터 조성공사’를 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수

등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

※ 2022년 △△△△△△ 안전쉼터 조성공사


공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 △△△△△△ 안전쉼터 조성공사	2022. 6. 21. ~ 2022. 8. 29.	□ 안전쉼터 조성 *개소 - 쉼터 데크, 벤치, 구급함, 배낭걸이대 등	**,***	△△△△△△(주)

[표24] 2022년 △△△△△△ 안전쉼터 조성공사 누락분 공사비 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2022년 △△△ 안전쉼터 조성공사								
1공구 안전쉼터 데크A	3,000x2,500	1개소	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	△**,***	
2공구 안전쉼터 데크B	3,000x4,000	1개소	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	△**,***	
3공구 안전쉼터 데크B	3,000x4,000	1개소	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	△**,***	
소 계							△***,***	
제경비							△***,***	
총 계							△***,***	천원만 절사

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

○ 현황사진

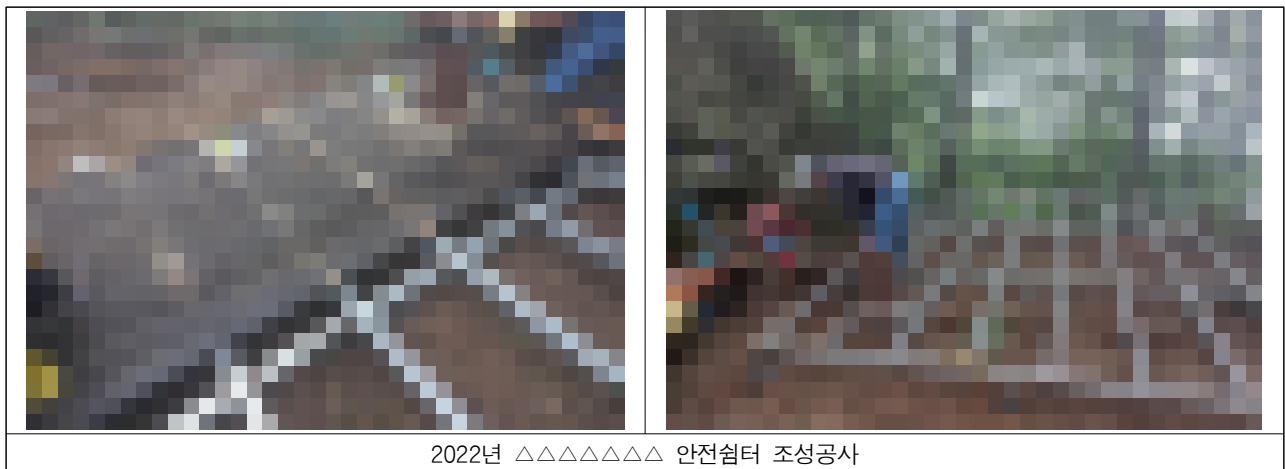

△△△△△△△△△△에서는 「2022년 △△△△△△△ 안전쉼터 조성공사」를

추진하면서 총 *개소에 안전쉼터 데크를 설치하였으며 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 위 현황사진과 같이 안전쉼터 데크(*개소) 모두에 녹막이페인트칠(*회)을 누락한 사실이 있음을 확인하였다. [표]에서처럼 녹막이페인트칠(*회)에 대하여 준공내역서 기준 일위대가 및 사업량을 고려 하였을때 미시공 공사비(금***,***원)를 과다 집행한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 미시공 공사비로 과다 집행한 공사비***,***원에 대하여 재정상 회수 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)
