

종합감사
공개용

부산대학교병원 시설관리팀 감사결과 보고서



2022. 5.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I. 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	3
4. 감사결과 처리	4
II. 감사대상 현황	5
1. 부서운영 분야	5
2. 주요업무 분야 및 현황	7
III. 감사 결과	10
IV. 처분요구와 통보사항	11
1. 처분요구사항 일람표	11
2. 신분상 조치인원 명세	11
3. 처분요구상세	11
가. 공정별 분할계약 부적정	12
나. 공사면허 소지여부 미확인	15
다. 건설폐기물 처리 절차 부적정	18
라. 건설기술인 현장배치 미확인	20
마. 법정경비 계상 미적용	22
바. 하자보수 관리 미흡	25
사. 공공요금관리 및 처리업무 개선	28
아. 시설공사 감염위험도 평가 미흡	30
자. 시설관리팀 관련 위원회 관리 미흡	32

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 부산대학교병원 시설관리팀(이하 ‘시설관리팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2022년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 시설관리팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 시설관리팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 그리고 시설관리팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원의 규정과 정책 등을 준수하는지의 여부, 종전 종합감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 시설관리팀에서 2019. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지 수행한 업무에 한정하여 검토하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2022. 3. 7. ~ 2022. 3. 11.)를 거쳐 2022. 3. 14.부터 2022. 3. 25.까지 10일간 내부감사인 8명과 국립대학교병원 협동감사제도를 활용한 외부감사인²⁾ 1명을 투입하여 협동감사를 실시하였다.

1) 시설관리팀-597(2022.02.25.) ‘부산대학교병원 시설관리팀 종합감사 실시통보 및 감사자료 제출요구에 대한 회신’

2) 전남대학교병원으로부터 감사 인력(시설관리팀 시설3급 이길현)을 지원받음. 실제 지원기간은 2022. 3. 14. ~ 2022. 3. 18. 5일간

분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ①주요 업무분야에서는 시설의 기본계획 수립, 설계, 시공, 감독, 준공검사 관련 서류 및 전자문서를 검토하였고, ②부서 운영의 적정성을 확인하기 위해 경비정산내역 및 자산운용현황을 점검하였으며, ③복무관리 실태를 점검하기 위하여 부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 'PHIS'에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 부당 및 개선사항과 관련하여 시설관리팀으로부터 의견을 듣고 의견을 조정하기 위해 시설관리팀장 등이 참석한 가운데 2022. 3. 25.(금) 감사마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2022. 5. 4.(수) 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황


1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

시설관리팀은 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설관리 및 재해방지, 안전관리에 관한 업무를 수행하는 부서로서 「부산대학교병원 직제규정」 제11조에 따라 사무국 밑에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, 팀원 20명 등 총 21명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 시설관리팀 조직도

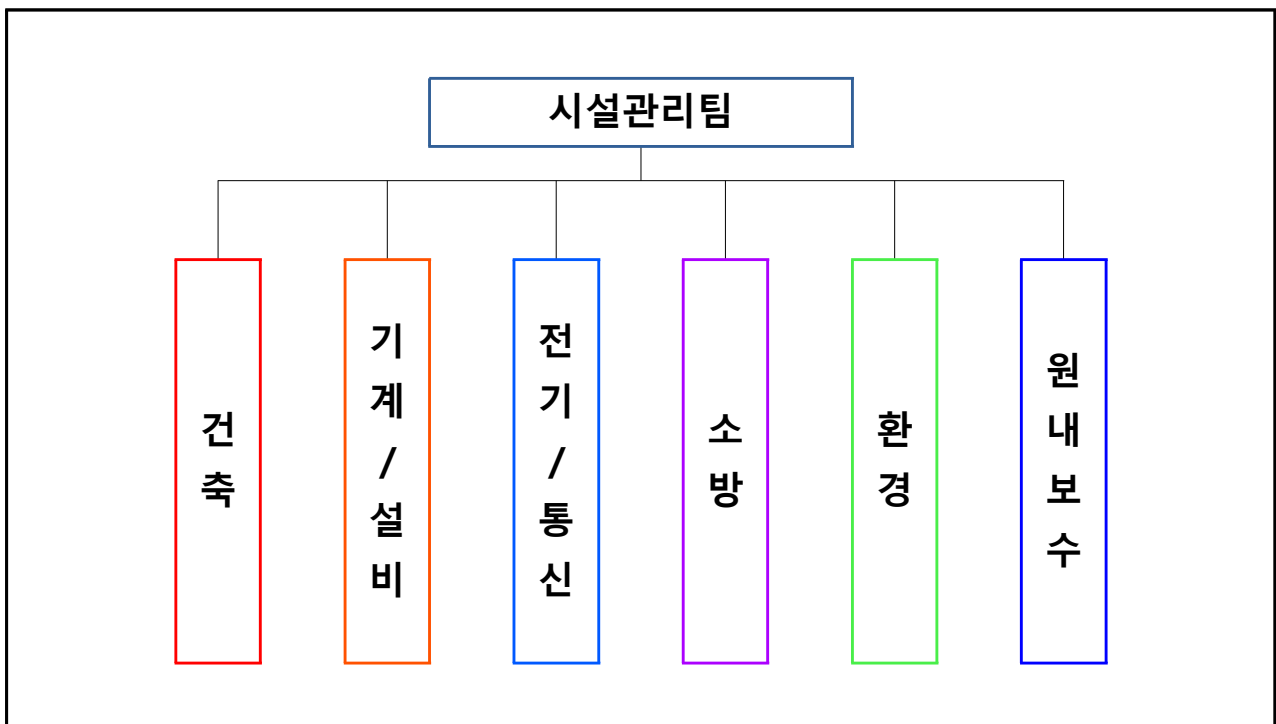

[표 1] 시설관리팀 인력 현황

※ 기준일: 각 연도별 12. 31.

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	가급	나급	소계	계약직	총계
2019	일반직	시설직	1	4	1	4	3				13		13
		행정직			1						1		1
		원무직				1		1	2	1	5	1	6
		원무기술직					1				1		1
		합계	1	4	2	5	4	1	2	1	20	1	21
2020	일반직	시설직	1	4	2	3	3				13	1	14
		행정직			1						1		1
		원무직			1		1	2	1		5	1	6
		원무기술직					1				1		1
		합계	1	4	4	3	4	1	2	1	20	2	22
2021	일반직	시설직	1	4	3	2	2				12	1	13
		행정직		1							1		1
		원무직			1		1	2	1		5	1	6
		원무기술직				1					1		1
		합계	1	5	4	3	2	1	2	1	19	2	21

※ 계약직 현황: 시설직 1명(육아휴직 대체), 원무직 1명(고령자고용촉진법 채용인력)

※ 행정직: 노동조합 지부장 / 원무기술직: 노동조합 부지부장

나. 부서예산 현황

최근 3년간 시설관리팀의 예산 배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 시설관리팀 예산집행 현황

(단위: 원, %)

연도	예산액	집행액	잔액	집행률(%)	비고
2019	40,616,558,000	13,568,687,924	27,047,870,076	33.4%	
2020	20,753,176,128	14,337,748,944	6,415,427,184	69.1%	
2021	21,346,737,030	17,711,786,180	3,634,950,850	82.9%	

※ 2019년 예산 집행률 70% 이하 사유: 건축 시설계획의 변경·취소로 인한 집행액 감소

2. 주요업무 분야 및 현황

가. 주요업무 내용

시설관리팀의 주요업무는 [표 3]과 같다.

[표 3] 시설관리팀 주요업무

- 1) 자체 시설공사 기본계획, 설계, 시공, 감독, 준공검사에 관한 사항
- 2) 시설물의 유지관리에 관한 사항
- 3) 각종 시설물의 안전 점검에 관한 사항
- 4) 시설물(건물·구축물·토지 등) 관리의 용역 위탁에 관한 사항
- 5) 토목·마공·도공에 관한 사항
- 6) 각종설비의 운전에 관한 사항
- 7) 환경보전에 관한 사항
- 8) 각종 설비용역에 대한 행정 및 지휘·감독에 관한 사항
- 9) 의료폐기물 및 지정폐기물 관리에 관한 사항
- 10) 소방 및 방재 대비 계획의 수립 / 소방시설 및 장비의 점검·유지관리에 관한 사항
- 11) 자체 공사용 자재의 조달요청에 관한 사항
- 12) 시설물의 철거에 관한 사항

나. 주요사업 추진실적

최근 3년간 시설관리팀의 주요사업 추진실적은 [표 4]와 같다.

[표 4] 시설관리팀 주요사업 추진실적

(단위 : 천원)

연도	건명 및 사업내용	사업기간	집행률(%)			사업성과	비고
2019	○ A동 2층 약제부 (항암, TPN, IV) 임상약국 이전설치공사	2018.12.26.~ 2019.04.24. (133일)	예산	1,559,441	77.9%	안정적 근무환경 (크린룸) 조성	
			집행	1,215,103			
	○ A동 장례식장 리모델링공사	2019.02.11.~ 2019.04.11. (60일)	예산	1,056,116	76.9%	시설환경개선, 수익창출	
			집행	812,611			

연도	건명 및 사업내용	사업기간	집행률(%)			사업성과	비고
2019	○ 화재수신반 교체(C동)	2019.05.09.~ 2019.06.22. (45일간)	예산	150,000	26.6%	화재감시 성능보강	
			집행	39,960			
	○ D동 냉난방기 노후에 따른 교체 공사	2019.05.25.~ 2019.10.14. (143일)	예산	300,000	80.2%	안정적인 병동 환경 조성	
			집행	240,527			
2020	○ B동 3층 심장초음파실 리모델링공사	2020.09.11.~ 2020.10.10. (22일)	예산	208,174	88.2%	노후시설 개선, 의료서비스향상	
			집행	183,628			
	○ 화재수신반 교체(B동)	2020.10.07.~ 2020.11.26. (51일)	예산	150,000	25.6%	화재감시 성능보강	
			집행	38,350			
	○ B동 스프링클러 알람밸브 교체	2020.12.09.~ 2021.01.08. (31일)	예산	300,000	5.3%	화재감시 성능보강	
			집행	16,000			
2021	○ A동 2층 통원수술실 이전 및 리모델링	2021.10.12.~ 2021.11.10. (30일)	예산	1,128,500	25.7%	노후시설 개선, 의료서비스향상	
			집행	290,320			
	○ E동 2층 ECU 리모델링	2021.05.14.~ 2021.06.22. (40일)	예산	1,123,511	81.8%	격리병상 신설, 노후시설개선	
			집행	919,066			
	○ E동 1층 응급실 리모델링	2021.09.10.~ 2021.11.08. (60일)	예산	1,718,878	80.4%	노후시설 개선, 감염 환자 대처	
			집행	1,381,142			
	○노후 UPS 교체공사	2021.04.01.~ 2021.04.20. (20일)	예산	150,000	19.1%	안정적인 의료용 전력 공급	
			집행	28,673			
	○ B동 흡수식 냉온수기 교체	2021.12.28.~ 2022.01.10. (14일)	예산	115,786	99.1%	에너지 절감	
			집행	114,786			
	○ E동 1호 보일러 교체	2021.12.28.~ 2022.01.10. (14일)	예산	150,000	48.5%	에너지 절감	
			집행	72,765			

예산집행률 70% 이하 사유

○ 2019년, 2020년 화재수신반 교체

- 설계용역 및 감리지정, 입찰공사에 대비하여 예산책정 하였으나, 소방시설공사업법의 개정으로 소방감리지정대상 면제되고 해당 장비 구매 및 설치공사를 분리 발주하여 예산이 일부 집행됨.

○ 2020년 B동 스프링클러 알람벨브 교체

- 스프링클러설비 미설치 구역인 D동 1층 재활의학과 외래/치료실, 초음파실 리모델링 계획에 따라 스프링클러설비 보강예산을 책정하였으나, 코로나19 등 병원사정으로 리모델링 공사가 연기되어 예산이 일부 집행됨.

○ 2021년 A동 2층 통원수술실 이전 및 리모델링

- 당초 사업계획 시 국고지원금을 감안하여 중앙공급실 확장사업에 포함되어 진행된 사업으로 내부 마감재료 및 공법이 중앙공급실에 맞춰진 사업계획이었으나, 국고지원금 대상에서 제외되어 예산절감을 위해 내부 마감재료 및 공법을 변경함.

○ 2021년 노후 UPS 교체공사

- 당초 사업계획 시 C동 UPS와 A동 2층 진단검사의학과 UPS 교체를 검토하였으나, 노후화 진행 정도를 점검한 결과 C동 UPS는 교체하고, A동 2층 진단검사의학과 UPS는 일부 부품만을 교체하여 수명연장 시켜 예산을 절감함.

○ 2021년 E동 1호 보일러 교체

- 기존 E동 보일러는 노통연관보일러로 동일한 보일러 모델로 예산을 책정하였으나 교체 전 좀 더 세밀한 검토 과정에서 보일러 에너지 효율, 운전시간, 용도 등을 고려하여 노통연관보일러에 비하여 금액이 저렴한 관류보일러로 결정하여 예산을 절감함.

다. 부서운영경비 사용 현황

최근 3년간 시설관리팀의 부서운영경비 사용 현황은 [표 5]과 같다.

[표 5] 시설관리팀 부서운영경비 사용 현황

(단위: 천원, %)

연도 업무추진비내역	2019			2020			2021		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	3,320	3,320	100%	3,720	3,720	100%	4,520	4,520	100%

III 감사결과

감사결과 총 9건에 대해 처분요구 종류별로 구분하면 [표6]과 같으며, 감사결과 확인된 주요 문제점은 아래와 같다.

[표6] 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

건수	합계		변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
	금액	인원								일반	시정 완료	인사자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
9		2			3	2(2)		1	4	1						

감사결과 확인된 주요 문제점

- 단일공사 분할계약 부적정
 - 단일공사에 대하여 공정별 시기 및 공사량을 분할하여 수의계약 진행
- 공사면허 소지여부 미확인
 - 각종 공사를 실시하면서 전문 공사 면허가 등록되지 않은 업체와 공사 진행
- 건설폐기물 처리 절차 부적정
 - 100ton 이상 건설폐기물 처리 시 분리발주 미이행
 - 배출자 신고 여부 및 신고필증 미확인, 관련서류 미구비
- 건설기술인 현장배치 미확인
 - 건설공사 현장에 건설기술인을 배치하여야 하나 배치 사실에 대해 발주자 미확인
- 법정경비 계상 미적용
 - 2천만원 이상 공사 건에 대해 산업안전보건관리비 계상 미적용
 - 모든 건설공사에 대해 산재 및 고용보험료, 환경관리비 계상 미적용
- 하자보수 관리 미흡
 - 하자담보책임기간 중 정기적 하자발생 여부 검사 일부 누락
 - 최종검사 완료 후 하자보수 완료확인서 미발급
- 공공요금관리 및 업무처리
 - 전자문서 없이 지로용지로 처리(문서의 성립 및 효력에 문제) / 예산합의신청 누락
- 시설공사 감염위험도 평가 미흡
 - 의료기관 내 모든 공사 진행 시 감염위험도 평가를 실시하여야 하지만 114건에 대해 미실시
- 위원회 관리 미흡
 - 공공건축심의 미이행 및 공공건축심의위원회 규정 미제정
 - 시설환경관리위원회 및 에너지절약추진위원회 관련 규정 미준수

이에 대하여 시설관리팀에서 추진한 공사 계약 및 업무처리에 있어 경미한 사안은 통보·권고·개선을 요구하였고, 중대한 사안에 대해서는 시정요구 및 주의를 요구하였다.

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	시설관리팀	공정별 분할계약 부적정	주의 및 시정		1	처분 후 2개월 내	
2	"	공사면허 소지여부 미확인	주의 및 시정		1	"	
3	"	건설폐기물 처리 절차 부적정	시정			"	
4	"	건설기술인 현장배치 미확인	권고			"	
5	"	법정경비 계상 미적용	권고			"	
6	"	하자보수 관리 미흡	통보			"	
7	"	공공요금관리 및 업무처리 개선	개선			"	
8	"	시설공사 감영위험도 평가 미흡	권고			"	
9	"	시설관리팀 관련 위원회 관리 미흡	권고			"	

2. 신분상 조치인원 명세

제목	처분내역			
	조치결과	소속	직급	성명
공정별 분할계약 부적정	주의	부산대학교병원 시설관리팀	시설 2급	◇◇◇◇
공사면허 소지여부 미확인	주의	부산대학교병원 시설관리팀	시설 2급	◇◇◇◇

3. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

주의 및 시정요구

제 목 공정별 분할계약 부적정

소관부서 부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 부산대학교병원 시설관리팀, 부산대학교병원 인력개발팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령(판단근거)

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제68조(공사의 분할계약금지) 1항 동일 구조물 공사 및 단일공사로서 설계서등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

부산대학교병원 시설관리팀에서 시행한 공사를 확인한 결과 [표1]과 같이 단일공사에 대하여 공정별 시기 및 공사량을 분할하여 수의 계약한 사실을 확

인하였다. 이는 수의계약을 위한 분할계약으로 의심될 여지가 있어 공공기관이 지켜야 할 공정한 절차를 준수하여 업무를 진행했다고 판단하기 어렵다.

[표1] 공정별 분할계약 내역 (2019년~2021년)

(단위: 천원)

No	연도	사업명	업체명	준공금액	준공일	비고
1	2019	D동 2층 구.2병동(남) 응급전용병동 경량작업	비공개	16,700	2019-07-30	
	2019	D동 2층 응급전용병동 바닥(시트) 설치작업		18,000	2019-07-30	
	2019	D동 2층 응급전용병동 도색작업		9,700	2019-07-30	
	2019	D동 2층 응급전용병동(구.2병동[남]) 의료가스 콘솔 교체		13,860	2019-07-30	
2	2019	D동 2층 2병동(북) 바닥재(시트)교체작업		19,000	2019-10-08	
	2019	D동 2층 2병동(북) 내부 경량작업		18,700	2019-10-08	
	2019	D동 2층 2병동(북) 내부 인테리어 작업		17,000	2019-10-08	
	2019	D동 2층 2병동(북) 내부 및 복도 벽면 도색작업		11,900	2019-10-08	
	2019	D동 2층 2병동(북) 위생 설비 작업		12,300	2019-10-08	
	2019	D동 2층 2병동(북) 의료가스 콘솔 교체작업		19,000	2019-10-08	
3	2019	D동 2층 응급전용병동 스프링클러 신설공사		21,400	2019-07-30	
	2019	D동 2층 2병동(북) 스프링클러 신설공사		21,400	2019-10-08	
4	2019	A동 지하1층 장례식장 리모델링 통신공사		35,142	2019-04-11	
	2019	A동 지하1층 장례식장 안내설비 구축		12,100	2019-05-20	
5	2019	R동 3층 기관지내시경실 내부 차폐자동문 및 일반자동문 설치작업		16,500	2019-09-05	
	2019	R동 3층 기관지내시경실 내부 보수작업		17,600	2019-09-05	
6	2019	A동 1층 동측용 노후공조기 구입 교체에 따른 덕트작업		11,000	2019-11-10	
	2019	A동 1층 동측용 노후공조기 교체에 따른 배관작업		15,000	2019-11-10	
7	2020	A동 10층 조혈모세포이식병동[무균실(BMT)] 및 10병동 일부 리모델링에 따른 바닥교체작업		18,700	2020-11-23	
	2020	A동 10층 조혈모세포이식병동[무균실(BMT)] 및 10병동 일부 리모델링에 따른 자동문설치작업		17,500	2020-11-23	
8	2020	B동 화재수신반 교체 및 네트워크작업		19,200	2020-11-26	
	2020	B동 화재수신반 교체 및 네트워크작업 관련 장비구매		19,150	2020-11-26	

No	연도	사업명	업체명	준공금액	준공일	비고
9	2021	R동 5층 호흡기중환자실(RICU) 바닥면 보수공사 시행(안)	비공개	20,500	2021-12-10	
	2021	R동 5층 호흡기중환자실(RICU) 바닥재 설치공사 시행(안)		19,000	2021-12-10	
	2021	R동 5층 호흡기중환자실(RICU) 창호공사 시행(안)		10,300	2021-12-15	
10	2021	E동 2층 응급의료중환자실(EICU) 음압격리실 신설 및 내부보수공사(건축.기계설비)		535,310	2021-06-22	
	2021	E동 2층 응급의료중환자실(EICU) 음압격리실 신설 및 내부보수공사(자동문설치작업)		10,500	2021-07-06	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 단일공사에 대해서 공정별 시기를 분할하거나 공사량을 분할하여 진행하지 않겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

단일 공사에 대하여 공사량을 분할하여 수의 계약하는 일이 없도록 철저히 관리하여 주시기 바라며,(시정요구) 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 소홀히 한 부서장에게 [주의] 조치하여 주시기 바랍니다.(주의)

[관련자] 부산대학교병원 사무국 시설관리팀 시설2급 ◇◇◇ 【주 의】

부 산 대 학 교 병 원

주의 및 시정요구

제 목 공사면허 소지여부 미확인

소관부서 부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 부산대학교병원 시설관리팀, 부산대학교병원 인력개발팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설 물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령

건설산업기본법 제9조1항, 건설업을 하려는 자는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만 경미한 건설공사는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.[종합공사(5천만원 미만), 전문공사(1천5백만원 미만)]

3. 감사결과 확인된 문제

부산대학교병원 시설관리팀에서 시행한 시설공사 현황을 살펴본 결과 [표1]과 같이 TR동(외상센터,호흡기센터)4층 수술실 복도 및 내부 도색작업(의료기관 인증제대비) 외 16건에 대해서 전문공사 면허가 등록되지 않은 업체와 공사를 진행한 사실을 확인하였다.

[표1]공사면허 미등록 업체 현황

(기간: 2019년01월 ~ 2021년12월)

No	사업명	업체명	공사면허 등록현황	비고
1	TR동(외상센터,호흡기센터)4층 수술실 복도 및 내부 도색작업(의료기관인증제대비)	비공개	미등록	
2	TR동 5층 중환자실(호흡기,신경외과,외상외과) 내부 보수작업		미등록	
3	B동 1층 구.농협 공간 통합창구 설치작업		미등록	
4	A동 5층 북측 옥상 방음벽 설치작업		미등록	
5	B동 3층 비뇨기과 외래 내 채석기실 및 방광경실 내부 보수작업		미등록	
6	B동 1층 비즈니스센터,청소근로자휴게실 및 썬지도서관 이전 설치작업		미등록	
7	2019년도 스크류냉동기 정기 점검 및 정비작업		미등록	
8	A동 10층 조혈모세포이식병동[무균실(BMT)] 및 10병동 일부 리모델링에 따른 자동문설치작업		미등록	
9	E동 2층 응급의학과 의국 이전 및 청소용역 휴게공간 설치작업		미등록	
10	2020년도 스크류냉동기 정기 점검 및 정비작업		미등록	
11	E동 3층 (구)응급수술실 공간 내, 회복실 및 내시경실 신설		미등록	
12	D동 1층 영상의학과 혈관조영실 제2인터벤션실 클린룸 및 양압 시설 설치작업		미등록	
13	코로나19 확진자 입원병동(77~711) 복도 자동문 신설 작업		미등록	
14	코로나19 확진자 입원병동(77~711) 유리벽체 신설 작업 (의료진 퇴실동선 자동문 포함)		미등록	
15	S동 동측 외벽마감재 보수작업		미등록	
16	2021년도 스크류냉동기 정기 점검 및 정비작업		미등록	
17	(코로나전담)코로나19 전담병동 차압 모니터링 시스템 설치작업		미등록	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 향후 건설공사 시 공사 면허 소지여부를 확인하여 공사의 전반적인
공정, 안전 및 품질 관리가 철저하게 이루어질 수 있도록 노력하겠다는 의견
을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

공사계약 전 적법한 공사면허를 가진 계약대상자인지를 확인 후 공사를 시행
할 수 있도록 철저히 관리하여 주시기 바라며,(시정요구) 향후 이러한 사례가
발생하지 않도록 지도·감독을 소홀히 한 부서장에게 [주의] 조치하여 주시기
바랍니다.(주의)

[관련자] 부산대학교병원 사무국 시설관리팀 시설2급 ◇◇◇ 【주 의】

부 산 대 학 교 병 원

시 정 요 구

제 목 건설폐기물 처리 절차 부적정

소관부서 부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령

건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조에 따라 건설폐기물 100ton 이상인 경우에는 분리하여 발주하도록 되어 있고, 5ton 이상 발생하는 건설폐기물 처리도 폐기물관리법 제17조 따라 폐기물의 종류 및 발생량 등을 신고하여 신고필증을 받은 후에 처리하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

시설관리팀에서 시행한 시설공사 현황을 살펴본 결과 [표1]과 같이 E동 1층 응급실 리모델링공사(건축,기계) 외 2건에 대해서 건설폐기물 처리 절차를 부적정하게 진행한 사실을 확인하였다.

[표1] 건설폐기물 처리 절차 부적정 현황

(기간: 2019년01월 ~ 2021년12월)

No	사업명	업체명	폐기물 처리			관련서류 구비여부
			분리발주 여부	배출자 신고여부	신고필증	
1	E동 1층 응급실 리모델링공사 (건축, 기계)	비공개	미이행	신고	무	미구비
2	A동 2층 약제부(항암,TPN,IV) 및 임상약국 이전설치 건축, 기계공사		해당없음	신고	유	미구비
3	A동 2층 통원수술실 이전 설치공사 (건축)		해당없음	미신고	무	미구비

건설폐기물처리 관련 서류

- ① 건설폐기물 관리대장 ② 건설폐기물 처리 확인서 ③ 건설폐기물 처리 인계서
④ 건설폐기물 처리 계량증명서 ⑤ 현장 반출사진 ⑥ 입금증 / 이체증

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 향후 건설폐기물 처리에 있어 철저히 확인하여 관련법령에 위반되지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

건설공사 시 건설폐기물 발생량에 따라 분리발주 여부 및 폐기물 신고 여부 등을 철저히 확인하여 관련법령에 위반되지 않도록 관련부서와 협의하여 효율적인 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(시정요구)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 건설기술인 현장배치 미확인

소관부서 부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령

건설산업기본법 제40조①항, 동법 시행령 제8조①항에 따라 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 법령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 하며, 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인으로 해당 건설공사의 착수와 동시에 배치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

계약상대자는 건설산업기본법에 따라 건설기술인을 현장에 배치하여야 하며, 배치 사실에 대한 발주자의 확인을 받아야 한다. 하지만 [표1]과 같이 부산대학교병원 시설관리팀에서 실시한 다수의 건설공사[D동 4층 간호사 탈의실(1병동,52

병동,53병동) 및 용역원실 설치작업(의료기관 인증제대비) 외 55건]에 건설기술인의 현장배치 사실을 확인하지 않았다.

[표1] 건설기술인 현장배치 미확인 현황

(기간: 2019년01월 ~ 2021년12월)

년도	사업명	현장배치 사실확인
2019	D동 4층 간호사탈의실(1병동,52병동,53병동) 및 용역원실 설치작업(의료기관인증제대비) 외 27건	미확인
2020	(코로나관련) E동 1층 외부 선별진료소 환자대기공간 설치작업 외 15건	미확인
2021	코로나19 확진자 입원병동(77~711) 복도 자동문 신설 작업 외 11건	미확인

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 향후 건설공사 시 건설산업기본법에 따라 건설기술인을 현장에 배치하고, 현장배치 사실을 확인받아 철저히 관리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

건설공사 시 건설기술인을 현장배치하고 그 사실을 확인할 수 있도록 관련부서와 협의하여 효율적인 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 법정경비 계상 미적용

소관부서 부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설 물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

□ 관련법령

구분	관련법령
산업안전보건관리비	산업안전보건법 제72조 및 고용노동부에서 고시하는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」
산재보험료	산업재해보상보험법 제6조 및 동법 시행령 제2조
고용보험료	고용보험법 제8조 및 동법 시행령 제2조
환경관리비	건설기술진흥법 제66조 및 건설산업기본법 제2조

□ 적용범위

구분	적용범위
산업안전보건관리비	- 20.06.30 이전: 총공사 금액 4천만원 이상 공사 - 20.07.01 이후: 총공사 금액 2천만원 이상 공사
산재보험료 고용보험료	모든 건설공사
환경관리비	전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재 수리공사 제외 한 모든 건설공사

3. 감사결과 확인된 문제

시설관리팀에서 시행한 시설공사 현황을 살펴본 결과 [표1]과 같이 다수의 공사 건에서 법정경비 계상을 미적용한 사실을 확인하였다.

[표1]법정경비 계상 미적용 현황

(기간: 2019년01월 ~ 2021년12월)

년도	산업안전보건관리비	산재 / 고용보험료	환경관리비	비고
2019년	0건	25건	26건	
2020년	2건	13건	17건	
2021년	10건	21건	15건	
합계	12건	59건	58건	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 향후 시설공사 시 법정경비 항목인 산업안전보건관리비, 산재/고용보험료, 환경관리비를 계상하여 공사를 진행할 수 있도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

시설공사 시 법정경비 항목인 산업안전보건관리비, 산재/고용보험료, 환경관리비를 계상 효율에 맞게 산정하여 관련법령에 위반되지 않도록 관련부서와 협의하여 효율적인 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 하자보수 관리 미흡

소관부서 부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련법령(판단근거)

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제60조(공사계약의 하자담보 책임기간) 및 제61조(하자검사), 공사계약 일반조건 제35조에 따라 시설공사 준공 후 하자담보책임기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하고, 하자담보책임기간 만료 14일 전부터 만료일까지 최종검사를 실시하여야 하며, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수 완료확인서를 계약대상자에게 발급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

시설관리팀에서는 하자검사조서와 하자보수 관리대장을 비치하여 하자보수관리 업무를 수행하고 있으나, 하자담보책임기간 중 정기적 하자발생 여부 검사 일부 누락 및 하자보수완료 확인서를 계약 대상자에게 미발급한 사실을 아래 [표1]과 같이 확인하였다.

[표1] 하자보수 관리 미흡 현황 (3천만원 이상 공사계약)

(기간: 2019년01월 ~ 2021년12월)

No	사업명	하자담보 책임기간	하자검사 누락횟수	하자완료 확인서 발급 여부	비고
1	A동 2층 약제부(항암,TPN,IV) 및 임상시험약국 이전설치 건축,기계공사	2019-05-10 2021-05-09	1	미발급	
2	A동 지하1층 장례식장 리모델링 공사	2019-04-24 2021-04-23	1	미발급	
3	부산대학교병원 E동 1층 응급실 리모델링공사(건축,기계)	2021-11-22 2023-11-21	1	하자담보 책임기간 중	
4	부산대학교병원 A동 2층 통원수술실 이전 설치공사(건축)	2021-11-22 2023-11-21	1	하자담보 책임기간 중	
5	B동 아트리움(지하1층~지상5층) 원도우필름 설치	2021-12-15 2023-12-14	1	하자담보 책임기간 중	
6	A동 노후 스팀분배기 교체공사	2020-01-03 2022-01-02	2	미발급	
7	E동 26병동 뇌졸중집중치료실 신설공사(설비-의료가스)	2020-10-23 2022-10-22	2	하자담보 책임기간 중	
8	E동 1층 응급실 격리병상 설치공사(건축,기계설비)	2021-11-22 2024-11-21	1	하자담보 책임기간 중	
9	A동 2층 약제부(항암,TPN,IV) 및 임상시험약국 이전설치 전기공사	2019-03-27 2021-03-26	1	미발급	
10	A동 2층 약제부(항암,TPN,IV) 및 임상시험약국 이전설치 통신공사	2019-03-27 2021-03-26	1	미발급	
11	A동 지하1층 장례식장 리모델링 전기공사	2019-04-24 2021-04-23	1	미발급	
12	A동 지하1층 장례식장 리모델링 통신공사	2019-04-24 2021-04-23	1	미발급	
13	코로나19 확진자 입원병동(77~711) 출입통제설비 설치공사	2021-01-21 2022-01-20	2	미발급	
14	부산대학교병원 응급의료중환자실 음압격리실 신설 및 내부보수공사(전기)	2021-06-29 2023-06-28	1	하자담보 책임기간 중	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 현재 시행하고 있는 하자검사조서 및 하자보수 관리대장을 지속적으로 관리하며 발견된 하자의 이행 여부에 대한 결과 보고 및 하자보수 완료 확인서를 계약 대상자에게 발행하여 하자보수 관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

하자보수 진행 시 이행여부에 대한 결과 보고 및 하자보수 완료확인서를 계약대상자에게 발급하여 하자보수 관리에 만전을 기해주시기 바랍니다.(통보)

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 공공요금관리 및 업무처리 개선

소관부서 부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관계규정(판단근거)

「사무관리규정」 제4조(문서의 성립 및 효력)에 따르면 문서는 다른 특별한 규정이 없는 한 당해 문서에 대한 서명(전자문서명 포함)에 의한 결재가 있음으로써 성립하며, 문서가 수신자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생하는 도달주의를 원칙으로 하며, 「부산대학교병원 위임전결규정」 제11조(협의) ①항에 따라 제3조의 직무권한을 행사함에 있어서 다른 부서와 관련되어 협조를 필요로 하는 사항은 당해 부서장과의 협의를 거쳐야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

현재 매월 발생하는 전기료, 상하수도료, 난방사용료, 전화사용료의 정산 처리 절차를 확인한 결과 회계관리팀으로 납부 요청에 대한 문서(전자문서) 없이 지로용지만 직접 전달하는 방법으로 처리하고 있었으며, 공공요금에 대한 예산이 배정되어 있음에도 예산합의신청 또한 누락한 사실이 확인되었다.

따라서 시설관리팀에서는 공공요금 등의 정산 업무처리 시에는 내부결재와 같은 보고 절차를 준수하여 업무를 수행할 수 있도록 업무처리 방법을 개선할 필요가 있다.

[표1] 년도별 공공요금 납부현황

(단위: 원)

구분	전기요금	상하수도료	난방사용료	전화사용료
2019년	4,217,941,643	802,818,000	1,163,752,000	178,490,461
2020년	4,278,029,220	726,695,000	1,120,403,000	153,899,910
2021년	4,230,850,410	731,724,000	1,158,403,000	166,000,660
계	12,726,821,273	2,261,237,000	3,442,558,000	498,391,031

4. 관계기관 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 타부서와 관련된 업무처리 시에는 내부결재를 거쳐 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

공공요금 등의 정산 업무처리 시에는 내부결재와 같은 관리 절차를 거쳐 문서(전자문서)로 해당 부서에 전달될 수 있도록 업무처리 방법을 개선하시기 바랍니다.(개선)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 시설공사 감염위험도 평가 미흡

소관부서 부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련정책(판단근거)

부산대학교병원 감염관리 정책(정책번호 08-17)에 따르면 병원 건물의 건축, 보수 및 철거 시 감염위험도 사전 평가 및 예방관리 절차를 거쳐 깨끗한 환경을 유지해 의료관련감염 발생 위험을 예방하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 최근 3년간(2019.1.1.~2021.12.31.) 시설관리팀에서 시행한 시설공사 현황(천만원이상)을 살펴본 결과, 감염위험도 평가의 범위를 의료

기관 내 시행하는 건축 및 개보수 모두를 포함하도록 규정하고 있음에도 아래 [표 1]과 같이 복지동 직원식당 덤웨이터 보수 외 113건에 대하여 감염 위험도 평가를 누락한 사실을 확인하였다.

[표1] 천만원이상 시설공사 감염위험도 평가 누락 현황

년도	사업명
2019	복지동 직원식당 덤웨이터 보수 외 35건
2020	(코로나관련) E동 1층 외부 선별진료소 환자대기공간 설치작업 외 31건
2021	코로나19 확진자 입원병동(77~711) 복도 자동문 신설 작업 외 45건

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 병원 정책을 준수하여 향후 시행되는 시설공사에 대하여 감염위험도 평가가 누락되는 일이 없도록 업무 프로세스를 재정립하여 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

병원 정책에 따라 의료기관 인증평가 기준을 충족시킬 수 있도록 병원 내 모든 공사에 대하여 감염위험도 평가를 실시하여 위험 사정을 해소할 수 있도록 관련 부서와 협의하여 효율적인 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 시설관리팀 관련 위원회 관리 미흡

소관부서 부산대학교병원 시설관리팀

조치부서 부산대학교병원 시설관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 시설관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 건축·토목·기계·설비·전기·통신·소방·환경 등 병원 시설 전반에 관한 업무를 수행하며, 재해방지, 안전관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

2. 관련근거(판단근거) 및 감사결과 확인된 문제

□ 공공건축심의위원회 미설치 및 규정 미제정

① 관련 법령

건축서비스산업 진흥법 제22조의2(공공건축 건축기획의 수행 등), 제22조의3(공공건축심의위원회), 제23조(공공건축 사업계획에 대한 사전검토 등), 제24조(공공건축지원센터)에 따르면 공공기관은 건축 서비스 산업의 활성화와 공공건축의 품격을 향상시키기 위하여 공공건축심의위원회를 설치 및 아래 기준에 따라 운영하여야 한다.

- 시행시기: [본조신설 2018.12.18.], [시행일 공포 후 1년이 경과한 날]
- 공공건축 조성사업 절차

설계비 추정가격	건축기획업무 ①	사업계획사전검토 ②	공공건축심의 ③	설계공모 ④
5천만원 미만	필수	×	선택	선택
5천~1억원 미만	필수	×	필수	선택
1억원 이상	필수	필수	필수	의무(우선적용)

② 확인된 문제

공공기관은 건축서비스산업 진흥법 시행령 제19조2 제3항에 해당되는 공사 시행 시 공공건축심의위원회의 심의를 거쳐 사업을 진행하여야 하나 부산대학교병원은 공공건축심의위원회가 설치되어 있지 않고 규정 또한 제정되어 있지 않아 관련 심의를 거치지 않고 사업을 진행한 사실이 확인되었다.

□ 시설환경관리위원회 규정 정비 소홀 및 규정 미준수

① 관련 규정

시설환경관리위원회규정 제7조(보고)에 따라 시설관리팀장은 시설 및 설비 신규사업의 진행상태는 월 1회, 시설 및 설비 운용 및 유지상태는 분기별, 시설 및 설비 개선의 필요성은 연 2회 위원회에 보고하여야 한다. 또한 제8조(간사)③항에 따라 간사는 위원회의 심의결과를 회의록으로 작성하고 위원장의 결재를 받아 원장에게 보고하여야 한다.

② 확인된 문제

최근 3년간(2019. 1. 1.~2021.12.31.) 시설환경관리위원회 개최 및 운영 현황을 살펴본 결과, ① 신규사업 진행 상태, 운용 및 유지 상태, 개선 필요성에 대한 사항을 위원회에 미보고 ② [표 1]과 같이 개최된 위원회에 대한 회의록 미작성 및 원장에게 미보고 한 사실이 확인되었다.

[표 1] 시설환경관리위원회 보고 누락 현황

연도	상정 건명	회의록 유무	위원장 결재 여부	원장 보고 여부
2019	공용원외탕전실 관급공사 외 7건	무	결재	실장 전결
2020	D동 3층 이비인후과 의사실 및 당직실 이전설치작업 외 7건	무	결재	위원장 전결
2021	R동 77~711병동 코로나환자 입실을 위한 음압격리병동 전환 공사 외 11건	무	결재	위원장 전결

※ 모든 상정 안건에 대한 사항은 위원회 서면 개최로 진행하여 회의록은 서면 결의안으로 대체함

또한 [표 2]와 같이 규정 개정이 필요한 사항도 확인되었다.

[표 2] 개정이 필요한 규정 현황

순번	현행	정비 및 개정 내용
1	제3조(구성) ① 위원회는 위원장을 포함하여 12인 이내의 위원으로 구성하되 위원장은 기획조정실장이 되고, 위원은 진료처장, 사무국장, 간호부장, <u>홍보대외협력실장</u> , <u>외상센터건립추진본부사업기획팀장</u> , 시설관리팀장과 5인이내 겸직교원 또는 임상교수요원으로 구성한다.	‘홍보대외협력실장’ 현행 명칭 변경하여 운영함에 따라 명칭 개정 필요 ‘외상센터건립추진본부사업기획팀’ 부서 폐지에 따라 명칭 삭제 필요
2	제8조(간사) ① 위원회에 간사 1인을 두되 간사는 외상센터건립추진본부 시설담당이 된다.	‘외상센터건립추진본부사업기획팀’ 부서 폐지에 따라 담당자 변경 필요

□ 에너지절약추진위원회 규정 미준수

① 관련 규정

에너지절약추진위원회규정 제6조(간사)제③항에 따라 간사는 위원회의 심의결과를 회의록으로 작성하고 위원장의 결재를 받아 원장에게 보고하여야 한다.

② 확인된 문제

최근 3년간(2019. 1. 1.~2021.12.31.) 에너지절약추진위원회 운영 현황을 살펴본 결과, [표 3]과 같이 모든 개최 건 회의결과에 대한 위원장 결재 누락 및 원장 미보고 사실이 확인되었다.

[표 3] 에너지절약추진위원회 보고 누락 현황

순번	개최 일자	회의록 유무	위원장 결재 여부	원장 보고 여부
1	2019. 5. 8.	유	누락	미보고
2	2019. 9. 4.	유	누락	미보고
3	2020. 5. 6.	유	누락	미보고
4	2020.10. 7.	유	누락	미보고
5	2021. 5.12.	유	누락	미보고
6	2021.10. 6.	유	누락	미보고

3. 관계부서 등 의견 및 검토결과

시설관리팀에서는 공공기관으로서의 건축물 등 건축의 공공적 가치를 구현할 수 있도록 공공건축 조성사업 위원회를 설치 및 규정을 제정하여 관련 절차를 철저히 준수하겠다고 하였고, 또한 능률적인 업무 수행을 위하여 관련 위원회의 규정을 현실에 맞게 정비 및 개정하고 운영 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

시설관리팀에서 주관하는 시설사업 및 제반 사항에 대하여 능률적인 업무 수행을 위해 병원 규정을 철저히 준수하여 관련 위원회의 기능이 원활하게 이루어지도록 만전을 기해주시기 바랍니다.(권고)
