

추진배경

- ■■■■시 ㉠㉠천배수분구 도시침수예방사업 추진 중 ===초 일원 관로 (PC-BOX) 부설구간 지장물 간섭으로 공사 지연 문제 발생
- 송전선(지중154kV 초고압), 상수관(D800), 열배관(D200@2), 가스관(D300) 등

문제점


- 지장물 이설 불가로 인한 대체 노선 필요
 - 상수관(D800), 열배관(D200@2), 가스관(D300) 등은 설계된 PC-BOX 규격 (3.0×1.5 외)으로 시공 시 최소 토피, 이격거리 등의 문제로 이설 불가하여 대체노선 필요
- 지장물 이설로 인한 공사기간 연장 및 사업비 증가
 - 송전선(지중154kV 초고압) 이설 시 공사기간(=개월) 및 공사비(=억원) 증액으로 사업수행 차질
 - 준공지연에 따른 민원(침수 우려지역) 발생 및 사업비 증가(공기연장에 따른 간접비 발생 등)

문제해소를 위한 상수관 등 이설 방안 및 송전선로 미이설 방안 마련 필요

주요내용

- 상수관(D800), 열배관(D200@2), 가스관(D300) 지장물 이설 방안 마련
 - (관계기관 협의) 설계사 및 펌프업체 등과 이격거리 및 최소토피 확보하기 위해 PC-BOX 규격 변경(높이 줄임, 폭 늘림, 관로 단차 등) 협의

- **(검토결과)** PC-BOX 등 규격 변경(높이 0.5m 줄임)시 상수관 및 열배관 등이 이설 가능하고, 변경 시공 시에도 침수예방 사업의 효율을 유지할 수 있어 대체노선 변경 없이 시공 가능

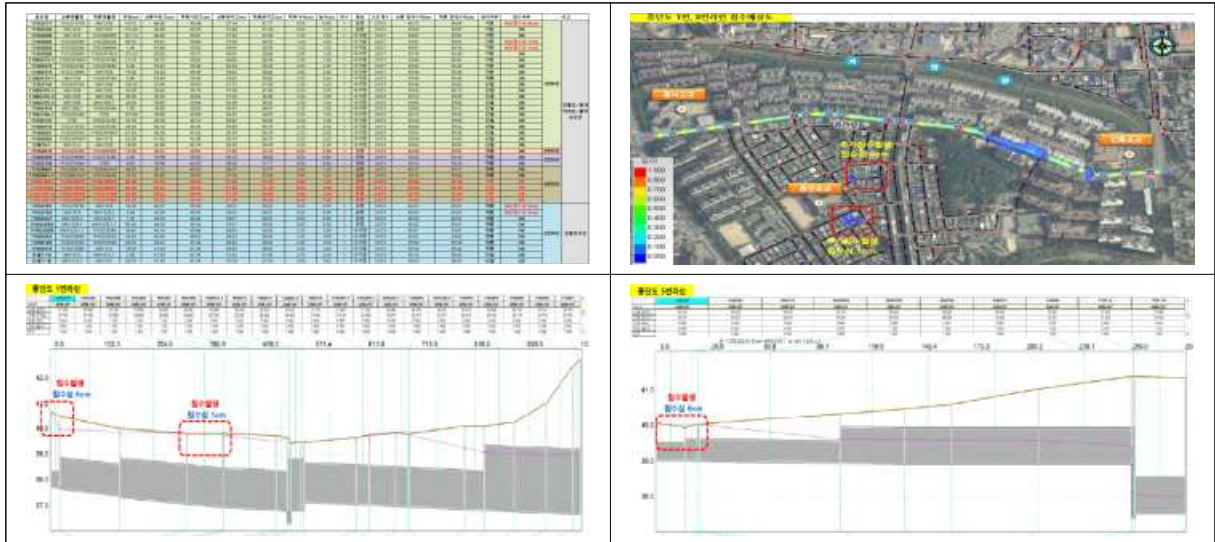

□ R공기업과 협의하여 송전선로 이설 없이 최적 시공방안 마련

- **(R공기업 요구사항)** 관련 기준 따라 관로(PC-BOX)와 송전선로를 1.0m 이상 이격 시공 요구
 - 인근시설에 감전 사고, 화재위험 및 아크방전으로 인한 피해를 예방하고자 송전선로와 관로(PC-BOX) 이격 시공 필요
- **(최적 시공방안 마련)** 송전선로와 관로(PC-BOX) 사이에 방호철판으로 보강할 경우 인근시설 피해 예방이 가능하여 R공기업과 지속적인 협의를 통해 송전선로 이설 없이 시공하는 방안으로 R공기업과 합의



주요성과

- 상수관(D800), 열배관(D200@2), 가스관(D300) 지장물 이설 방안을 마련함으로써 대체 노선 불필요로 최적 시공방안 마련
- 송전선로 이설 없이 최적 시공 방안 마련으로 사업비 절감
 - (최적 시공 방안 마련) 미이설로 인한 이설기간 ==개월 불필요
 - (사업비 절감) 이설로 인한 소요비용 ==억 및 공기연장 미발생으로 간접비 절감

조치사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 충청권환경본부 ◆◆◆◆◆◆처 ■■■■■부
㉠㉠㉠급 □□□에게 '이사장 표창' 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】
