

경고 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 처리 부적정

관 련 부 서 충남본부

관 련 자 4급 ○○○(現 △△△△△△처), 5급 ◇◇◇(現 ▽▽▽▽본부)

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」에서 정한 업무 위탁 조항에 따라 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며 충남본부 관련자(4급 강성일(現 수소안전정책처), 5급 김승곤(現 경기광역본부))는 검사2부에서 LPG특정사용시설 완성검사 업무를 수행하였으며, 아래 [표 1]과 같이 공동저장시설 완성검사를 실시하였다.

[표 1] 충남본부 관련자 LPG특정사용시설 완성검사 처리 현황

시설명	검사일자	저장능력	검사원 (관련자)	검사결과
△△△ 등 공동저장업소 32개	2023.03.29. ~ 2025.06.25.	500kg/용기집합	4급 ○○○, 5급 ◇◇◇	적합

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 LPG특정사용시설 완성검사 서류 참조

2. 자격 미달 가스시설 시공자 후속조치 미실시

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설에 대한 완성검사(안전성 확인 포함) 시 시설별 징구서류 목록은 「LPG시설 검사업무처리지침(2201-1)(이하 “지침”이라 한다)」 제3-8조에서 제시

하고 있으며, 청구서류 목록 중 “시공현황” 서식을 살펴보면 당해 시설을 시공한 “시공자 및 건설기술자 현황”을 기재토록 되어 있다.

추가로 검사원은 지침 제8-9조에 따라 완성검사 또는 안전성 확인 시 시공자 및 시공관리자의 자격이 「건설산업기본법」에서 정한 적합한 시공자인지 여부를 확인하여야 하며, 시공자자격이 없는 자인 것으로 확인된 경우 즉시 검사를 중단하고 (검사 ‘부적합’ 처리) 시공자 부적정 사항을 기재하여 관할 행정관청에 통보하여야 한다.

이에 따라 지침에서는 시공자 적정여부 확인 방법과 시공자의 자격에 따른 업무(공사) 범위를 알아보기 쉽도록 「LPG시설 검사업무처리지침(2201-1)」 별표 6에 명시하고 있다.

LPG시설 검사업무 처리지침 별표 6

[별표 6]

시공자 및 건설기술자 확인방법

1. 관계법령 내용

가. 시공자의 자격에 따른 업무(공사)범위

[건설산업기본법(이하 “건설법”이라 한다) 시행령 제7조 관련 별표 1]

구 분	건설업종	업무(공사) 범위
가스·난방공사업	가스시설공사 (제1종)	- 액화석유가스의 충전·집단공급·저장소시설의 설치·변경 공사 액화석유가스사용시설 중 저장능력 500kg 이상 시설의 설치·변경공사
	가스시설공사 (제2종)	- 액화석유가스사용시설 중 저장능력 500kg 미만 시설의 설치·변경공사 - 액화석유가스판매시설의 설치·변경공사 - 배관에 고정설치되는 가스용품의 설치공사 및 그 부대공사
	가스시설공사 (제3종)	액화석유가스사용시설 중 온수보일러·온수기 및 그 부대시설의 설치·변경공사로서 공사예정 금액이 1천만원 미만인 공사

비고 상단의 시공자는 하단 시공자의 업무범위에 속하는 공사 가능

2. 검사원이 확인해야 할 사항

가. 시공자 및 건설기술자의 적합여부 확인

(1) 시공자의 적합여부

가) <생략>

나) 시공자 등록의 확인은 홈페이지(사이버지사)의 "시공업체 모니터링(건설업행정정보 시스템(<http://www.kiscon.net>))"에서 시공자의 건설업 등록 및 건설업등록사항의 주기적 신고 등 확인하고 검사표의 검사원 의견란에 “시공자 적정여부 온라인으로 확인” 로 기록 <이하생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충남본부 관련자(4급 강성일(現 수소안전정책처), 5급 김승곤(現 경기광역본부))는 저장능력 500kg 이상 LPG특정사용시설 완성검사를 실시하면서 「건설산업기본법」에서 정하는 바와 같이 시공 자격이 없는 자(가스시설시공업 제2종 면허소지자)가 시공한 사실에 대해 충분히 인지할 수 있었음에도 아래 [표 2]와 같이 지침에서 정한 조치를 하지 않고 해당 완성검사를 ‘적합’ 처리하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사(연돈볼카츠 등 32개업소) 부적정 처리 현황

시설명	검사일자	저장능력	검사원 (관련자)	시공자/보유업종
◇◇◇◇ 등 공동저장업소 31개	2023.03.29. 등	500kg/용기집합	4급 ◎◎◎ 5급 ◇◇◇	• (시공자) ♡♡♡♡♡ - (보유업종) 가스시설공사(제2종)
□□□□	2025.06.25	500kg/용기집합	5급 ◇◇◇	• (시공자) ◆◆◆◆◆ - (보유업종) 가스시설공사(제2종)

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 LPG특정사용시설 완성검사 서류 참조

3. 저장능력 500kg 이상 시설 과압방지장치 미설치

가. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 별표20 제1호 가목 6) 사고 예방설비기준 가) 및 KGS FU431 2.8.1에 따라 저장능력이 250kg 이상(자동절체기

를 사용하여 용기를 집합한 경우에는 저장능력 500kg 이상)인 저장설비, 가스설비 및 배관에는 그 가스설비 등의 압력이 허용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 허용압력 이하로 되돌릴 수 있게하기 위하여 과압안전장치를 설치하여야 한다.

KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)

2.8.1.1 과압안전장치 선정

과압안전장치를 설치하는 가스설비 등에서의 압력상승 특성에 따라 다음과 같이 압력제어장치를 선정한다.

- (1) 기체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 스프링식 안전밸브 또는 압력제어장치(가스설비 등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 가스설비 등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 가스설비 등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)

<이하생략>

2.8.1.8 과압안전장치 방출관 설치

과압안전장치 중 안전밸브에는 다음 기준에 따라 가스방출관을 설치한다.

- 2.8.1.8.1 가스방출관의 방출구는 화기가 없는 위치로서 지면으로부터 2.5m 이상 또는 안전밸브 상부에서 1m의 높이 중 높은 위치에 설치한다.

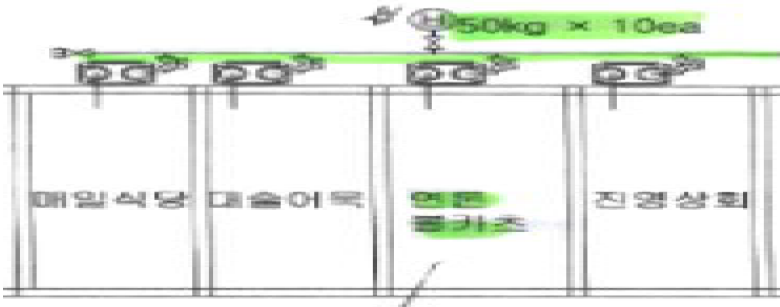
- 2.8.1.8.3 가스방출관 등은 빗물이 유입되지 않도록 캡을 설치하고, 그 캡은 방출가스의 흐름을 방해하지 않도록 설치하며, 가스방출관 하부에는 드레인밸브를 설치한다. 다만, 안전밸브에 드레인 기능이 내장되어 있는 경우에는 드레인밸브를 설치하지 않을 수 있다.

<이하생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충남본부 관련자(4급 ◎◎◎(現 △△△△△△처), 5급 ◇◇◇(現 ▽▽▽▽본부))는 위 [표 2]와 같이 LPG특정사용시설 완성검사(저장설비: 자동절체기를 사용한 용기집합설비 500kg)를 진행하면서 과압방지장치(안전밸브 및 방출관)가 설치되지 않았음에도 이를 아래 [표 3]과 같이 ‘적합’ 처리하는 등 상세기준에 따르지 않고 완성검사 업무를 부적정하게 처리하여 시정 조치가 필요하다.

[표 3] LPG특정사용시설 완성검사(연돈볼카츠 등 32개업소) 부적정 처리 현황

연번	시설명 [접수번호]	검사일자	검사원 (관련자)	검사 구분	부적정 내용
1	◆◆◆◆ 등 32개소 (2023-0413030)	2024.3.29.	4급 ○○○○ 5급 ◇◇◇◇	완성 (최초)	• 용기집합설비(50kg*10개) 과압방지장치 (안전밸브 및 방출관) 미설치
완성검사 시 제출도면					
					

※ 자료출처 : 충남본부에서 감사기간 완성검사 서류 확인 결과 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충남본부장은

① 위 [표 2] 및 [표 3]과 관련, LPG특정사용시설(공동저장시설) 완성검사 시 가스 시설 시공자의 자격 조건이 충족되지 않음에도 확인하지 않고, 또한 과압방지장치(안전밸브 및 방출관)가 설치되지 않았음에도 최종 ‘적합’ 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 충남본부 4급 ○○○○(現 △△△△△△처)

5급 ◇◇◇◇(現 ▽▽▽▽본부)

② 위 [표 3]의 시설에 과압방지장치(안전밸브 및 방출관)를 설치하는 등 조치를 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
