

한국전력공사 상임감사위원

통보 (우수사례)

제 목 : [3] 적극적인 업무태도를 통한 송전선로 피뢰기 갱신편 교체
관 계 부 서 : 대구본부 경산전력지사 송전팀
모 범 직 원 : 대구본부 경산전력지사 송전팀 대리 ☒☒☒
내 용

위 직원은 2022년 1월부터 현재까지 대구본부 경산전력지사 송전팀에서 근무하며, 가공송전설비 운영 및 관리 업무를 담당하며 안정적 전력공급 및 설비 안전성 확보에 최선을 다하고 있다. 2023년 1월부터 현재까지 경산전력지사 가공송전 순시 점검 위탁공사 업무를 담당하면서 철저한 계획 수립과 효율적인 시공관리로 관내 송전설비 무고장에 기여하는 한편, 송전선로용 피뢰기 갱신편 하자발생에 따른 본사의 하자조치 시행 방안에 따라 하자 조치를 적기 시행함으로써 전력공급 신뢰도 향상에 크게 기여하였다.

1. 현황 및 배경

피뢰기 갱신편 하자발생에 따른 품질 확보 및 대책 수립을 위한 본사 방안 ‘송운(송전)-1131(2021.10.28.) 「송전용 피뢰기 갱신편 하자조치 시행방안 알림」’에 따라 관내 송전선로의 대상 피뢰기 부속품 갱신편 교체 계획을 신속히 수립하여 최우선으로 조치하였다.

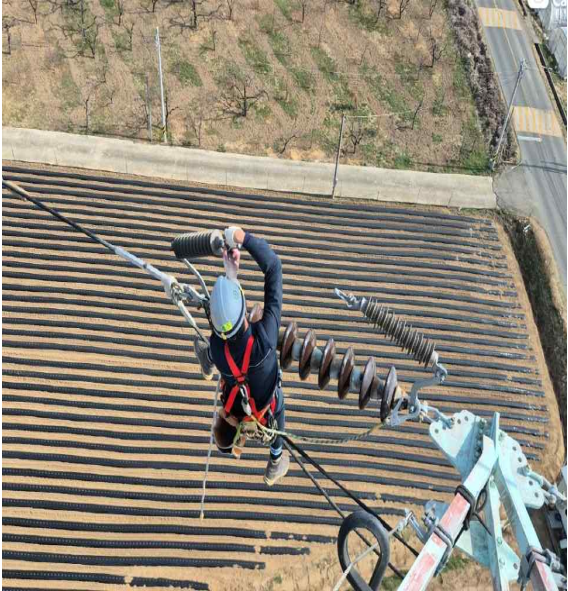
2. 추진활동

가공송전 순시점검 위탁공사의 정밀점검 예정 철탑에 대해 피뢰기 정밀점검 시 갭혼 교체작업을 병행하기로 함으로써 조치 완료까지 최대 6년이 소요될 것으로 예상하였으나, 「가공송전운영업무기준 IV.가공송전설비 위탁업무 1.위탁업무 관리」를 근거로 154kV ###-■T/L 등 2개 선로의 철탑 기별점검을 정밀점검으로의 공정 변경하는 등의 철저한 계획 수립과 효율적인 시공관리를 통해 2026년 3월 말 100% 교체율을 달성하였다.

3. 추진효과

154kV ###-♥♥ 등 3개T/L의 피뢰기 갭혼 교체를 적기에 완료하여 송전선로피뢰기 본체의 소손을 방지하고 이상 전압에 의한 급격한 노후화를 막고 갭혼의 탈락이나 파손으로 인한 2차적인 물리적 손상을 방지하는 등 전력계통망의 절연 신뢰성을 확고히 하여 안정적인 설비 운영 및 전력공급 신뢰도 향상에 기여하였다.

본사 갭혼 하자조치 시행방안 알림	가공송전 순시점검 위탁공사 공정 변경
익명화	익명화

피뢰기 갱흔 교체 시공(1)	피뢰기 갱흔 교체 시공(2)
익명화	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.
