

감사결과처분(요구)서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조△△원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 권고)

제 목 유해동물 차단시설 개선 필요

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 환경부 『생태통로 설치 및 관리지침』에 따르면, 포유류 울타리의 경우 울타리의 높이는 1.2~1.5m를 기본으로 하며, 지형에 따라 동물이 뛰어넘기 용이한 구간은 가급적 1.5m 높이로 하고, 종의 특성에 따라 더 높게 할 수 있음
- 동물이 땅을 파고 침입하는 것을 막기 위해 울타리 아래를 반드시 지표면에 밀착시켜야 하며, 표토의 침식이 우려되는 구간은 땅 속에 10cm 이상 묻히도록 설치하고,
- 울타리의 기둥은 야생동물의 충돌이나 켜과 같은 덩굴성 식물의 무게를 견딜 수 있도록, 지표면의 특성에 따라 콘크리트 기초를 하거나 기둥을 1m 이상의 깊이로 묻히도록 설치함

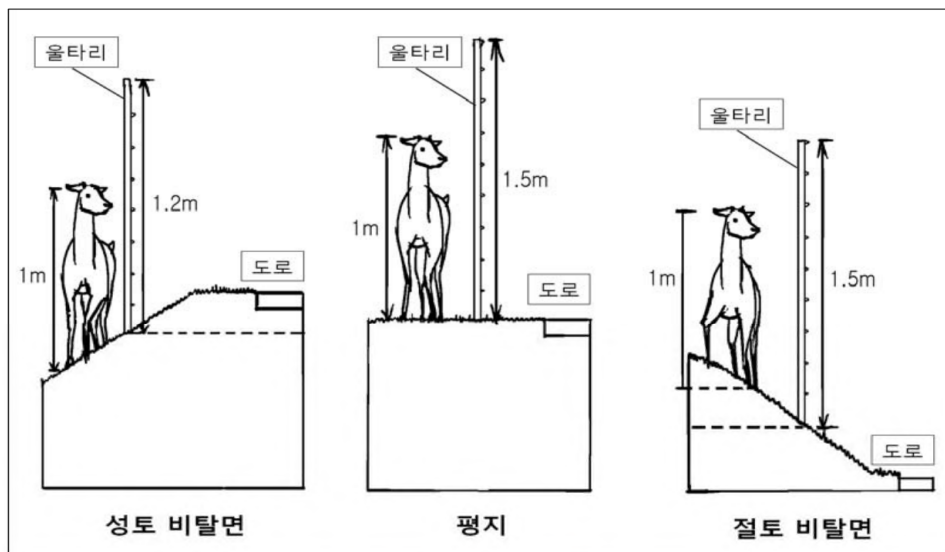


그림 3-5. 지형에 따른 울타리 높이

※ 동물이 뛰어넘기 용이한 구간은 가급적 1.5m 높이로 설치

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△는 고라니, 멧돼지 등 유해동물로 인한 사찰 및 문화자원의 피해를 예방하기 위하여 사찰의 요청으로 현장확인 및 웬스공중(높이, 길이 등) 협의 후 사찰 주변지역에 문화유산지구 유해동물 차단시설(매쉬웬스, 목재난간 등)을 설치하는 사업을 시행하였음

※ 2021년도 유해동물 차단시설 설치공사 현황

공사명	공사위치	공사기간	계약금액	계약업체	사업내용
△△△△△△△ 문화유산지구 유해동물 차단시설 설치공사	△△△△ △△△ △△△ △△△ 49 일원	2021.10. ~ 2021.11.	**,**천원	****건설(주)	유해동물 차단 웬스 설치 노후 목재난간 교체 등

- 포유류 울타리의 경우 울타리의 높이는 1.2~1.5m를 기본으로, 동물이 뛰어넘기 용이한 구간은 가급적 1.5m 이상의 높이로 하는 것이 타당함*에도, 유해동물이 뛰어 넘기 용이한 비탈면 구간**도 차단시설 높이를 1.2m로 설치하여 유해동물의 침입 방지가 어려울 것으로 우려됨에 따라 일부 구간의 경우 차단시설 개선이 필요할 것으로 판단됨

* 동물 침입방지를 위한 울타리의 경우 별도의 설치 지침 또는 매뉴얼이 부재한 실정으로, 환경부의 『생태통로 설치 및 관리지침』의 유도울타리 기준을 준용함

** 유해동물 차단시설(매쉬웬스) 설치 현황



유해동물 차단시설 설치 현황(해인사 약수암 인근)

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 토지소유주와의 협의를 통한 유해동물 차단시설(울타리) 높이 조정 등 침입방지 시설 개선 방안 마련
