


한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [12] 강관압입전력구의 도달구 오탁수처리시설 재검토 필요
관 계 부 서 : 전 건설본부
조 치 부 서 : 전 건설본부
내 용

1. 업무 개요

남부건설본부 등 전 건설본부는 강관압입식 전력구 적용 시 단거리 구간에 [그림 1]과 같이 오탁수 처리시설¹⁾을 발진구 1개소, 도달구 1개소씩 각각 설치하고 있다.

[그림 1] 오탁수 처리시설 설치 현황(발진구1개소, 도달구1개소)

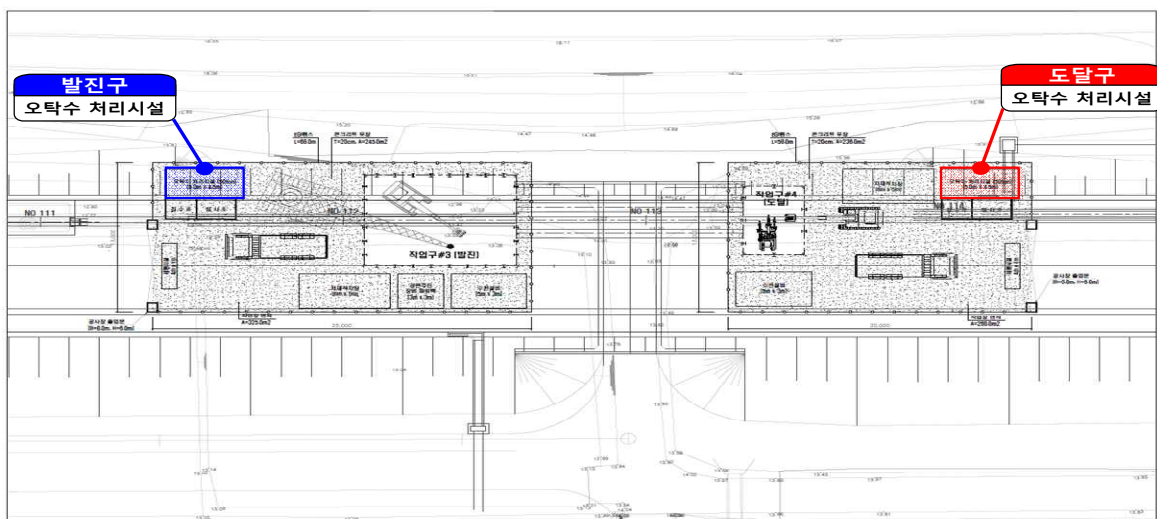

1) 오탁수 처리시설 : 공사 중 발생하는 탁한 물(오탁수) 속의 토사, 부유물질 등을 제거하여 환경기준 이하로 처리하는 설비

2. 관계 규정 및 판단기준


「전력구 설계·시공 편람」(송변전건설단, 2025. 1월)에 따르면, 도달 수직구 오락수 처리설비는 설계 시 최소 규모 반영 후 현장 여건에 따라 삭제 및 실적 정산토록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

남부건설본부에서 시행 중인 OO 전력구공사는 강관압입 도달수직구의 오락수 처리시설을 발진수직구와 배관 연결하여 미설치한 사례가 있었고, 이와 관련하여 타 건설본부 현황을 확인해보니 단거리 구간임에도 별도의 검토 과정없이 오락수 처리시설을 1개소씩 일괄 설치하는 것이 확인되었다.

하지만 발진수직구와 도달수직구가 인접한 단거리 구간(100m 이내)은 수직구 구간 배관으로 연결이 가능할 경우, 도달 수직구의 오락수 처리시설 1개소를 삭제 가능하므로 별도의 검토 과정 없이 일괄 반영하는 것은 개선이 필요하다.

[그림 2] 오락수 처리시설 개선 사례(발진구1개소)

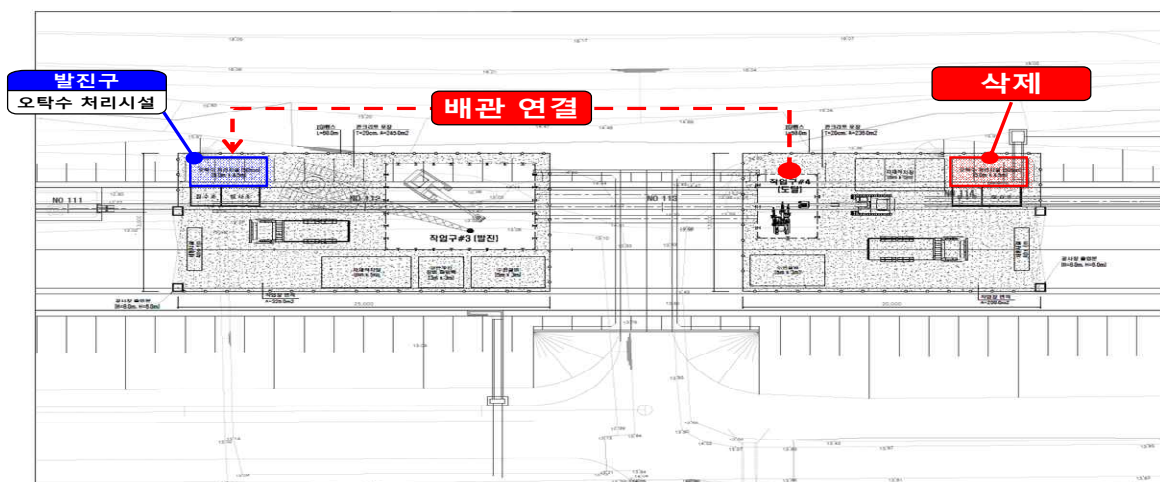

관계부서 의견

전 건설본부 구조건설실 설계·시공 담당자는 단거리구간 강관압입 전력구의 도달구 오탁수 처리시설 재검토 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

다만 설계 시에는 배관연결 가능 여부, 도로점용 등 대관인허가 상세 협의에 어려움 등이 있어 오탁수 처리시설을 반영하고, 시공 단계에서 배관연결이 가능할 경우 오탁수 처리시설을 제외하는 방안을 제시하였다.

조치할 사항

전 건설본부장은 단거리 강관압입 전력구에 반영된 도달 수직구 오탁수 처리설비에 대해 현장 여건 등을 반영하여 재검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선 1	예산절감 [474,000,000원]	-	전 건설본부	전 건설본부

※ 개선에 따른 절감액

- 79백만 원(00 전력구) × 6개소(연장 50m 이하) * = 474백만 원

* 건설본부 설계 및 시공 리스트 중 설계 진행 중 강관압입사업(송변전건설단, '25. 5월)
