

[9] [개선, 통보, 시정(감액)9] 사항

1. 제 목 : 어린이 보호구역 적색 포장 계획 부적정

2. 조치부서 : ■■■■단(개선, 통보)

■■■■■■■■본부, ⊖⊖⊖⊖본부, ▣▣▣▣본부, ⊕⊕⊕⊕⊕⊕본부, ⊗⊗
⊗⊗⊗⊗본부, ■■■■■■본부, □□□□□□□□본부, ㊦㊦㊦㊦본부,
♠♠♠♠본부(시정(감액))

3. 관 련 자 :

4. 내 용 :

公社는 개발사업 시행 시 이용자의 교통 안전 등을 위해 어린이 보호구역을 지정하고 각종 안전시설의 설치계획을 수립한 후 공사계획에 반영하여 설치하고 있다.

가. 교통영향평가 시 어린이 보호구역 적색 포장 적용 불합리

「도시교통정비 촉진법」 제15조 및 같은 법 시행령 제13조의2에 따라 일정규모 이상의 개발사업에 대해 교통영향평가서를 제출·심의하도록 규정하고 있다.

[표 33] 교통영향평가 대상사업 규모 및 평가서 제출시기

구분	대상 규모	교통영향평가 제출(심의)시기	비고
공공주택	부지면적 10만㎡ 이상	지구계획의 승인 전	
택지개발, 행정중심복합도시, 혁신도시, 도시개발	부지면적 10만㎡ 이상	실시계획의 승인(인가) 전	
산업단지	부지면적 20만㎡ 이상	실시계획의 승인 전	
물류단지	부지면적 5만㎡ 이상	실시계획의 승인 전	


자료 : 「도시교통정비 촉진법 시행령」 [별표 1] 재구성

과거 「어린이보호구역 개선사업 업무편람(경찰청, 2004)」등에 따라 어린이 보호구역 사업을 시행한 결과 시인성 확보를 위해 설치하는 적색 포장의 설치 기준이 없어 어린이 보호구역마다 설치 위치나 구간 등이 서로 다르고, 과다 설치로 인한 설치 비용 및 유지·보수비용 증가, 융착식 도료를 이용한 노면 표시 설치 불가 등의 문제점이 발생하였다.

이에 따라 행정안전부에서는 2011. 11월 「어린이·노인·장애인 보호구역 통합지침」(이하 ‘지침’이라 한다)을 제정하여 주요 횡단보도 전방 등 미끄럼방지 기능이 필요한 구간에만 제한적으로 적색 미끄럼 방지 포장을 설치하고, 운전자의 시인성은 교통안전표지 등 대체시설로 확보하도록 규정하였다.

이와 관련하여 2015. 9월 단지기술회에서는 관련 내용을 반영하여 「설계지침(토목)」을 개정하였으며, 2016. 8월 국민안전처에서는 [그림 2]와 같이 「어린이 보호구역 정비 표준모델」을 마련하여 제시하였다.

[그림 2] 어린이 보호구역 정비 표준모델(간선도로 C타입)

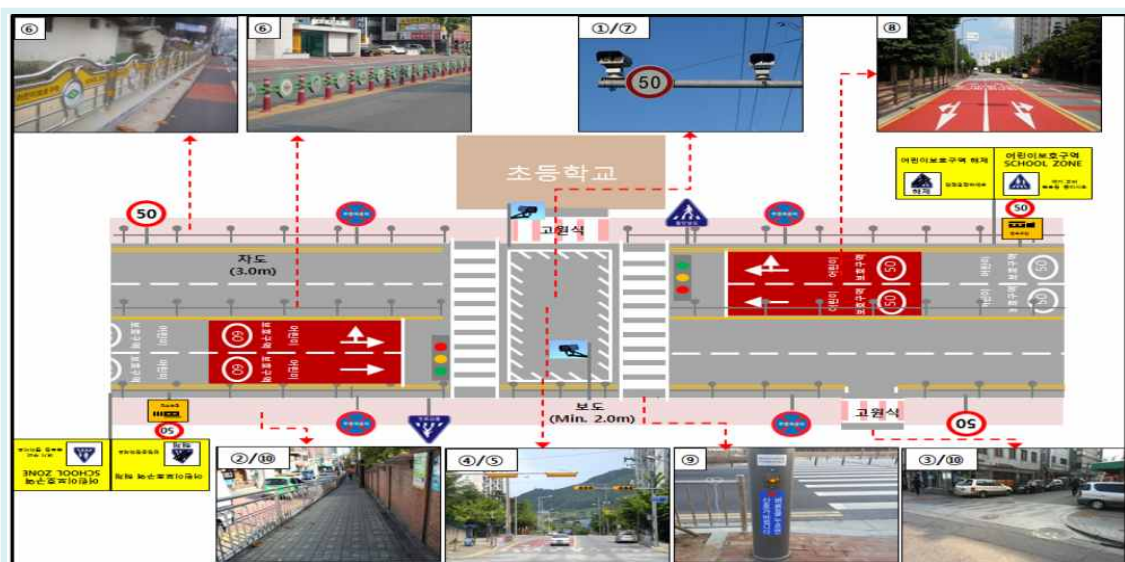

자료 : 「어린이보호구역 정비 표준모델(국민안전처)」 자료 재구성

따라서 교통영향평가 시 어린이 보호구역에 적용하는 포장은 위 지침에 따라 일반 포장으로 반영하고, 주요 횡단보도 등 미끄럼방지기능이 필요한 지점에만 제한적으로 적색 미끄럼방지 포장을 적용하는 것이 타당하다.

그런데 최근 2년 동안 교통영향평가 협의가 완료되었거나 진행 중인 사업지구에 대해 어린이 보호구역 적색 포장 적용 현황을 조사한 결과 [표 34]와 같이 어린이 보호구역 전 구간에 적색 포장을 계획하는 등 지침과 다르게 적용하고 있는 것으로 나타났다.

[표 34] 어린이 보호구역 적색 포장 현황(교통영향평가)

구 분	협의 완료일	어린이 보호구역 적색 포장				비고
		적용 여부	연장(m)	폭원(m)	면적(㎡)	
공주00	2014.11. 6.	적용	546.5	8.00 ~ 9.50	504	
아산00	2015. 5. 1.	적용	3,050.0	9.50 ~ 15.50	5,125	
창원00	2015. 6.23.	적용	279.0	7.00 ~ 9.00	474	
경산00	2015.10.20.	적용	393.0	12.50 ~ 15.00	482	
부산00	2015.12. 7.	적용	304.2	7.00 ~ 13.50	270	
원주002	2016. 2.17.	적용	63.0	11.00	244	
계룡00	2016. 4.27.	적용	340.0	12.50 ~ 15.50	605	
고양00	2016. 7. 7.	적용	850.0	6.00 ~ 9.00	646	
양산00	협의 중	적용	986.0	3.50 ~ 13.50	2,766	
울산002	협의 중	적용	680.0	6.25 ~ 12.50	1,859	
칠곡00	협의 중	적용	297.0	3.25 ~ 9.50	793	
합 계			7,788.7		13,768	

자료 : ●●●●단 제출자료 재구성

이와 같이 교통영향평가 수립 시 어린이 보호구역 시인성 확보를 위해 적색 포장을 전면 적용할 경우 공사비 증가 등으로 불필요한 예산이 낭비될 우려가 있다.

나. 설계 시 어린이 보호구역 적색 포장 적용 불합리

감사일 현재 진행 중인 공사에 대해 어린이 보호구역 내 시공 예정인 적색 포장 현황을 조사한 결과 [표 35]와 같이 약 41,313㎡의 공사 물량이 남아 있는 것으로 나타났다.

[표 35] 어린이 보호구역 내 적색 포장 시공 예정 현황

구분	포장 면적(㎡)	공사 금액(천 원)	비고
공사현황	41,313	3,954,457	

자료 : ○○○○○처, ※※※※처, ≡≡≡≡처 제출자료 재구성

아직 시공되지 않은 어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 기준에 따라 일반 아스콘 포장으로 변경할 경우 [표 36]과 같이 약 1,777백만 원의 공사비를 절감할 수 있다.

[표 36] 포장 형식 변경(적색→일반)에 따른 공사비 비교

(단위: 천 원)

구분	면적	기정	변경	차이	비고
합 계	41,313㎡	3,954,457	2,177,427	감 1,777,030	
[서울] 구리00, 양주00	1,859㎡	497,927	276,587	감 221,340	
[인천] 파주003, 시흥00, 인천00	6,041㎡	779,189	372,026	감 407,163	
[경기] 군포00, 화성002, 고덕000, 오산002	2,347㎡	777,503	454,131	감 323,372	
[부산울산] 울산00	10,761㎡	360,452	106,834	감 253,618	
[강원] 춘천00	46㎡	12,980	8,886	감 4,094	
[충북] 충주00, 청주00	14,788㎡	564,047	359,838	감 204,209	
[대전충남] 과학00, 장항00, 아산00	4,704㎡	695,589	461,426	감 234,163	
[경남] 김해002	513㎡	174,263	97,537	감 76,726	
[세종] 000000도시	254㎡	92,507	40,162	감 52,345	

자료 : ○○○○○처, ※※※※처, ≡≡≡≡처 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

■■■■단장은

① 교통영향평가 시 어린이 보호구역 내 적색 포장 적용 기준 마련하시기
바라며(개선),

② 진행 중인 사업지구에 대해 관련 지침에 부합하도록 교통영향평가 변경 등
필요한 조치를 취하시기 바랍니다(통보).

■■■■본부장은

어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 지침에 맞게 설계 변경하고, 관련 공사비
221백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

⊖⊖⊖⊖본부장은

어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 지침에 맞게 설계 변경하고, 관련 공사비
407백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

▣▣▣▣본부장은

어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 지침에 맞게 설계 변경하고, 관련 공사비
323백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

㉸㉸㉸㉸㉸㉸본부장은

어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 지침에 맞게 설계 변경하고, 관련 공사비 254백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

㊸㊸㊸㊸㊸㊸본부장은

어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 지침에 맞게 설계 변경하고, 관련 공사비 4백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

■ ■ ■ ■ ■본부장은

어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 지침에 맞게 설계 변경하고, 관련 공사비 204백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

□ □ □ □ □본부장은

어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 지침에 맞게 설계 변경하고, 관련 공사비 234백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

㊦ ㊦ ㊦ ㊦본부장은

어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 지침에 맞게 설계 변경하고, 관련 공사비 77백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

♠♠♠♠본부장은

어린이 보호구역 내 적색 포장을 관련 지침에 맞게 설계 변경하고, 관련 공사비 52백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).
