


⑥ 고지대 전력공급시스템 개선 (2022)

1) 추진 개요

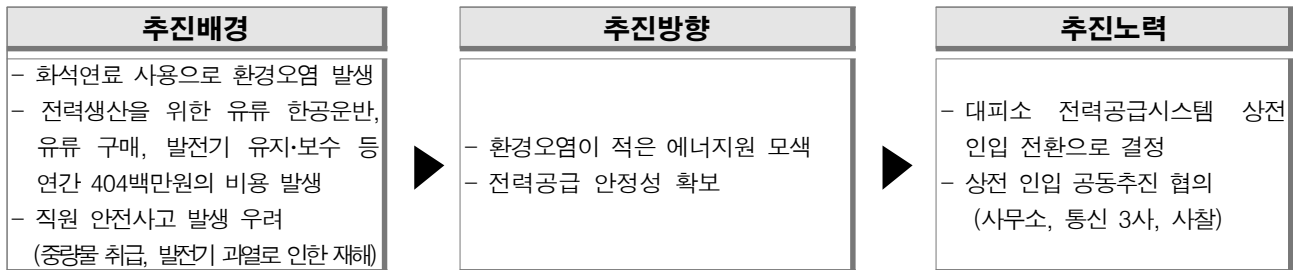

환경오염(탄소배출) 및 사고위험으로부터 청정하고 안전한 △△△△ 조성


2) 추진 내용

- 대피소 전력공급시스템을 상전 인입 전환으로 결정
 - 주 전력 공급을 상전으로 전환, 보조 전력은 태양광 발전(비상 시 발전기 운용)
- 상전 인입 공동추진 협의(사무소, 통신 3사, 사찰)
 - 발전기 고장 시 이동통신 3사 공용기지국 통신두절, 민원 발생
- 기 설치된 기지국 3개소(△△, △△, △△암)의 전력공급 시스템 개선 및 기지국(△△각, △△폭포) 신설(600kW, 총 연장 10.5km)

3) 추진 성과

- 사무소, 통신 3사(KT, SK, LG) 및 사찰(△△암) 등 민관 합동 사업 추진으로 공단 재정 건전성 기여
- 연간 화석연료 269,333L 절감, 탄소배출량 332TON(CO2) 감축
- 연간 약 3.75억 원의 예산절감(경유 발전: 400백만 원→ 상전 인입: 25백만 원)
- 음영구간(통신 불통) 이동통신기지국 전력공급 안정화로 난청지역 해소 및 재해용 긴급 비상통신망 확보(10개 구간, 약 5km 음영지역 해소)
- 발전기 운영, 중량물 취급 작업 감소로 안전사고 발생 확률 감소

4) 현황사진



△△△△소 수배전반

△△△△소 수배전반

△△△△△소 수배전반
