

현 지 조 치

제 목 특정전환시설의 검사처리 미흡 및 보일러 설치확인서 미징구

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 시행규칙 제20조의2 및 제23조에 따라 도시가스 특정가스사용시설⁹⁾에 대하여 기술검토 및 완성검사를 실시하고 있으며, ○○광역본부에서 감사대상 기간(2021.05.01.~2024.02.29.) 중 실시한 특정가스사용시설의 완성검사 건수는 [표 1]과 같다.

[표 1] 특정가스사용시설 완성검사 현황

(단위 : 건)

구 분	○○					충남								세 종	계
	대덕	동구	서구	유성	중구	계룡	공주	금산	논산	보령	부여	서천	청양		
건 수	188	185	506	619	218	86	76	26	88	100	15	35	22	448	2,612

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스 특정가스사용시설은 도법 제11조제4항 및 제15조제4항에 따라 공사로부터 기술검토를 받고, 같은 법 제15조 및 시행규칙 제22조에 따라 신청자로부터 신청·접수 받아 공사에서 완성검사를 실시하고 있다.

9) ① 월 사용예정량이 2천m³(제1종보호시설 안에 있는 경우 1천m³)이상인 가스사용시설

② 월 사용예정량이 2천m³(제1종보호시설 안에 있는 경우 1천m³)미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 하나에 해당하는 시설
가. 내관 및 그 부속시설이 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설
나. 많은 사람이 이용하는 시설로서 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설

특정가스사용시설의 시설기준 및 기술기준은 KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준, 이하 “FU551”이라 한다)에서 규정하고 있으며, 기술검토 및 검사원은 해당 규정을 준수하여 기술검토 및 완성검사를 진행하여야 한다.

특정가스사용시설에 해당되지 않는 비특정가스사용시설의 경우 추후 연소기 증설로 인하여 특정가스사용시설로 전환되는 경우, 이에 대한 검사처리는 「도시가스분야 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」 제4-28조 (검사대상 전환시설 검사)에 따라 실시하여야 한다.

동 지침에서는 가스사용량의 증가로 인하여 특정가스사용시설로 전환되는 시설은 기존시설을 포함한 전체시설에 대하여 기술검토를 실시하고, 완성검사 시 기존시설은 정기검사 기준에 따라 처리하고, 신설 부분은 완성검사 기준을 적용하여 처리하도록 규정하고 있다.

도시가스분야 검사업무 처리지침 일부 발췌
제4-28조(검사대상 전환시설 검사) ① <u>가스사용량의 증가로 인하여 특정가스사용시설로 전환되는 시설은 기존시설을 포함한 전체시설에 대하여 기술검토를 실시한다.</u>(도시가스사의 보관도면을 바탕으로 기술검토 도면에 기존시설과 신규시설을 구분하여 표시토록 할 것) ② 기술검토 서류에는 기존 시설에 대하여 별지 제43호 서식의 “가스사용 확인서”를 첨부토록 한다. ③ 제1항의 경우 <u>기존시설은 정기검사 기준을, 신설 부분은 완성검사 기준을 적용하여 완성검사를 실시</u>하되, 제2항에 따른 “가스사용 확인서”에서 도시가스사의 점검을 받아 기존에 사용하던 연소기라는 것이 확인된 연소기는 증명서 (또는 KS 표시)가 훼손되었어도 기준에 적합한 것으로 인정한다. ④ 기존시설에 대하여도 기밀시험 또는 누출검사를 실시하고, 가스누출자동차단장치를 설치토록 해야 한다.


검사원은 최종 완성검사 시 기존 비특정가스사용시설에 대하여 동 지침 및 FU551 4.2.2.2.1(정기검사)에 따라, 기존 시설 지하매설배관의 재질이 강관인지 확인하고 강관일 경우에는 전기방식시공 여부 확인과 전위를 측정하여야 한다.

또한, 특정가스사용시설 완성검사 시 검사원은 가스 배관 및 연소기 설치와 가스보일러를 설치하는 시공자가 각각 다른 경우 지침 별표 16(완성검사 시공 기록 징구서류)에 따라 가스보일러에 대한 보일러 설치·시공 및 보험가입 확인서를 징구받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역시에서 감사대상 기간 (2021. 05. 01. ~ 2024. 02. 29.) 중 실시한
특정가스사용시설 완성검사 처리에 관한 적정성을 확인한 결과,

비특정가스사용시설에서 특정가스사용시설로 전환되었음에도 기존 비특정가스 사용시설의 지하매설배관(강관)의 전위를 측정하지 않은 사례가 1건 확인되었으나, 감사기간 내에 해당 구간의 전위를 측정하여 조치를 완료하였다.

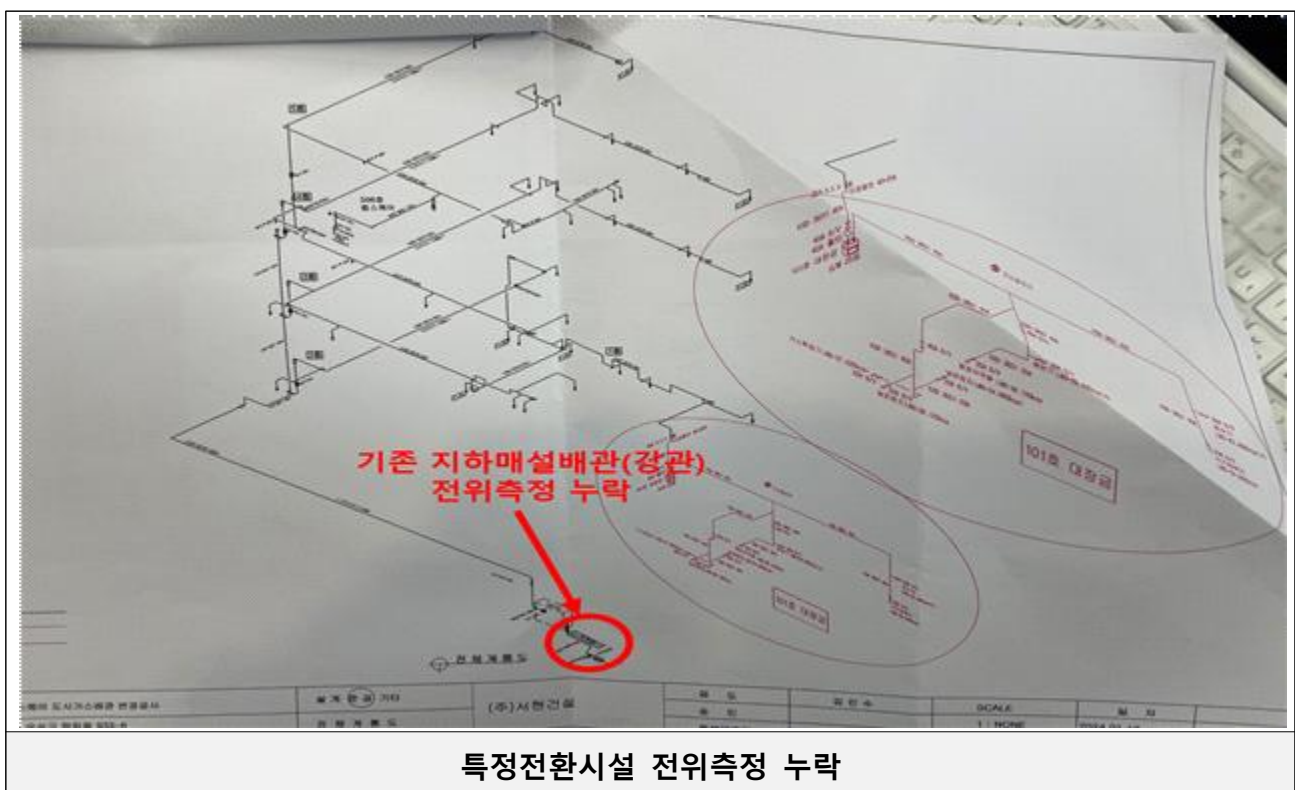

또한, 가스배관 및 연소기 설치 시공자와 가스보일러를 시공한 시공자가 각각 다름에도 불구하고 가스보일러 시공자에게 보일러 설치·시공 및 보험가입 확인서를 징구받지 않은 사례가 3건 확인되었으나, 감사기간 내에 보일러 설치·시공 및 보험가입 확인서를 모두 징구 완료하였다.

[표 2] 특정전환시설 검사처리 및 서류징구 미비 사항

연번	접수번호	구분	업소명	검사원	최종 완성검사	확인사항
1	2024-0076503	특정가스 전환시설	“A”	○○○	2024.01.10	기존시설 전위 측정 누락
2	2022-0315096	특정가스 사용시설	“B”	○○○	2022.03.29	보일러 설치·시공 및 보험가입 확인서 미징구
3	2023-1784737	특정가스 사용시설	“C”	○○○	2023.11.06	
4	2023-2111682	특정가스 사용시설	“D”	○○○	2024.01.11	

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

특정사용시설로 전환되는 시설에 대한 완성검사 시 기존 매설배관(PLP)에 대한 방식전위 측정 누락, 보일러 설치·시공 및 보험가입 확인서 미징구(배관·연소기 시공자와 가스보일러 시공자가 다른 경우) 등의 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)
