


감사결과 처분요구서

처분요구번호	2019 - 00	처분요구일자	2019. 07. 00
처 분 종 류	시정(감액)		
관 계 부 서	☼☼처(☹☹☹☹팀)		
제 목	CCCC계류장시설공사 설계변경 미조치		

지 적 내 용

☼☼처에서는 2018.6.21. ☉☉산업(주)의 1개사¹⁾와 4단계 CCCCC계류장시설공사(*-*공구)를 83,741,927,000원에 도급계약하고, 2021.5.22. 공사를 완료할 예정으로 공사를 시행하고 있다.

CCCC계류장 건설공사에 포함된 연약지반처리공사는 아래 [그림]과 같이 연약지반위에 수평배수축진을 위하여 토목섬유재인 PP Mat 및 샌드매트를 포설하고, 연직배수재인 PBD²⁾를 타설하여 연약지반의 압밀시간을 단축하도록 하고 있으며, 총 85,874공 1,350,047m를 시공하도록 계획되어 있다.

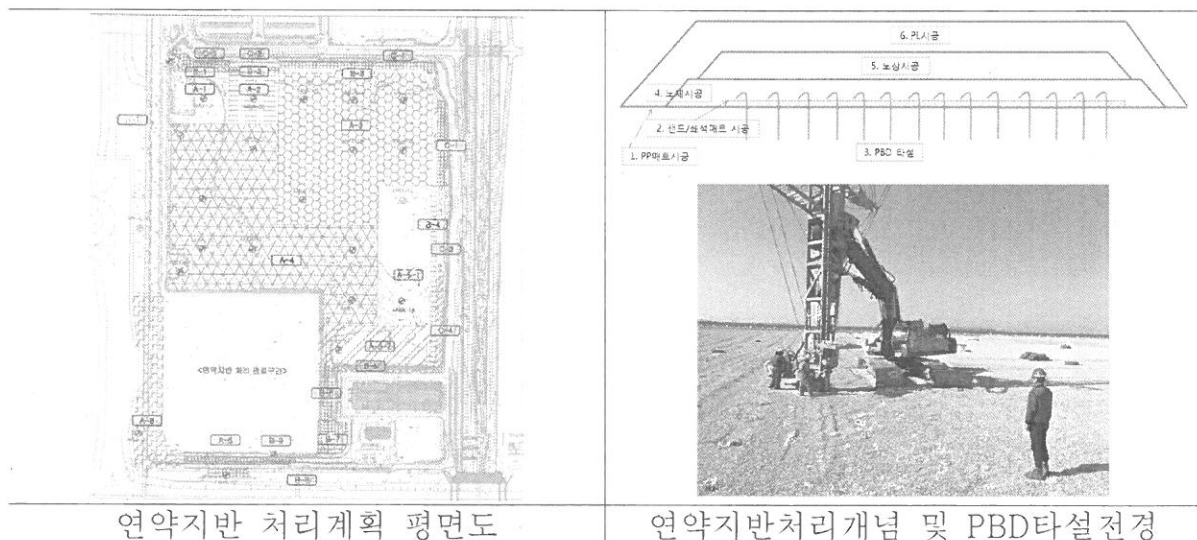

[그림] 연약지반 처리계획

1) 공동도급업체 (주) AAA
2) Plastic Board Drain

한편, 공사계약일반조건 제19조에 따르면 계약담당공무원은 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호모순되는 점이 있는 경우에는 설계 변경 할 수 있으며, 공사계약일반조건 제19조의 5에 따르면 계약담당공무원은 당해 공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정공종의 삭제, 공정계획의 변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 설계변경할 수 있도록 되어 있다.

그런데, 위 공사의 시공자는 공사착수후 연약지반처리를 위한 PBD설치공사 총 85,874공 1,350,047m중 79,988공 1,044,258m의 PBD 설치를 완료하고, 연약지반처리 해당 공종의 공사가 완료되었으므로, 앞으로도 추가 설치할 필요가 없는 PBD 잔여물량에 대해서는 실정보고 등을 통하여 설계변경하여 감액하여야 하는데도 감사일 현재까지 설계변경하여 감액하지 않고 있다.

그 결과, 설계변경하여 감액하지 않을 경우 공사비 201,334,572원이 부당하게 집행될 우려가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 설계변경 등을 통하여 감액하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(☞처장)은 CCCC계류장 시설공사 설치되지 않은 PBD 잔여물량은 설계변경 등을 통하여 공사비 201,334,572원을 감액조치하시기 바랍니다.
(시정(감액))

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략
