

우 수 업 무 사 례(3)

관련부서

☆☆☆☆처


관련자

5급 BBB

□ 제 목 : 구조대 구간 공사용 터널 위치 조정으로 안전 시공 도모

1. 개 요

- BenchⅢ 굴착을 위한 공사용 터널은 F2 구조대를 통과하는 지역에 위치하여 Plug 기밀성 및 공동 안정성 확보를 위해 압질이 양호한 구간으로 위치 변경하여 안전 시공을 도모함.

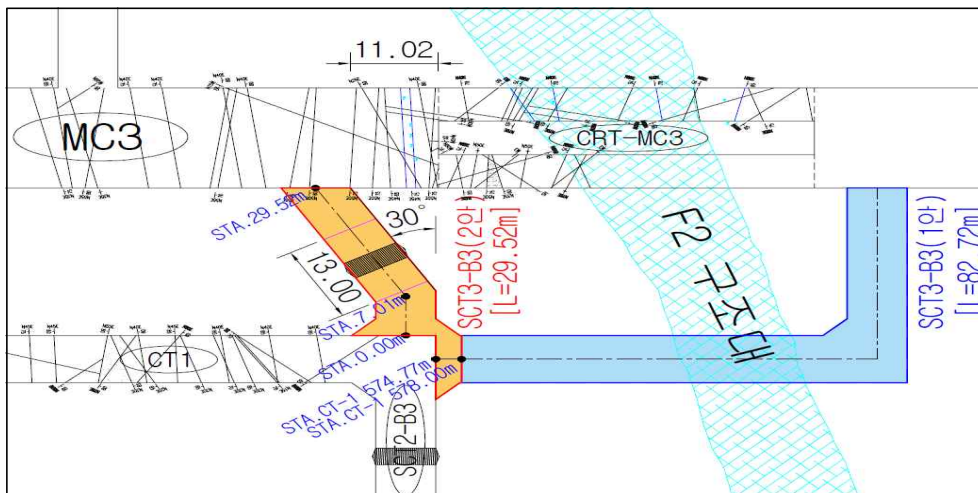

<MC3-BenchⅢ-SCT 위치 이동 상세도>

2. 주요 개선실적

- MC3-BenchⅢ-SCT 위치 이동 시 압질불량구간 통과 시 지연되는 공사기간을 사전 단축할 수 있고, 공사용 터널(CT-1) 굴착공사로 동반되는 굴착, 보강 등 공사비를 절감할 수 있어 MC3 굴착기간 단축, 공사용 터널의 충수 시 수밀성 및 공동 안정성을 확보할 수 있음.

- MC3 굴착 및 보강공사 수량 절감사항

공 종		규 격	단 위	당 초	변 경	증(△)감	비 고
토목	동굴공사	굴착공사	m ³	3,098	1,733	△1,365	
		버력처리	m ³	5,550	3,067	△2,483	
	보강공사	Rock Bolt	개	216	122	△94	
		Shotcrete	m ²	1,143	647	△496	
		Grouting	m	780	-	△780	
전기	가설	동력,조명,접지	식	1	1	-	

- MC3~4 굴착공기 단축사항(당초 12월말 종료 예정)

구 분	2019년 10월			2019년 11월		
	10	20	31	10	20	30
MC3-BenchⅢ						
가. Shaft 방향						
나. End 방향						
MC4-BenchⅢ						
가. Shaft 방향						
나. SCOT-2						

3. 기대효과

- 도급 공사비 181백만원(VAT 제외) 절감으로 경제적 시공 도모
- 공사용 터널의 충수 시 수밀성 및 공동 안정성을 확보

