


[32] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최상층세대 천정 단열재 설계변경 부적정
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

♡♡♡♡ S-1블록 아파트 건설공사 2공구(공공분양 700세대, 공공임대 138세대)에서는 2015. 8월 아파트 최상층 세대의 천정 슬래브 콘크리트 타설 시 [그림 5]와 같이 천정 밑면에 설치하여야 하는 두께 20mm 단열재를 에너지절약 설계기준 충족 등을 위해 변경도서를 수령 후 두께 50mm 단열재로 변경하였다.

[그림 5] ♡♡♡♡ S-1블록 최상층세대 천정 단열재 설치 도면

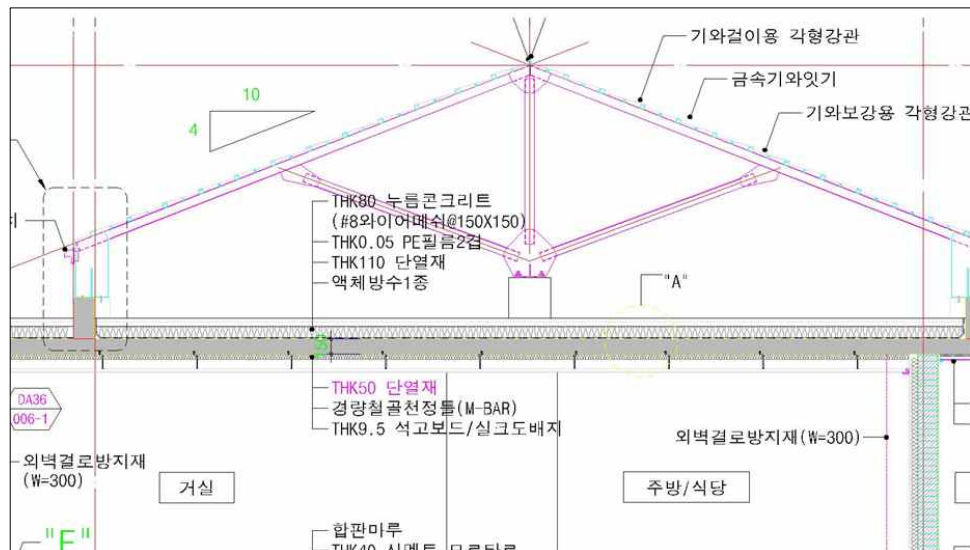

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

이와 같이 설계도서 등의 변경에 따라 설계변경이 발생하는 경우 당초 내역을 확인하여 설계변경에 따른 내역물량 증감처리 시 과부족이 발생하지 않도록 하여야 한다.

하지만 ♥♥♥♥ S-1블록 2공구에서는 위의 단열재 변경에 따른 설계변경을 시행하면서 목공사 내역의 최상층 경량철골 천정틀 항목 내에 기존 20mm 단열재가 [그림 6]과 같이 반영되어 있으므로 50mm 단열재 설계변경 방침수립 시 당초의 20mm 단열재를 감액 처리함이 타당한데도 해당 단열재가 단열공사 내역에서 당초부터 누락된 것으로 판단하고 [표 50]과 같이 50mm 단열재에 대한 증액 설계 변경만을 시행하였다.

[그림 6] ♥♥♥♥ S-1블록 최상층세대 천정 단열재 설치 내역

창원현동(05,국민3)S-1BL 창원현동S-1블록 2공구 아파트건설공사										출력일 : 2016-03-2	
CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	액	노무비
SAHJ2079	최상층경량철골천정틀	거실,H=180MM,석고보드9.5			M2						
MAJ50403	브라켓(경량철골천정틀) E형, 24X50X1.6T	개	2,6234	70.0	0.0	0.0	0.0	183.6	183.6	0.0	0.0
MAJ50404	PVC크림(경량철골천정틀) E형	개	2,6234	70.0	0.0	0.0	0.0	183.6	183.6	0.0	0.0
MAJ50405	크로스조인트(경량철골천정틀) E형,80X50X10X1.6T	개	2,148	70.0	0.0	0.0	0.0	150.3	150.3	0.0	0.0
MAJ50210	영골(경량철골천정틀용) 30X30X0.45T	m	0.8	340.0	0.0	0.0	0.0	272.0	272.0	0.0	0.0
MGE20505	힐타웃 NK47 S12	개	2.0	35.0	0.0	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0
MCQ33901	공포 다경종	발	2.0	166.0	0.0	0.0	0.0	332.0	332.0	0.0	0.0
MGE20702	아연도 나사못 D6 25MM	개	19.0	5.0	0.0	0.0	0.0	95.0	95.0	0.0	0.0
MAK12020	스티로폴 20MMX900X1800 0.015(1종4호)	m2	1.1	920.0	0.0	0.0	0.0	1,012.0	1,012.0	0.0	0.0
MAM20510	석고보드 9.5X900X1800	매	0.6358	2,970.0	0.0	0.0	0.0	1,888.3	1,888.3	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0745	0.0	97,951.0	0.0	0.0	7,297.3	0.0	7,297.3	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0145	0.0	81,443.0	0.0	0.0	1,180.9	0.0	1,180.9	0.0

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

[표 50] ♥♥♥♥ S-1블록 최상층세대 천정 단열재 설계변경 현황

블록명	항목	변경전		변경후	
		항목	금액	항목	금액
S-1	스티로폴 바닥타설부착 (비드법 2종2호 50mm)	-	-	있음	31,537천원

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

그 결과 20백만 원의 불필요한 설계변경이 이루어져 해당 공사비에 대한 회수 조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

♡♡♡♡ S-1블록의 최상층세대 천정 단열재 설계변경 시 과다 계상된 관련 공사금액 20백만 원을 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).
